



Wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit van Defensie

Vervanging van de pantservoertuigen en de verwante systemen





Rekenhof

Wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit van Defensie

Vervanging van de pantservoertuigen en de verwante systemen



Verslag goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 28 mei 2025

Wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit van Defensie

In 2016 werd voor Defensie een nieuwe Strategische Visie goedgekeurd, die werd voortgezet in het STAR-plan van 2022. Voor de periode 2023-2030 voegt dat plan een budget van 11,2 miljard euro toe aan de 9,2 miljard euro uitgaven die in het kader van de Strategische Visie al waren vastgelegd voor de periode 2020-2030.

Er werden verschillende programma's gelanceerd voor de wederuitrusting van de capaciteiten van de verschillende legercomponenten, waaronder de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit van de landcomponent. Het eerste luik van die wederuitrusting bestaat uit de aankoop van 442 pantser-voertuigen op wielen (Griffons en Jaguars) en van verschillende ondersteunende systemen voor een budget van 1,58 miljard euro in het kader van een strategisch partnerschap met Frankrijk, dat in 2018 werd gesloten. Dat partnerschap omvat niet enkel de aankoop van de voertuigen, maar ook het opzetten van een samenwerking die erop gericht is de interoperabiliteit tussen de twee legers te versterken. In het STAR-plan zijn ook andere aankopen vastgelegd, voor een extra budget van 4,78 miljard euro. Die investeringen gebeuren ofwel in het kader van het partnerschap met Frankrijk, ofwel via andere aankoopmethodes.

Het Rekenhof heeft de keuze voor het partnerschap met Frankrijk en de meerwaarde van dat partnerschap geanalyseerd. Om te beoordelen hoe het programmabeheer in de hand werd gehouden, heeft het Rekenhof de kostenraming, de beschikbare begrotingsinformatie en de noodzakelijke voorwaarden voor het welslagen van het programma zoals het personeel, de werkingsmiddelen en de infrastructuur onderzocht. Het Rekenhof analyseerde ook het definitieproces van de return voor die investeringen en de mate waarin deze voor België effectief was.

Strategie voor de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit

De wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit van Defensie vloeit voort uit de Strategische Visie van 2016. Vervolgens werden de investeringen opgetrokken bij de evaluatie van de Strategische Visie door een expertengroep in 2021 en door de goedkeuring van het STAR-plan in 2022. De strategische doelstellingen van het plan werden verder uitgewerkt in verschillende operationele plannen, wat volgens het Rekenhof een goede praktijk is.

De keuze voor een partnerschap tussen Staten met Frankrijk is gebaseerd op relevante beweegredenen, zoals de bereidheid om bij te dragen aan de Europese defensie, de beperkte omvang van België en het ontbreken van een voldoende grote industriële en technologische basis in ons land. Na prospectie bij acht NAVO-landen heeft Defensie gekozen voor Frankrijk wegens de operationele, technische en financiële voordelen. Het Rekenhof wijst er echter op dat de financiële voordelen niet werden geraamd noch aangetoond bij de vergelijkende analyse.

Als NAVO-lid moet België bepaalde capaciteitsdoelstellingen halen. Het ambitieniveau van de Strategische Visie en van het STAR-plan is beperkt tot één enkele gemotoriseerde brigade, terwijl de

NAVO er twee vroeg (een mediane en een lichte). Bij haar evaluaties van 2022 en 2024 (die rekening houden met de Strategische Visie van 2016 en het STAR-plan van 2022) is de NAVO van oordeel dat de doelstellingen voor de enige Belgische gemotoriseerde brigade nog niet gehaald zijn.

De investeringen die in de Strategische Visie en vervolgens in het STAR-plan waren vastgelegd, gaan in de richting van de capaciteitsdoelstellingen van de NAVO. Defensie is zich er echter van bewust dat het onmogelijk is er ten volle aan tegemoet te komen, gelet op de evolutieve aard van die doelstellingen, die elke vier jaar worden bijgestuurd, en gelet op het Defensiebudget dat ten tijde van de audit onder de 2 % van het bbp bleef.

Daarnaast stipt het Rekenhof aan dat de Strategische Visie van 2016 en het STAR-plan van 2022 geen melding maken van de lacunes op het vlak van capaciteit om de NAVO-doelstellingen voor de gemotoriseerde capaciteit te kunnen bereiken, in het bijzonder voor een mediane gemotoriseerde brigade. De bepaling van het ambitieniveau door de regering (gehele of gedeeltelijke overeenstemming) is nochtans een noodzakelijke voorafgaande voorwaarde om tot een passend investeringsprogramma en een realistische budgettaire raming te komen om die capaciteitslacunes geheel of gedeeltelijk weg te werken.

Het Rekenhof vestigt ook de aandacht op de risico's die verbonden zijn aan een partnerschap dat de interoperabiliteit tussen twee legers omvat. Die risico's hangen onder meer samen met de technologische afhankelijkheid en de beheersing van de prijzen voor het onderhoud en de bevoorrading met wisselstukken en munitie. Die risico's werden niet voldoende geanalyseerd noch omkaderd met specifieke contractuele bepalingen.

Het Rekenhof doet de volgende aanbevelingen:

- Duidelijk definiëren welk ambitieniveau de regering voor ogen heeft voor de Belgische Defensie als het gaat over de capaciteitsdoelstellingen van de NAVO; die keuze baseren op door Defensie uitgevoerde studies en ramingen over de benodigde investeringen en de totale kostprijs over de volledige levenscyclus ervan
- In de toekomst een risicoanalyse uitvoeren en in de contractuele documenten clausules opnemen om de risico's in de hand te houden, onder meer op het vlak van de prijzen (aankoop en onderhoud) en de verplichtingen qua expertise-overdracht

Beheer van het militaire programma en kostenraming

Het programmabeheer van een strategisch wapensysteem vereist een realistische planning die onder meer zorgt voor voldoende budgetten voor het onderhoud en de werking, voor opgeleid personeel en voor een aangepaste infrastructuur om het materieel in onder te brengen.

Het Rekenhof stelt vast dat de uitvoering van de onderdelen van de Frans-Belgische intergouvernementele overeenkomst werd opgevolgd en dat een planning werd opgesteld, onder meer voor de transformatie van de Belgische landcomponent die moet uitmonden in een interoperabiliteit tussen de twee legers.

De intergouvernementele overeenkomst met Frankrijk heeft betrekking op de aankoop, de doctrine, de opleiding en de training, maar niet op de werking en het onderhoud. Die kosten werden niet geanalyseerd bij de keuze van het materieel terwijl ze over een levenscyclus van 25 jaar hoger liggen dan de investering in materieel. Daardoor is het moeilijk een realistische planning van de budgetten voor de werking en het onderhoud te maken.

Voor het onderhoud werden de onderhandelingen met de Franse leverancier verschillende jaren na de aankoopbeslissing opgestart. Naast het onderhoud dat de leverancier zal uitvoeren, stelt Defensie een plan op voor geïntegreerde logistieke ondersteuning (*Logistic Support for Land System* of kortweg LS²), dat in België een competentiecentrum moet oprichten voor het zware en evolutieve onderhoud van het rollend materieel, met inbegrip van de pantservoertuigen. Volgens het Rekenhof zou dat initiatief de strategische autonomie van ons land kunnen verbeteren.

Daarnaast bevatten het STAR-plan – en het bedrijfsplan dat daaruit voortvloeide – doelstellingen om het personeelsbestand van Defensie uit te breiden en haar aantrekkelijker te maken als werkgever. Er moet worden gezorgd voor opvolging van die plannen om na te gaan of de doelstellingen daadwerkelijk worden gehaald.

Het STAR-plan legde ook budgetten vast voor investeringen in infrastructuur en voor de werking ervan (energie, onderhoudscontracten enz.). Die budgetten houden rekening met de nieuwe investeringen in capaciteit en er werd een budgettaire planning voor die uitgaven opgesteld bij het naderen van de oplevering van het materieel. Toch is het niet zeker dat de budgetten zullen volstaan om aan alle behoeften te voldoen, aangezien Defensie verschillende grote programma's met capaciteitsinvesteringen heeft gelanceerd.

Het Rekenhof beveelt aan:

Voor projecten met zo'n groot budget en zo'n lange looptijd voorzien in een projectbeheer dat alle fases omvat om de kosten van het project gedurende de levensduur beter in te schatten, in overeenstemming met de aanbevelingen van de NAVO; die planning gedurende de hele levenscyclus van het project bijwerken op basis van feedback over het gebruik van het materieel

Totale kosten voor de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit

De keuze voor een strategisch wapensysteem impliceert dat het verschillende decennia zal worden gebruikt en vereist talrijke indirecte uitgaven zoals preventief, curatief en evolutief onderhoud, training, infrastructuur, munitie en personeel dat is opgeleid om het te gebruiken. Er moeten ook elementen in verband met genie, artillerie, communicatie, logistieke ondersteuning en verkenning worden voorzien om het systeem te kunnen inzetten op het terrein.

Vooraleer een beslissing te nemen voor een grote investering, beveelt de NAVO aan alle kosten in verband met het project gedurende zijn hele levensduur (totale levenscycluskosten) te ramen om de beleidsmakers te informeren, om de verschillende opties te kunnen vergelijken en om zich ervan te vergewissen dat het project financieel houdbaar is.

Het Rekenhof stelt vast dat bij de initiële beslissing om de gemotoriseerde capaciteit opnieuw uit te rusten, de totale levenscycluskosten van de investeringen niet werden geraamd. De ramingen die Defensie in 2024 bezorgde, tonen aan dat het totale kostenplaatje (over 25 jaar) van de investeringen voor de gemotoriseerde capaciteit die in 2018 en 2022 werden goedgekeurd, met inbegrip van de werking, het onderhoud, de munitie en de infrastructuur, oploopt tot minstens 14,7 miljard euro (geactualiseerd in 2024). Het Rekenhof voegt daaraan toe dat de totale kostprijs allicht nog hoger zal liggen omdat de andere aankopen die in het STAR-plan zijn opgenomen, nog niet werden uitgevoerd en omdat de werkingskosten voor die investeringen dus nog niet konden worden geraamd en in aanmerking genomen.

In die kosten zitten ook niet de extra investeringen die nodig zijn om volledig te beantwoorden aan de capaciteitsdoelstellingen van de NAVO voor het inzetten van een gemotoriseerde brigade.

Defensie meent dat het ingewikkeld is om alle kosten van een investering in een wapensysteem te ramen, omdat het materieel op het ogenblik van de aankoopbeslissing meestal nog niet is geproduceerd en de militaire doctrine nog niet op punt staat. Ze benadrukt dat de overeenkomst die in 2018 voor een bedrag van 1,58 miljoen euro werd ondertekend voor de aankoop van 382 Griffons en 60 Jaguars niet kan worden vergeleken met het kostenplaatje van 14,7 miljard euro dat in 2024 werd becijferd voor de volledige levenscyclus van alle investeringen voor de gemotoriseerde capaciteit die in 2018 en 2022 werden goedgekeurd. Die latere investeringen vloeien voort uit het verhoogde ambitieniveau van de regering door de gewijzigde geopolitieke context. Ze hebben hun eigen cyclus voor goedkeuring door de regering gevolgd, los van de beslissing van 2018.

Het Rekenhof, van zijn kant, is van oordeel dat die extra investeringen intrinsiek verbonden zijn met de beslissing van 2018, aangezien ze nodig zijn om een operationele gemotoriseerde brigade uit te rusten in overeenstemming met de NAVO-vereisten en om de interoperabiliteit tussen de Franse en Belgische landstrijdkrachten te verzekeren. Ze hadden dus bij de initiële raming van de totale levenscycluskosten voor de realisatie van die NAVO-doelstellingen in aanmerking moeten worden genomen. Die raming, die voor bepaalde kostenelementen aanvankelijk kan berusten op hypothesen, moet geactualiseerd worden naargelang van de evolutie van de geopolitieke context.

De beslissing van april 2025 om de defensie-inspanning op te trekken naar 2,0 % van het bbp vermindert dat budgettaire risico wel, maar er is momenteel geen waarborg dat die verhoging zal volstaan om de werkelijke behoeften te dekken en elk van de aangekochte capaciteiten optimaal te kunnen laten werken en onderhouden.

Het Rekenhof doet de volgende aanbevelingen:

- Om de financiële houdbaarheid van het project te garanderen en om de regering en het parlement te informeren voordat er een investeringsbeslissing wordt genomen, een raming maken van de totale levenscycluskosten van het project, inclusief de kosten voor de aankoop, het onderhoud en de werking (behoefte aan munitie, brandstof, personeel en infrastructuur); de raming van de totale levenscycluskosten baseren op een behoeftanalyse die afhankelijk is van het ambitieniveau dat de regering heeft vastgesteld (gedeeltelijke of volledige naleving van de NAVO-vereisten)
- Voor grote investeringsprogramma's, met inbegrip van de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit, onderzoeken of in de militaire programmeringswet de werkings-, onderhouds- en personeelsaspecten kunnen worden opgenomen, evenals de begrotingsmiddelen die nodig zijn voor een optimaal gebruik van de capaciteiten

Return voor de Belgische economie

Om zijn essentiële veiligheidsbelangen te beschermen, mag een kopend land eisen dat een buitenlandse leverancier materiaal en diensten aankoopt bij binnenlandse bedrijven, op grond van artikel 346 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dat hiervoor strikte voorwaarden oplegt. Die return is bedoeld om de risico's te beperken die samenhangen met een strategische afhankelijkheid van buitenlandse spelers. Het doel kan ook zijn om de nationale defensiegerelateerde technologische en industriële basis (DTIB) te versterken.

De Belgische Staat heeft geen beroep gedaan op artikel 346 van het verdrag, maar de Franse leverancier heeft zich er in 2018 via een intentiebrief toe verbonden een return te genereren van naar schatting 910 miljoen euro tot 2030, inclusief de overdracht van vaardigheden en knowhow in verschillende sectoren, zoals de assemblage van militaire voertuigen en cyberbeveiliging. In het contract is echter geen bindende clause opgenomen voor het geval die doelstellingen niet wordt gehaald.

Aangezien België zich heeft aangesloten bij een lopend programma van het Franse leger, was het niet betrokken bij de ontwikkelingsfase van het materieel, wat de betrokkenheid van de Belgische industrie bij de ontwikkeling van de gemotoriseerde capaciteit *de facto* beperkte. Dat er geen Belgisch representatief orgaan bestond van Belgische industriëlen en de Belgische Defensie heeft hun betrokkenheid op het ogenblik van de definitie van de return daarenboven bemoeilijkt.

De FOD Economie is belast met de opvolging van die return en brengt daarom regelmatig verslag uit aan de commissie Legeraankopen en -verkoop van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, wat een goede praktijk is. Aangezien de return vrijwillig en niet-bindend is, is die opvolging voornamelijk gebaseerd op de verklaringen van de Franse leverancier, zonder dat ze daarom gecontroleerd kunnen worden. Volgens de FOD Economie bedroeg de return 626 miljoen euro eind december 2023, d.i. 69 % van de vooropgestelde doelstelling van 910 miljoen euro. Die raming gebeurt echter op basis van de omzet van de Belgische bedrijven of in nominale waarde van de activiteiten die aan de dochterondernemingen overgedragen zijn en niet op basis van de toegevoegde waarde voor de Belgische economie, wat een betere indicator zou zijn geweest. Bij bepaalde bestellingen die worden meegeteld in de return, gaat het trouwens om producten die niet zijn gekoppeld aan het eerste protocol voor leveringen, wat het moeilijk maakt om te beoordelen of de geplande return voor de nationale economie daadwerkelijk bereikt werd. Het risico bestaat bovendien dat nieuwe economische activiteiten die de Franse leverancier toekent aan de Belgische dochterondernemingen in aanmerking worden genomen bij de berekening van de return, terwijl ze enkel het gevolg zijn van een sterk gestegen algemene vraag als gevolg van de geopolitieke context.

Het Rekenhof merkt ook op dat geen return gekoppeld is aan de geplande nieuwe investeringen in het kader van het STAR-plan voor de gemotoriseerde capaciteit, afgezien van een voorstel van de Franse leverancier met betrekking tot de 19 Caesar-artilleriesystemen en de 24 Griffon-voertuigen in Mepac-uitvoering.

Het Rekenhof beveelt aan:

- Voor de volgende investeringen in de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit of voor elk ander investeringsprogramma, de comités van de *Defence, Industry and Research Strategy* (DIRS) betrekken van bij de voorbereiding van een project om nieuwe capaciteit te verwerven of bestaande capaciteit uit te breiden; die betrokkenheid tot stand brengen met inachtneming van de beginselen van transparantie en gelijke behandeling van de ondernemers
- Ervoor zorgen dat de verwachte return wordt uitgedrukt in toegevoegde waarde voor de Belgische economie en dat hij gekoppeld wordt aan bindende contractuele bepalingen op basis waarvan een opvolging van de uitvoering ervan mogelijk is

Antwoord van de geauditeerden

Het ontwerpverslag werd op 12 februari 2025 verstuurd naar de chef Defensie, de minister van Defensie, de voorzitter van de FOD Economie en de minister van Economie.

De minister van Defensie, de minister van Economie en de voorzitter van de FOD Economie hebben niet geantwoord.

In haar antwoord van 11 april 2025 zegt Defensie dat ze akte neemt van de aanbevelingen van het Rekenhof en benadrukt ze dat de aanbevelingen generiek zijn en op alle grote investeringen zouden kunnen worden toegepast. Ze verduidelijkt dat bepaalde aanbevelingen eventueel niet of slechts ten dele kunnen worden toegepast, zoals de aanbeveling om bindende bepalingen op te nemen in de contractuele documenten. De elementen van het antwoord van Defensie werden in het verslag verwerkt.

Hoofdstuk 1

Inleiding	10
1.1 Internationale context	10
1.2 Nationale context	11
1.3 Volledige wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit van Defensie	12
1.3.1 Nieuwe gemotoriseerde capaciteit	12
1.3.2 Frans-Belgische intergouvernementele overeenkomst	12
1.3.3 Protocollen voor leveringen (Camo 1 en 2)	13
1.3.4 Infovalorisatie	13
1.3.5 Ondersteunende activiteiten	14
1.4 Audit door het Rekenhof	14
1.4.1 Reikwijdte van de audit en structuur van het auditverslag	14
1.4.2 Onderzoeksvragen en normenkader	14
1.4.3 Auditmethodes	15

Hoofdstuk 2

Strategie voor de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit	17
2.1 Strategische doelstellingen van Defensie	17
2.1.1 Strategische Visie van 2016	17
2.1.2 STAR-plan van 2022	17
2.1.3 Strategische investeringen	19
2.1.4 Bedrijfsplan van Defensie	20
2.1.5 Actualisering van de strategie van Defensie	21
2.2 Partnerschap met Frankrijk	21
2.2.1 Een partnerschap sluiten met een geallieerde Staat	21
2.2.2 Keuze voor Frankrijk	23
2.2.3 Tegemoetkomen aan de capaciteitsdoelstellingen van de NAVO	24
2.2.4 Risico op afhankelijkheid van Frankrijk	27
2.3 Conclusies	30

Hoofdstuk 3

Beheer van het militaire programma en kostenraming	32
3.1 Beheer van militaire programma's: goede praktijken	32
3.1.1 Evaluatie van een capaciteitssysteem volgens het NAVO-referentiekader	32
3.1.2 Goede praktijken in verband met planning en kostenramingen	33
3.2 Planning en aansturing	35
3.2.1 STAR-plan en bedrijfsplan	35
3.2.2 Partnerschap met Frankrijk en transformatieplan voor de landcomponent	35
3.2.3 Tijdschema van het eerste protocol voor leveringen (Camo 1)	36
3.2.4 Plan voor geïntegreerde logistieke ondersteuning en beheerplan	36
3.2.5 Aansturing op basis van de intergouvernementele overeenkomst	37
3.3 Onderhoud	37
3.3.1 Grote uitgavenpost	37
3.3.2 Reikwijdte van de intergouvernementele overeenkomst tussen Frankrijk en België	38
3.3.3 Onderhoudscontracten	38
3.3.4 LS ² -project	39

3.4	Personeel	40
3.4.1	Strategie van Defensie op het vlak van personeel	40
3.4.2	Opleidingen en trainingen	41
3.4.3	Outsourcing	41
3.5	Globale investeringskosten voor de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit	42
3.5.1	Bepaling van de kosten volgens de intergouvernementele overeenkomst van 2018	42
3.5.2	Kosten van de infrastructuur voor de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit	43
3.5.3	Totale levenscycluskosten (<i>total life cycle cost</i>)	45
3.5.4	Budgettaire houdbaarheid	51
3.6	Conclusies	53
3.6.1	Programmabeheer	53
3.6.2	Totale kosten van het programma	54
3.6.3	Budgettaire houdbaarheid	55

Hoofdstuk 4

Return voor de Belgische economie	56
4.1 Industriële compensaties en return	56
4.2 Return in het eerste protocol voor leveringen	57
4.2.1 Beleidsdoelstelling	57
4.2.2 Aard van de contractuele relatie	57
4.2.3 Verwachte return	57
4.2.4 Beperkingen van de definitie van return	58
4.3 Opvolging van en rapporten over de return door de FOD Economie	59
4.3.1 Voorafgaande analyse door de FOD Economie	59
4.3.2 Opvolging van de return door de FOD Economie	59
4.4 Implementatie van de return voor de Belgische economie	60
4.4.1 Betrokkenheid van de Belgische ondernemingen bij het ontwerp van de return	60
4.4.2 Meting en verwezenlijking van de return	61
4.5 Conclusies	62

Hoofdstuk 5

Conclusies en aanbevelingen		64
5.1	Conclusies	64
5.1.1	Strategie voor de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit	64
5.1.2	Beheer van het militaire programma en kostenraming	65
5.1.3	Return voor de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit	68
5.2	Aanbevelingen	69

Bijlagen

Bijlage 1	Overzicht van de investeringen voor de gemotoriseerde capaciteit in de Strategische Visie en het STAR-plan (document aangeleverd door Defensie)	72
Bijlage 2	Raming van de totale kosten voor de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit (document aangeleverd door Defensie)	73


Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Internationale context

Tussen 1980 en 2017 heeft België zowel zijn leger als de budgetten die bestemd zijn voor Defensie aanzienlijk doen krimpen. De uitgaven op het vlak van defensie¹ evolueerden van 3,3 % van het bruto binnenlands product (bbp) in het begin van de jaren 80 naar 1,37 % in 2000, 0,91 % in 2017 en 1,21 % in 2023, terwijl de lidstaten van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) de doelstelling hadden vastgelegd op 2 %². De daling van het budget voor Defensie leidde tot een verlies aan werkmiddelen en het uitstellen van geplande investeringen.


Figuur 1 – Evolutie van de defensie-uitgaven van België sinds 1960 (in % van het bbp)

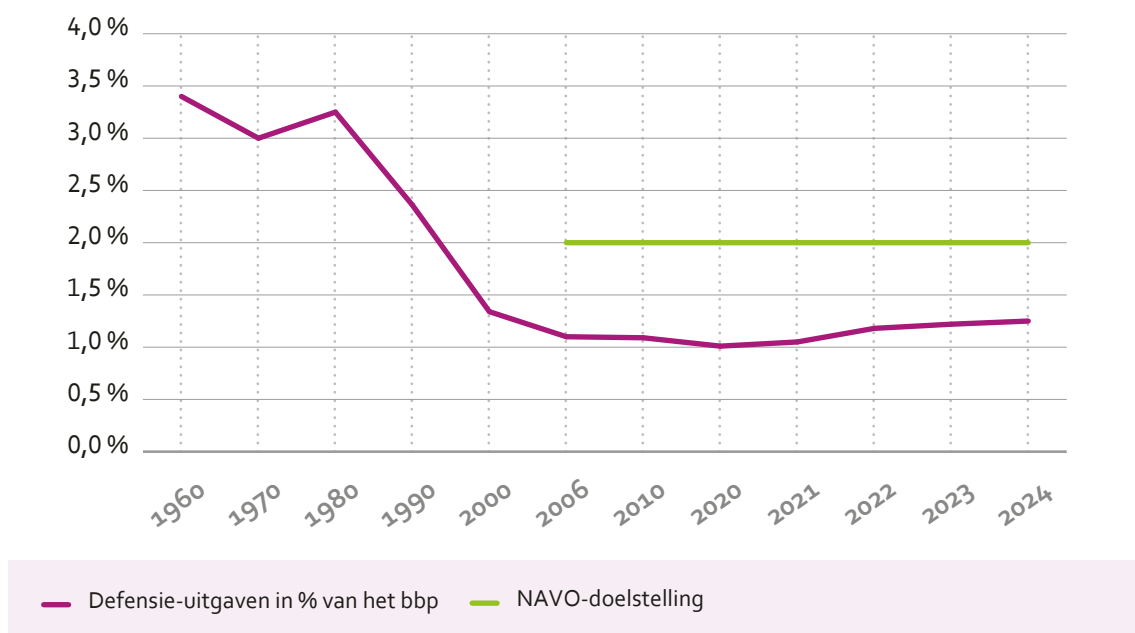

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de Wereldbank, van de NAVO en van Defensie

- ¹ De inspanningen op het vlak van defensie omvatten de uitgaven die worden aangerekend op de begroting van Defensie en de uitgaven voor de rust- en overlevingspensioenen van voormalige militairen, alsook bepaalde uitgaven voor defensie die in andere begrotingssecties zijn ingeschreven.
- ² In 2014 kwamen de staats- en regeringsleiders van de NAVO-landen overeen dat alle lidstaten 2 % van hun bbp aan defensie zouden besteden. Dat engagement lag in het verlengde van een beslissing van de ministers van Defensie van de NAVO-landen die in 2006 een akkoord hadden bereikt over de doelstelling om hun nationale defensie-uitgaven naar 2 % van het bbp te brengen. De NAVO voorziet niet in een sanctie als de lidstaten die afspraak niet nakomen.

Figuur 2 – Evolutie van de defensie-uitgaven 2014-2024 in België en in de NAVO-landen
(in % van het bbp)

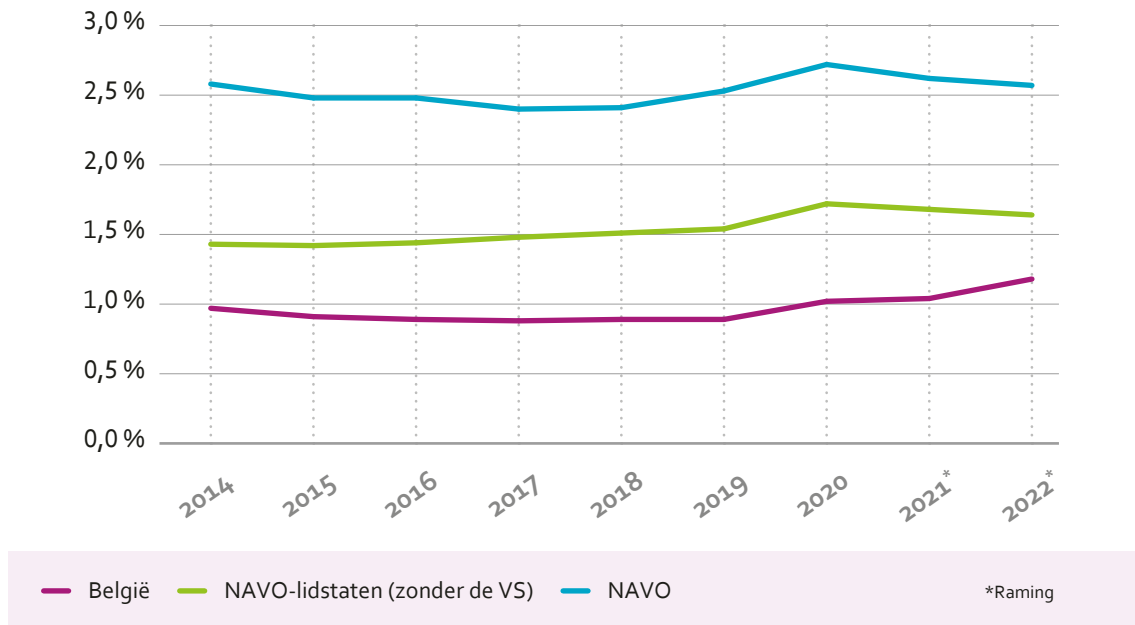

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de NAVO³

Door de dreiging van een conflict in Oost-Europa herhaalden de NAVO-lidstaten in 2014 tijdens de top in Wales en in 2023 tijdens de top in Vilnius dat ze minstens 2 % van hun bbp wilden besteden aan defensie-uitgaven, waarvan minstens 20 % voor de aankoop van nieuwe militaire uitrusting.

1.2 Nationale context

In 2022 besliste de regering dat België 1,26 % van zijn bbp⁴ zou besteden aan militaire uitgaven in 2024. Dat percentage zou nadien geleidelijk aan worden opgetrokken tot 1,55 % in 2030.

Die beslissing kadert in de verlenging van de nieuwe Strategische Visie van Defensie, die in 2016 werd goedgekeurd⁵. In dat verband werden verschillende programma's gelanceerd voor de wederuitrusting van de capaciteiten van de verschillende componenten van het Belgische leger (zie punt 2.1.3).

Een van die programma's beoogt de volledige wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit, d.w.z. alle gemotoriseerde eenheden en uitrustingen van de landcomponent van het Belgische leger. De gemotoriseerde capaciteit omvat op dit ogenblik 356 infanteriegevechtsvoertuigen: 218 Dingo's⁶ en 138 Piranha's⁷. Die aankopen vloeien voort uit de beslissing die België in het begin van de jaren 2000 nam om zich niet uit te rusten met een tankcapaciteit.

In april 2025 besliste de regering de defensie-uitgaven vanaf 2025 op te trekken naar 2 % van het bbp⁸.

³ NAVO, Public Diplomacy Division, *Defense Expenditure of NATO Countries (2014-2024)*, 17 juni 2024, persbericht, www.nato.int.

⁴ Defensie, *STAR-plan 2022. Security & Service - Technology - Ambition - Resilience*, juni 2022, p. 53.

⁵ Federale regering, *De strategische visie voor Defensie*, juni 2016, 144 p., www.cdsca-ocasc-website.be.

⁶ Licht pantservoertuig met vier wielen (4x4), dat hoofdzakelijk gebruikt wordt voor verkennings- en patrouilleopdrachten en voor het transport van troepen.

⁷ Pantservoertuig met acht wielen dat gebruikt wordt voor het transport van troepen. Het is zwaarder en polyvalenter.

⁸ Parl. St. Kamer, 24 april 2025, *DOC 56 0856/022, Beleidsnota Defensie*, www.dekamer.be.

1.3 Volledige wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit van Defensie

De beslissing om de Dingo's en de Piranha's van de landcomponent te vervangen door nieuwe pantservoertuigen is ingegeven door het feit dat die het voordeel hebben snel inzetbaar te zijn bij dreigingen en de collectieve NAVO-defensie te ondersteunen. De huidige pantservoertuigen zullen in gebruik blijven tot de nieuwe vloot volledig operationeel is (in 2030). De nieuwe pantservoertuigen zouden dan 25 jaar dienst moeten doen.

Er zijn nog andere investeringen gepland, onder meer om de vrachtwagens en de lichte verkenningsvoertuigen te vervangen. Beide zijn nodig om de pantservoertuigen efficiënt te kunnen inzetten tijdens gevechtsmissies.

1.3.1 Nieuwe gemotoriseerde capaciteit

De volledige wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit van Defensie omvat de wederuitrusting van de gevechtseenheden, van de gevechtsondersteunende eenheden en van de eenheden ter ondersteuning van de interwapen-gemotoriseerde capaciteit (met inbegrip van bepaalde eenheden voor verkenning en medische hulp).

De gemotoriseerde capaciteit verwijst naar het vermogen van een militaire eenheid of van strijdkrachten om zich gemotoriseerd te verplaatsen, met bijvoorbeeld vrachtwagens, terreinwagens of pantservoertuigen. Die capaciteit maakt het voor een eenheid mogelijk zich sneller en over langere afstanden te verplaatsen dan met rupsvoertuigen (tanks). Op basis van de intensiteit van de gevechtsmissies wordt bepaald welke pantservoertuigen nodig zijn en hoeveel er worden ingezet.

De nieuwe doctrine die samen met het Franse leger wordt ontwikkeld, omvat principes, strategieën en leidraden om eenheden uit verschillende bataljons (infanterie, cavalerie, genie) te ontplooiën. Dat wordt de interwapen-gemotoriseerde capaciteit genoemd.

1.3.2 Frans-Belgische intergouvernementele overeenkomst

Op 25 oktober 2018 besliste de ministerraad een strategisch partnerschap te sluiten met Frankrijk om die gemotoriseerde capaciteit te versterken en tot een maximale interoperabiliteit op lange termijn te komen tussen de Franse en de Belgische landstrijdkrachten. Concreet betekent dat dat de eenheden onderling inzetbaar zouden moeten zijn: een Belgische compagnie zou zonder technische problemen ingezet moeten kunnen worden in een Frans bataljon en vice versa.

Het strategische partnerschap tussen Frankrijk en België werd op 7 november 2018 gesloten via een intergouvernementele overeenkomst die de nadere samenwerkingsregels definieert.

De overeenkomst omvat ook operationele samenwerking met een gemeenschappelijke militaire doctrine, gemeenschappelijke trainingen en een geïntegreerde opleiding met het oog op de interoperabiliteit van de twee legers (*plug and fight*-concept tussen de Franse en Belgische gevechtseenheden).

Het gaat om een evolutieve overeenkomst met Frankrijk. De andere investeringen die gepland zijn in het kader van de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit van Defensie kunnen ofwel gebeuren via een nationale aankoop, ofwel via een of meer protocollen voor leveringen (in het kader van dezelfde overeenkomst).

1.3.3 Protocollen voor leveringen (Camo 1 en 2)

In het eerste protocol voor leveringen aan de gemotoriseerde capaciteit (*capacité motorisée* - Camo 1) was bepaald dat België 442 nieuwe Griffon- en Jaguar-pantservoertuigen zou aankopen. De 382 multifunctionele Griffon-pantservoertuigen (VBMR - *véhicule blindé multi-rôle*) en de 60 gepantserde Jaguar-verkenning- en gevechtsvoertuigen (EBRC - *engin blindé de reconnaissance et de combat*) zullen tussen 2025 en 2030 worden geleverd voor een geraamd bedrag van 1,1 miljard euro⁹. Al die voertuigen zijn opgenomen in een systeem voor slimme gegevensverwerking, dat ook wel 'infovalorisatie' wordt genoemd (zie het volgende punt).

Ter informatie stipt het Rekenhof aan dat Frankrijk in het kader van zijn Scorpion-programma in 2021 had gepland om 1.872 Griffons, 978 Servals en 300 Jaguars¹⁰ te bestellen. Het Scorpion-programma is een evolutief programma, in die zin dat het aantal voertuigen wordt aangepast op basis van de geopolitieke dreiging en de ervaring die wordt opgedaan tijdens trainingen en via feedback op het terrein.

Het protocol omvat ook de aankoop van verschillende wapensystemen die meer bescherming en wendbaarheid bieden en die een betere communicatie mogelijk maken tijdens gevechten, zoals het gevechtsinformatiesysteem, nieuwe middellangeafstandsraketten, mortieren enz.

In mei 2022 werd op het vlak van artillerie een tweede protocol voor leveringen (Camo 2) gesloten voor de aankoop van negen vrachtwagens die zijn uitgerust met een systeem van de nieuwe generatie (houwitser Caesar NG), voor een bedrag van 62 miljoen euro. Die vrachtwagens, die ook geïnfavoaliseerd zijn, zullen vanaf 2027 aan België worden geleverd¹¹.

De ministerraad van 8 december 2023 keurde ook de bijkomende aankoop van 24 Griffon-mortieren (Mepac) goed, evenals een tweede reeks van 19 Caesars, waardoor België nu 28 Caesars heeft aangekocht. Defensie bezorgde een geïllustreerd schema in **bijlage 1** om de verschillende fases van de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit te beschrijven. Het vermeldt de investeringen die plaatsvonden via het partnerschap met Frankrijk en de aankopen die werden gedaan via door Defensie beheerde overheidsopdrachten.

1.3.4 Infovalorisatie

Via de intergouvernementele overeenkomst kan de Belgische Defensie toetreden tot het Franse militaire Scorpion-programma, dat erop gericht is de contacten tussen de eenheden op het terrein te versterken dankzij polyvalente informatie en infovalorisatie. Het informatievalorisatiesysteem maakt tijdens gevechtsmissies instant communicatie mogelijk tussen pantservoertuigen, gedropte soldaten en de commandopost. Omdat die technologie werkt met sensoren en met commando- en controlesystemen, kan men sneller reageren, sneller bevelen of inlichtingen doorgeven, gevallen van *friendly fire* beperken en de nevenschade indijken. Het systeem dat daarvoor wordt gebruikt, heet SICS (*système d'information du combat de Scorpion*)¹².

⁹ Nota aan de ministerraad van 22 juni 2017, p. 8.

¹⁰ Ministère des armées (Frankrijk), archieven, *Scorpion*, pagina bijgewerkt op 30 mei 2021, archives.defense.gouv.fr.

¹¹ Defensie, Landcomponent, *Belgische en Franse ministers van Defensie tekenen Camo 2 en de aankoop van negen CAESAR NewGeneration*, 13 mei 2022, persbericht, belfednews.mil.be.

¹² Defensie, op cit., p. 86.

De pantservoertuigen vormen de belangrijkste schakel van de interwapen-gemotoriseerde capaciteit. Om ze efficiënt te kunnen inzetten tijdens een gevechtsmissie, zullen andere voertuigen worden gebruikt voor verkenningen en voor de bevoorrading. Zij zullen ook deelnemen aan de zogenaamde ‘collaboratieve’ strijd, waarbij verschillende eenheden en types van voertuigen real-time met elkaar verbonden zijn. Om te kunnen deelnemen aan collaboratieve gevechtsoperaties moeten die eenheden en voertuigen in eenzelfde infovalorisatiebubbel zitten.

1.3.5 Ondersteunende activiteiten

De gevechtseenheden bestaan uit pantservoertuigen die soldaten naar het front brengen en die het gevecht aangaan dankzij de wapensystemen die zich aan boord bevinden. Tijdens gevechtsmissies zijn ondersteunende activiteiten nodig om de voertuigen te bevoorraden en te onderhouden, om waterlopen te kunnen oversteken dankzij de genietroepen, maar ook om de vuurkracht te verhogen dankzij de artillerie.

1.4 Audit door het Rekenhof

1.4.1 Reikwijdte van de audit en structuur van het auditverslag

De audit gaat over de investeringen voor de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit van de Belgische Defensie, waarvan een groot deel inmiddels is geconcretiseerd via de intergouvernementele overeenkomst met Frankrijk.

In [hoofdstuk 2](#) heeft het Rekenhof de keuze om een partnerschap met Frankrijk te sluiten voor de vervanging van de pantservoertuigen vergeleken met andere oplossingen, en heeft het de meerwaarde van dat partnerschap voor België onderzocht.

In [hoofdstuk 3](#) is het Rekenhof nagegaan of de voorwaarden werden bepaald die noodzakelijk zijn voor het welslagen van het programma (personeel, werkmiddelen, infrastructuur) en of die voorwaarden ook werden gerealiseerd. In datzelfde hoofdstuk wordt onderzocht in hoeverre het programmabeheer in de hand wordt gehouden vanuit de optiek van de kostenraming, de begrotingsinformatie en de naleving van de budgetten en van de termijnen.

Wat dat allemaal betekent voor de Belgische economie wordt geanalyseerd in [hoofdstuk 4](#).

1.4.2 Onderzoeksvragen en normenkader

De audit wil een antwoord geven op de volgende vragen:

1. Vloeit de keuze voor de investeringen die werden gedaan in het kader van de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit voort uit een passende strategie die in meetbare doelstellingen werd omgezet?
2. Levert de internationale samenwerking met Frankrijk de grootste meerwaarde op voor België?
3. Wordt voldaan aan de voorwaarden voor het welslagen en het goede beheer van het investeringsprogramma?

Het doel van de onderzoeksvragen is om de beleidskeuzes van de Belgische Defensie voor de wederuitrusting van haar gemotoriseerde capaciteit te beoordelen. Gezien de bedragen die daarmee gemoeid zijn, moeten die keuzes berusten op voorafgaande onderzoeken die oog hebben voor de dreigingen en de internationale context. De strategie van Defensie moet ook regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd worden, afhankelijk van de manier waarop de internationale context evolueert. Ook de keuze om voor dit investeringsprogramma een partnerschap met Frankrijk te sluiten, moet worden verantwoord en moet een meerwaarde opleveren voor België.

De audit wil ook nagaan of er een realistische raming werd gemaakt van alle kosten van het programma (aankoop, werking en onderhoud) en of de beleidsbeslissingen werden genomen op basis van volledige en realistische budgettaire informatie. Daarnaast heeft het Rekenhof onderzocht of voldaan is aan de voorwaarden voor het welslagen van een dergelijk programma en of er een programmabeheer is ingesteld waarmee de risico's die inherent zijn aan dat soort projecten (kwaliteit, termijnen, kosten enz.) in de hand kunnen worden gehouden.

Het normenkader van deze audit berust op de volgende documenten:

- de beleidsdocumenten (voornamelijk de algemene beleidsnota's, de Strategische Visie voor Defensie van 2016 en het STAR-plan van 2022);
- de strategische en operationele plannen van Defensie (voornamelijk het militaire bedrijfsplan 2023-2026 en het transformatieplan van de landcomponent);
- de algemene normen voor goed bestuur en interne beheersing;
- de internationale normen, onder meer de NAVO-vereisten.

1.4.3 Auditmethodes

Tijdens zijn analyse heeft het Rekenhof diverse beleids- en beheerdocumenten onderzocht en vroeg het informatie op bij Defensie.

De analyse van de documentatie werd aangevuld met gesprekken met vertegenwoordigers van het bevel van de landcomponent en van de diensten van de generale staf. Er vonden ook gesprekken plaats met vertegenwoordigers van de FOD Economie, militaire experten, vertegenwoordigers van de NAVO en van de Belgische ondernemingen die betrokken zijn bij de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit.

Tot slot heeft het Rekenhof plaatsbezoeken afgelegd, onder meer in het Kwartier Koningin Elisabeth en op de militaire basis in Rocourt.

1.4.4 Tijdschema van de audit

30 augustus 2023	Aankondiging van de audit aan de minister van Defensie en aan de chef Defensie
September 2023 - november 2024	Uitvoering van de audit
12 februari 2025	Verzending van het ontwerpverslag naar de minister van Defensie, naar de minister van Economie, naar de chef Defensie en naar de voorzitter van het directiecomité van de FOD Economie
17 maart 2025	Verzoek van Defensie om de antwoordtermijn te verlengen (ingewilligd door het Rekenhof)
11 april 2025	Ontvangst van het antwoord van de chef Defensie

De FOD Economie en de bevoegde ministers hebben niet geantwoord.

Hoofdstuk 2

Strategie voor de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit

In dit hoofdstuk onderzoekt het Rekenhof of de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit van de landcomponent voortvloeit uit een passende strategie die werd omgezet in meetbare doelstellingen. Het onderzoekt ook of de keuze om een partnerschap te sluiten met Frankrijk afdoende gemotiveerd werd in vergelijking met andere mogelijke methodes voor de aankoop van materieel, of het een meerwaarde inhoudt voor België en of het beantwoordt aan de NAVO-vereisten.

2.1 Strategische doelstellingen van Defensie

2.1.1 Strategische Visie van 2016

De Strategische Visie van Defensie werd opgesteld in 2016, voor de periode tot 2030.

Die Strategische Visie bepaalt dat het budget voor Defensie lineair toeneemt tot 1,3 % van het bbp in 2030¹³, wat neerkomt op 6,6 miljard euro in constante euro 2015.

De visie beschrijft de voornaamste investeringen die moeten worden gedaan in alle componenten van Defensie (land, lucht, marine, cyber en medisch). Ze omvat ook de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit van de landcomponent (1,88 miljard euro in constante euro 2015).

Op 23 mei 2017 werd een militaire programmeringswet aangenomen voor de periode 2016-2030, waarin die investeringen zijn opgenomen.

2.1.2 STAR-plan van 2022

Het regeerakkoord van oktober 2020 voorzag onder meer in de verdere uitvoering en in de actualisering van de Strategische Visie van Defensie en van de militaire programmeringswet. In dat opzicht heeft een groep academische en militaire experts (hierna 'de expertengroep' genoemd) de Strategische Visie geëvalueerd in juni 2021¹⁴.

Op basis van die evaluatie keurde de regering op 23 juli 2021 tien grote leidende principes¹⁵ goed die uitmondden in het STAR-plan, dat op 17 juni 2022 werd goedgekeurd door de regering. Dat plan actualiseert de Strategische Visie. Het houdt ook rekening met de nieuwe dreiging in Oost-Europa. Op 20 juli 2022 werd een nieuwe militaire programmeringswet aangenomen. Het STAR-plan en de nieuwe wet leggen voor de periode 2023-2030 een enveloppe van 11,2 miljard euro voor nieuwe investeringen vast, bovenop het bedrag van 9,2 miljard euro dat werd vastgelegd in het kader van de Strategische Visie voor de periode 2020-2030 (zie [punt 2.1.3](#)).

¹³ In 2016 bedroeg het budget voor Defensie 3,8 miljard euro, wat neerkwam op 0,91 % van het bbp van België.

¹⁴ Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie & UC Louvain, *Actualisering van de strategische visie 2030: aanbevelingen*, juni 2021, 20 p., www.defence-institute.be.

¹⁵ Defensie, STAR-plan 2022, p. 176 (bijlage).

Het STAR-plan schetst een groeipad voor de defensie-inspanning¹⁶, die zou evolueren van 6,47 miljard euro in 2022 naar 8,79 miljard euro in 2030. De inspanning zou dan 1,55 % van het bbp vertegenwoordigen^{17,18}. Die stijging is voornamelijk toe te schrijven aan investeringen in hoofdmaterieel¹⁹ en in infrastructuur. In een nota van 11 april 2025 aan de ministerraad wil de minister van Defensie de defensie-inspanning optrekken tot 2 % van het bbp vanaf 2025²⁰. Op het einde van deze legislatuur in 2029 zou het jaarlijkse budget voor Defensie dus 12,2 miljard euro moeten bedragen bij de vereffeningen.

Het STAR-plan voorziet voor Defensie in een logistieke en technologische opwaardering, in de vernieuwing van infrastructuren en in personeelsmaatregelen. Voor het personeelsbestand wordt in eerste instantie een stabilisering en daarna een consolidering beoogd, alvorens het te versterken en te evolueren van 27.567 personeelsleden in 2022 naar 29.056 in 2030²¹. De budgetten zullen ook naar de hoofdinvesteringen en naar de werking van Defensie vloeien. Het STAR-plan trekt daarnaast 1,8 miljard euro uit om de Belgische en Europese defensie-industrie te ondersteunen op het vlak van programma's voor onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe technologieën²².

Het plan bepaalt dat Defensie haar beheer en opleidingen moet aanpassen om tot een groeitraject te komen voor het personeel, dat voort en versneld werk moet worden gemaakt van investeringen in de capaciteiten en dat de investeringssteun en de modernisering van de infrastructuur verzekerd moeten worden. Met investeringen in de capaciteiten worden in het STAR-plan de middelen bedoeld die nodig zijn om specifieke militaire capaciteiten te ontwikkelen, te verwerven en in stand te houden. Het gaat om alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor de inzet van het materieel, dus niet enkel de aankoop van nieuwe uitrustingen maar ook de infrastructuren, de opleidingen, de logistieke steun en de informatiesystemen die nodig zijn om te garanderen dat die uitrustingen efficiënt ingezet kunnen worden op het terrein. Daarnaast bepaalt het plan dat Defensie de kwaliteit van haar trainingen en haar operationele diepte significant verbetert, maar intussen wel nog altijd op afdoende wijze kan meewerken aan operaties als dat wordt gevraagd.

Om in de richting te gaan van de NAVO-doelstellingen op het vlak van militaire capaciteit (zie punt 2.2.3), voorziet het STAR-plan voor de periode 2023-2030 in 4,78 miljard euro aan bijkomende investeringen voor de gemotoriseerde capaciteit.

¹⁶ De defensie-inspanningen omvatten de uitgaven die worden aangerekend op de begroting van Defensie en de uitgaven voor de rust- en overlevingspensioenen van voormalige militairen, alsook bepaalde uitgaven voor defensie die in andere begrotingssecties zijn ingeschreven. Wat het budget van Defensie zelf betreft, bepaalt het STAR-plan (p. 55) dat het tussen 2022 en 2030 stijgt van 4,81 naar 6,96 miljard euro (+37,5 %).

¹⁷ Defensie, *ibid.*, p. 55.

¹⁸ Defensie, *ibid.*, p. 55.

¹⁹ Het hoofdmaterieel omvat de wapensystemen en de daaraan verbonden technologie die wegens de lange levenscyclus en de aanzienlijke investeringsbedragen niet kunnen worden geprogrammeerd in het kader van de courante investeringen.

²⁰ De kredieten in de ontwerp-begroting 2025 van Defensie bedragen 12,9 miljard euro bij de vastleggingen en 10,5 miljard euro bij de vereffeningen. Voor het jaar 2024 bedroegen de kredieten na overdrachten en herverdelingen 6,3 miljard euro bij de vastleggingen en 6,1 miljard euro bij de vereffeningen. Op 20 maart 2025 waren die kredieten voor 92,2 % benut bij de vastleggingen en voor 100 % bij de vereffeningen.

²¹ Defensie, *ibid.*, p. 161.

²² Budgetten voor wetenschappelijk onderzoek en technologische ontwikkeling, de *Defence Industry and Research Strategy* (DIRS) en de provisie voor de grote ontwikkelingsprogramma's. Zie Defensie, *STAR-plan 2022*, p. 55.

Voor de gemotoriseerde capaciteit vermeldt het STAR-plan:

“De ontwikkeling van de gemotoriseerde capaciteit moet worden verdergezet om onze capacitaire tekortkomingen weg te werken en op deze manier onze internationale verbintenissen na te komen. Het investeringsprogramma, voorzien in de Strategische Visie, zal versneld én vervuldigd moeten worden, met name door de integratie van nieuwe voertuigen in het kader van het lopende SCORPION-programma, van uitrusting voor zelfverdediging, directe en indirecte vuursteun, luchtverdediging, alsook ondersteunende logistieke en andere capaciteiten. De veiligheid tijdens opdrachten zal ook verzekerd worden door de investering in stoorzenders (jammers) tegen improvised explosive devices.”²³

2.1.3 Strategische investeringen

De Strategische Visie van 2016 voorzag in investeringen voor 9,2 miljard euro in nieuwe wapensystemen om de capaciteiten van Defensie te versterken. De militaire programmeringswet van 23 mei 2017, die in juli 2022 geactualiseerd werd, voorzag in een bijkomende enveloppe van 11,2 miljard euro²⁴ om de investeringen uit het STAR-plan te financieren. België besliste onder meer om de pantservoertuigen van de landcomponent, de F16's van de luchtcomponent en de mijnenjagers en fregatten van de marine te vervangen, en om de cybercapaciteit te versterken.

De Strategische Visie van 2016 voorzag in een budget van 1,88 miljard euro voor de interwapengemotoriseerde capaciteit²⁵. Die vastlegging resulteerde in tal van grote investeringen, binnen de perimeter van het partnerschap dat op 7 november 2018 met de Franse regering werd gesloten:

- november 2018: 382 Griffon-systemen en 60 Jaguar-systemen met infovalorisatie, stoorzenders, kits en uitrusting om de Griffon- en Jaguar-systemen te vervolledigen;
- mei 2022: negen vrachtwagens met een Caesar-artilleriesysteem.

In het kader van de Strategische Visie voorziet de Belgische Defensie ook nog in andere investeringen voor de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit en ze voert die rechtstreeks uit: commando- en verbindingervoertuigen (CLV), depannagevoertuigen of lichte en zware vrachtwagens.

Het STAR-plan 2022 voorziet in nieuwe investeringen voor de gemotoriseerde capaciteit en koppelt daar een meerjarenbudget van 4,78 miljard euro aan vast²⁶, als aanvulling bij de investeringen die vervat waren in de Strategische Visie van 2016. Die nieuwe investeringen moeten tegemoetkomen aan de NAVO-doelstellingen voor de militaire capaciteit die België moet bereiken voor een gemotoriseerde brigade, onder meer door nieuwe voertuigen aan te kopen zoals de pantservoertuigen voor operationele ondersteuning (VBAE - *véhicules blindés d'aide à l'engagement*), de nieuwe multifunctionele Griffon-pantservoertuigen met ingebouwd mortier (Mepac)²⁷, de lichte multifunctionele Serval-pantservoertuigen (VBMR-L - *véhicule blindé multi-rôle léger*), de extra vrachtwagens met een Caesar-artilleriesysteem. Er zijn ook systemen voor gevechtsondersteuning (*combat support*)

²³ Defensie, *ibid.*, p. 86.

²⁴ Artikel 3 van de wet van 20 juli 2022 tot wijziging van de wet van 23 mei 2017 houdende de militaire programmering van investeringen voor de periode 2016-2030 bepaalt: “De noodzakelijke vastleggingskredieten voor de realisatie van de in artikel 2 bedoelde investeringen, uitgedrukt in constante euro 2022, bedragen 11.176.070.000 euro”.

²⁵ Op een budget van naar schatting 2,082 miljard euro voor de volledige wederuitrusting van de landcomponent. Zie federale regering, *De strategische visie voor Defensie*, p. 65 en volgende.

²⁶ Defensie, *ibid.*, p. 43.

²⁷ De ministerraad van 8 december 2023 gaf groen licht voor de aankoop van 19 Caesar-kanonnen en 24 Griffons (Mepac) in het kader van de enveloppe van 492 miljoen euro die het STAR-plan vastlegde voor de artillerie.

gepland zoals beschermingssysteem tegen drones, stoorzendersystemen of genievoertuigen, als ook ondersteuningssystemen (*combat service support*) zoals communicatie- en informatiesystemen of ook logistieke ondersteuning.

Tabel 1 - Investerings in hoofdmaterieel opgenomen in het STAR-plan voor de periode 2023-2030
(in miljoen euro)

Capacitaire dimensies ²⁸ van Defensie	Geplande vastleggingen
Cyber	955,05
Land	6.554,95 waarvan gemotoriseerde capaciteit 4.781,96
Lucht	2.786,70
Marine	527,07
Bevel/operationele ondersteuning/ medische ondersteuning	352,30
Totale investeringen	11.176,07

Bron: STAR-plan 2022

De ministerraad van 15 juli 2022 stemde in met het ter beschikking stellen van een bijkomende enveloppe van 1 miljard euro door de oorlog in Oekraïne (*Readiness-plan*). Dat budget is niet uitsluitend voorbehouden voor de gemotoriseerde capaciteit en moest de paraatheid van Defensie tussen 2022 en 2024 aanscherpen. Het werd als volgt verdeeld: 450 miljoen euro in 2022 en 275 miljoen euro per jaar in 2023 en 2024. Het moest prioritair worden besteed aan het heraanleggen van de munitievoorraden, aan het verbeteren van de operationele beschikbaarheid van de wapensystemen (zoals de vloot pantservoertuigen), aan de uitrusting en bescherming van de soldaten, aan inlichtingen en cyberveiligheid, aan de verbetering van de infrastructuur en aan de weerbaarheid.

2.1.4 Bedrijfsplan van Defensie

Op basis van het STAR-plan heeft Defensie een bedrijfsplan voor de korte en de middellange termijn opgesteld dat elke twee jaar geactualiseerd wordt. Het huidige plan beslaat de periode 2023-2026.

Het plan omvat de strategische doelstellingen op middellange termijn, die vervolgens geconcretiseerd moeten worden in projecten of acties (bijlage B bij het plan). Voor elke actie is er een beschrijving, een termijn, een projectverantwoordelijke, een verantwoordelijke voor de coördinatie (*supporting enabler*) en een stuurgroep (*steering group*).

Voor elke component van Defensie werd ook een transformatieplan opgesteld (zie [punt 3.2.2](#)) om de doelstellingen uit het bedrijfsplan concreet te maken.

²⁸ Een capacitaire dimensie omvat alle materiële investeringen die nodig zijn om een wapensysteem te kunnen inzetten.

2.1.5 Actualisering van de strategie van Defensie

De wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit kadert in een strategie uit 2016 die werd opgesteld met het jaar 2030 voor ogen. Die strategie is gebaseerd op de toenmalige geopolitieke context, op de internationale verbintenissen van de Belgische Defensie en op de behoeften aan materieel, personeel en infrastructuur.

De Strategische Visie werd geëvalueerd in 2021. Op basis van die evaluatie werd een geactualiseerde strategie uitgewerkt, die op haar beurt in 2022 werd vastgelegd in het STAR-plan.

De strategische doelstellingen uit de Strategische Visie en uit het STAR-plan werden op het vlak van Defensie omgezet in plannen met doelstellingen, middelen en deadlines. Volgens het Rekenhof is dat een goede praktijk.

De actualisering van de strategie van Defensie met steun van een expertengroep was een belangrijke stap om zich ervan te vergewissen dat de strategie, de doelstellingen en de geplande investeringen nog altijd relevant zijn en inspelen op de nieuwe dreigingen en op de noden van Defensie.

Ten tijde van de audit werkte Defensie aan een actualisering van het STAR-plan, voor de periode tot 2040. Die actualisering zal aan de huidige regering moeten worden voorgelegd.

De actualisering van de strategie van Defensie en het feit dat er externe experts bij betrokken worden, zijn volgens het Rekenhof goede praktijken. Het beveelt aan om de strategie van Defensie systematisch te actualiseren op basis van de nieuwe geopolitieke context, de noden van Defensie en de capaciteitsvereisten van de internationale allianties.

Aanbeveling 1

De strategie van Defensie periodiek (bijvoorbeeld tijdens elke legislatuur of vierjaarlijks, in navolging van de evaluatiecyclus van de NAVO) blijven actualiseren op basis van een evaluatie, om rekening te houden met de capaciteitsvereisten van de internationale allianties, met de nieuwe geopolitieke context en met de noden van Defensie; externe experts bij die evaluatie blijven betrekken om zich ervan te vergewissen dat de beoogde doelstellingen nog altijd relevant zijn en inspelen op de nieuwe dreigingen en op de noden van Defensie

In haar antwoord op het ontwerpverslag vermeldt Defensie dat ze akte neemt van deze aanbeveling.

2.2 Partnerschap met Frankrijk

2.2.1 Een partnerschap sluiten met een geallieerde Staat

Goede praktijken impliceren dat vóór elke grootschalige aankoopbeslissing een voorstudie moet worden gemaakt om de toestand van het wapensysteem te schetsen en de nood tot wederuitrusting te objectiveren. De verschillende oplossingen moeten geëvalueerd worden in het licht van de strategische en operationele doelstellingen van Defensie. Bovendien moeten de verschillende aankoopmethodes worden overwogen:

- plaatsing van een overheidsopdracht bij een ondernemer (d.w.z. zonder tussenschakels een aankoopovereenkomst sluiten tussen Defensie en de ondernemer);

- aankoop via een intergouvernementele organisatie, zoals OCCAR (*Organisation conjointe de coopération en matière d'armement / Organisation for Joint Armament Co-operation*), om gezamenlijk de technische specificaties van het materieel op te stellen;
- aankoop via een partnerschap, in de vorm van een overeenkomst tussen regeringen (waarbij de buitenlandse regering dan tussenpersoon is tussen Defensie en de onderneming).

Bij de keuze moet Defensie onder meer rekening houden met de manier waarop de infrastructuur wordt verkregen, het benodigde personeel en de totale kostprijs van het project met het oog op een doelmatig en doeltreffend gebruik tijdens de volledige levensduur ervan.

Ook andere factoren kunnen een rol spelen bij de keuze, zoals het buitenlandse beleid van het land in kwestie, de mogelijkheden tot synergie of gezamenlijke interventies met andere landen, of het uitbouwen van een Europese defensie.

De Strategische Visie uit 2016 stelt vast dat de Verenigde Staten steeds meer aandacht besteden aan de veiligheidssituatie in Azië, ten nadele van Europa. De Europese NAVO-landen zijn dus meer op zichzelf aangewezen als ze zich moeten verdedigen. Om de collectieve verdediging te verzekeren, wil de Belgische Defensie partnerschappen sluiten met buurlanden om militaire middelen te kunnen ontplooiën binnen de tijdsbestekken die zijn vastgelegd in het kader van de internationale allianties waaraan ze deelneemt. België wil meewerken aan de uitbouw van een Europese defensie door de Europese tekorten (*capability gaps*)²⁹ te dichten, via het gemeenschappelijke veiligheids- en defensiebeleid van de Europese Unie (GVDB).

In zijn nota van 24 mei 2017 aan de ministerraad van 22 juni 2017 en in de bijlagen³⁰, vroeg de minister van Defensie de voorafgaande toestemming om een aankoopprogramma te starten en daartoe een intergouvernementele overeenkomst af te sluiten met Frankrijk, met als doel de interwapen-gemotoriseerde capaciteit te vervangen. De nota komt tot het besluit dat de keuze voor een partnerschap met een geallieerde Staat de meest relevante optie is voor de landcomponent. Die keuze is ingegeven door verschillende factoren:

- Omdat het grondgebied en het budget van ons land beperkt zijn, gaat het om een klein aantal aan te kopen voertuigen. Daardoor zal België niet de beste prijzen kunnen krijgen. Investeren in het bedenken en ontwikkelen van een oplossing op maat zou bovendien te duur uitvallen omdat België in zijn eentje slechts een beperkt aantal voertuigen kan aankopen.
- In België is geen industriële basis aanwezig die het volledige scala aan benodigde technieken voor de productie van gevechtsvoertuigen kan verenigen.
- De politieke intentie is om actief aan een Europese defensie te werken. Een partnerschap sluiten met een buurland maakt het mogelijk om de synergieën te maximaliseren, aangezien België altijd opereert in de context van een multilaterale samenwerking.
- De andere componenten van Defensie (lucht, marine, cyber) hebben al geopteerd voor partnerschappen met buurlanden.
- De Belgische Defensie kampt met een tekort aan personeel, en meer specifiek technische profielen die nationale aankoopprojecten van een dergelijke omvang in goede banen kunnen leiden. De Belgische Defensie beschikt niet meer over het personeelsbestand om een aankoopproject van zo'n omvang in haar eentje tot een goed einde te brengen.

Het Rekenhof is dan ook van oordeel dat een beroep doen op een partnerschap met een geallieerd land op relevante elementen berust.

²⁹ Volgens de Strategische Visie van 2016 bemoeilijken de tekorten op het vlak van defensiecapaciteiten op Europees niveau een autonome Europese militaire inzet.

³⁰ Minister van Defensie, nota aan de ministerraad van 22 juni 2017 met betrekking tot de overheidsopdracht 18LP100.

2.2.2 Keuze voor Frankrijk

In oktober 2016 vond een militaire prospectie plaats: er werd een vragenlijst verstuurd naar acht NAVO-landen³¹ die wellicht aan de verwachtingen van België konden tegemoetkomen. De lijst omvatte vragen over de motorisatie van de strijdkrachten van de desbetreffende landen, over de strategische oriëntatie van hun landstrijdkrachten en over lopende of nakende aankoopprogramma's. Het was de bedoeling informatie te verzamelen over mogelijke partnerschappen, wapensystemen, samenwerkingsmodellen en aankoopmethodes.

Vijf landen³² hebben geantwoord. Hun antwoorden werden geanalyseerd om tot de best mogelijke combinatie te komen van partnerschap, wapensysteem, model voor operationele en logistieke samenwerking en aankoopmethode. Voor elk van de vergeleken opties werd ook de eenheidsprijs voor de aankoop van het materieel geraamd.

Volgens Defensie beantwoordde het partnerschap met Frankrijk voor lichte en mediane³³ gevechtsvoertuigen voor de interwapen-gemotoriseerde capaciteit van de Belgische landstrijdkrachten aan de militair-strategische, militair-technische, financiële en economische vereisten van haar Strategische Visie. Het gaat dan onder meer over de vereisten in verband met het evenwicht tussen de partnerlanden, de timings, de strategische oriëntatie, de transportmogelijkheden per vliegtuig (gewicht), de bescherming, het gebruikskoncept, de kosten en de risico's van de programma's.

Volgens de analyse die Defensie uitvoerde, heeft een partnerschap met Frankrijk voor de aankoop van materieel de volgende voordelen:

- operationeel: identieke voertuigen bieden de mogelijkheid om de synergieën, en dus ook de doeltreffendheid van een partnerschap, te maximaliseren;
- technisch: het Franse programma legt de nadruk op infovalorisatie (zie [punt 1.3.4](#));
- financieel: de kosten voor het onderzoek, de ontwikkeling, de productie, de verbetering en het onderhoud van materieel kunnen door verschillende landen worden gedeeld. Het uitbouwen van een gemeenschappelijke structuur voor geïntegreerde logistieke steun, documentatie en het gebruik van wisselstukken kan ook helpen om bepaalde dure aspecten binnen de perken te houden.

De intergouvernementele overeenkomst tussen Frankrijk en België werd ondertekend op 7 november 2018. Naast de aankoop van materieel beoogt ze een samenwerking die moet uitmonden in een gemeenschappelijke militaire doctrine, gemeenschappelijke trainingen en een geïntegreerde opleiding. Belgische militairen zullen gedetacheerd worden naar de Franse generale staf, om verschillende onderdelen van de samenwerking (doctrine, opleiding, projectbeheer) mee uit te bouwen.

De samenwerking op het terrein kreeg voor het eerst ook concreet vorm in 2023, tijdens de grootscheepse oefening Orion 23 in Frankrijk waaraan verschillende landen deelnamen, onder wie ook zo'n 650 Belgische soldaten.

³¹ Duitsland, Spanje, de Verenigde Staten, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Nederland en Polen.

³² Duitsland, Spanje, Frankrijk, Nederland en Polen.

³³ Mediane voertuigen zijn middelgrote pantservoertuigen die kleiner en wendbaarder zijn dan zware tanks, maar een betere bescherming en transportcapaciteit bieden dan de lichte voertuigen.

Het Rekenhof is van oordeel dat de keuze voor een partnerschap met Frankrijk strategische, operationele en technische voordelen biedt, zoals Defensie ook benadrukt in haar analyse. De financiële voordelen die Defensie naar voren schuift, zijn daarentegen niet aangetoond noch gekwantificeerd. Een analyse waarbij de keuze werd vergeleken met een partnerschap met andere landen, had uitsluitend betrekking op de aankoopkosten en niet op alle kosten van het programma gedurende de volledige levenscyclus ervan.

Volgens Defensie was het onmogelijk om een volledige kostenvergelijking te maken met andere landen, onder meer wat onderhoud en werking betreft, omdat het over vertrouwelijke informatie gaat die landen omwille van de vertrouwelijkheid en het handelsgeheim weigeren mee te delen naar aanleiding van een prospectie.

2.2.3 Tegemoetkomen aan de capaciteitsdoelstellingen van de NAVO

De gekozen militaire investeringen zijn ingegeven door de beleidsoriëntaties van de regering. Die oriëntaties zijn beïnvloed door de capaciteitsdoelstellingen van de NAVO en door de prioriteiten van de Europese Unie om te komen tot een collectieve defensie³⁴ en een collectieve veiligheid³⁵.

2.2.3.1 Ambitieniveau van de Europese Unie en van de NAVO-lidstaten

Via het *European Defence Agency* definieert de Europese Unie de collectieve prioriteiten³⁶ op het vlak van defensie in het *Capability Development Plan* (CDP). Dat plan bepaalt geen specifieke capaciteitsdoelstellingen die moeten worden gehaald per land, maar schetst een globale visie op de capaciteiten die nodig zijn voor de EU als geheel. Het CDP identificeert de prioriteiten en de hiaten op het vlak van capaciteit, maar het staat de lidstaten vrij om te beslissen hoe ze gaan bijdragen tot het wegwerken van die hiaten, veelal door middel van samenwerkingsprojecten³⁷.

In het kader van de NAVO wordt aan elke lidstaat gevraagd om binnen vooropgestelde termijnen bepaalde capaciteiten op het vlak van defensie te kunnen ontplooien. Die doelstellingen per land worden geïdentificeerd via het *NATO Defence Planning Process* (NDPP). Ze worden kwantitatief en kwalitatief bepaald volgens een proces dat om de vier jaar herhaald wordt. Elke twee jaar gaat de NAVO over tot een evaluatie van de plannen, de beleidslijnen en de investeringen van de landen, waaronder de activiteiten (zowel nationaal als multinationalaal) die ze ondernemen om hun capaciteitsdoelstellingen te halen. Daarover wordt een vertrouwelijk verslag opgesteld, dat aan de lidstaat wordt bezorgd.

³⁴ Voor de collectieve defensie wordt de nadruk gelegd op de verdediging van het nationale grondgebied van de NAVO-lidstaten en van de Europese Unie, en op het voorkomen van een aanslag op de territoriale integriteit door militaire ontrading.

³⁵ De collectieve veiligheid betreft activiteiten buiten de landsgrenzen (en buiten de grenzen van de lidstaten) in zones die relevant zijn voor de veiligheid van de lidstaten.

³⁶ European Defence Agency, *The 2023 EU capability development priorities*, 2023, 28 p., eda.europa.eu.

³⁷ Het directoraat-generaal voor extern beleid van de Europese Unie voerde op verzoek van de subcommissie Veiligheid en Defensie van het Europees Parlement een studie uit. Zie Directorate-General for External Policies of the Union, Policy Department, *EU Defence: The White Book implementation process*, 2018, 98 p., www.europarl.europa.eu.

Volgens Defensie verwachtte de NAVO ten tijde van de goedkeuring van de Strategische Visie in 2016 dat de landcomponent van de Belgische Defensie zijn rol in de collectieve verdediging zou opnemen door twee brigades³⁸ te leveren voor de gemotoriseerde capaciteit: een lichte en een mediane.

2.2.3.2 Ambitieniveau van België

De Strategische Visie uit 2016 stelt:

*“Naast de nodige commando- en controle-elementen voor inzet op niveau interwapen-Battle-group en -compagnie, zal een paraatstellingsstructuur op niveau brigade behouden blijven. Deze biedt de mogelijkheid om (mits een beperkte opwerking) te voldoen aan de door de NAVO gevraagde ambitie voor een Belgische inzet van een gemotoriseerde brigade in het kader van de collectieve defensie.”*³⁹

Tijdens zijn evaluatie uit 2021 kwam de expertengroep (zie punten 2.1.2 en 2.1.5) tot de conclusie dat de investeringen die in het kader van de Strategische Visie 2016 waren gepland voor de gemotoriseerde capaciteit het niet mogelijk maakten tegemoet te komen aan de capaciteitsvereisten van de NAVO voor een gemotoriseerde brigade. Volgens de experts kan de Belgische gemotoriseerde capaciteit ondanks die investeringen niet tegemoetkomen aan de groeiende capaciteitsdoelstellingen van de NAVO, die voortvloeien uit de noodzaak om de oostelijke flank te kunnen versterken in crisisscenario's. Het ontbreekt haar voornamelijk aan vuurkracht en aan systemen voor tactische luchtverdediging. Om de brigade⁴⁰ ten volle te realiseren, moeten bovendien alle verwante systemen (munitie, communicatie, cyberelektronische oorlogsvoering, tactische ISR⁴¹, logistiek enz.) voorhanden zijn.

Het STAR-plan van 2022, dat werd goedgekeurd als gevolg van die evaluatie, hield rekening met die aanbevelingen. Het legt bijkomende investeringen⁴² vast voor de gemotoriseerde capaciteit, om een operationele gemotoriseerde brigade te kunnen inzetten. Het stelt: *“De ontwikkeling van de gemotoriseerde capaciteit moet worden verdergezet om onze capacitaire tekortkomingen weg te werken en op deze manier onze internationale verbintenissen na te komen”*⁴³.

2.2.3.3 Evaluatie van de capaciteit van België door de NAVO

Het Rekenhof heeft de evaluatieverslagen geanalyseerd die de NAVO in 2022 en in 2024 opstelde. Het verslag van 2022 beslaat de periode 2020-2021 en houdt rekening met de investeringen die vastgelegd waren in de Strategische Visie van 2016. Het verslag van 2024 beslaat de periode 2022-2023 en houdt ook rekening met de investeringen uit het STAR-plan.

³⁸ De NAVO vraagt aan haar lidstaten om één brigade per vijf miljoen inwoners te creëren. Voor België vraagt de NAVO twee brigades: een lichte en een mediane. Het STAR-plan is bedoeld om Defensie uit te rusten met een brigade die de volgende elementen omvat: een hoofdkwartier, manoeuvrebataljons (infanterie en cavalerie), gevechtsondersteunende bataljons en ondersteunende eenheden (logistiek en medisch) (STAR-plan, p. 70). Volgens de NAVO-criteria omvat een brigade ongeveer 5.000 soldaten.

³⁹ Federale regering, op. cit., p. 71.

⁴⁰ De Belgische gemotoriseerde brigade omvat gevechtseenheden (*combat*), gevechtsondersteunende eenheden (*combat support*) en ondersteunende eenheden (*combat service support*). Een brigade bestaat uit verschillende bataljons. De broodnodige logistieke steun voor die eenheden wordt verzekerd door de groepen die instaan voor de bijbehorende communicatie- en informatiesystemen, door de logistieke eenheden en door de trainingskampen.

⁴¹ ISR: *Intelligence, Surveillance and Reconnaissance* – inlichtingen, observatie en verkenning.

⁴² Defensie, op. cit., p. 83.

⁴³ Defensie, op. cit., p. 86.

De twee verslagen stellen dat België niet volledig beantwoordt aan de capaciteitsdoelstellingen die het in het kader van de NAVO kreeg opgelegd.

Er wordt immers gevraagd dat België over twee gemotoriseerde brigades zou beschikken (een mediane en een lichte), terwijl de Strategische Visie van 2016 en het STAR-plan van 2022 slechts één operationele mediane gemotoriseerde brigade ambiëren. Maar er wordt zelfs nog niet voldaan aan de capaciteitsdoelstellingen van de NAVO voor één enkele operationele gemotoriseerde Belgische brigade. De investering in artillerie van het type Caesar (zoals bepaald in het STAR-plan) zal het mogelijk maken de hiaten weg te werken op het vlak van de indirecte vuurkracht. Om de directe vuurkracht te versterken, zijn daarentegen extra Jaguar-voertuigen nodig en daarvoor was niets gepland toen deze audit werd afgesloten.

Volgens het transformatieplan van de gemotoriseerde capaciteit, waar momenteel de laatste hand aan wordt gelegd⁴⁴ (zie punt 3.2.2), moet de nadruk in eerste instantie liggen op de transformatie van de bestaande brigade in een volwaardige gemotoriseerde brigade tegen 2032. De doelstelling om volledig tegemoet te komen aan de capaciteitsdoelstellingen van de NAVO zal in het beste geval tegen 2040 worden gehaald.

2.2.3.4 Afstemming van de geplande investeringen voor de gemotoriseerde capaciteit op de NAVO-doelstellingen

Het Rekenhof stelt vast dat Defensie in 2024 niet beantwoordt aan de capaciteitsdoelstellingen die de NAVO heeft bepaald voor één gemotoriseerde brigade⁴⁵, rekening houdend met de investeringen die in de Strategische Visie en het STAR-plan zijn vastgelegd. In haar evaluatieverslag van 2024 is de NAVO van oordeel dat de ambitie om tegen 2040 een tweede brigade te creëren, achterofinkt.

De investeringen die vervat zijn in de Strategische Visie en in het STAR-plan evolueren weliswaar in de richting van de capaciteitsdoelstellingen van de NAVO, maar Defensie is zich ervan bewust dat het onmogelijk is er ten volle aan tegemoet te komen, gelet op de evolutieve aard van die doelstellingen, die elke vier jaar bijgestuurd worden, en gelet op de begroting van Defensie die ten tijde van de auditwerkzaamheden niet beantwoordde aan de NAVO-doelstelling om 2 % van het bbp te besteden aan de defensie-inspanning.

Daarnaast stipt het Rekenhof aan dat de Strategische Visie van 2016 en het STAR-plan van 2022 niet expliciet het ambitieniveau bepalen dat van de Belgische Defensie verwacht wordt op het vlak van de NAVO-doelstellingen voor de gemotoriseerde capaciteit (gedeeltelijke of volledige conformiteit). De bepaling van het ambitieniveau door de regering is nochtans een noodzakelijke voorafgaande voorwaarde om een passend investeringsprogramma en een realistische budgettaire raming te kunnen voorstellen.

Opdat de regering haar ambitieniveau zou kunnen bepalen, moet Defensie inschatten welke investeringen nodig zijn om de lacunes op het vlak van capaciteit weg te werken, en wat daarvoor de totale kostprijs is over de volledige levenscyclus ervan. Defensie beschikt echter niet over een raming van de totale kostprijs van die investeringen.

⁴⁴ Bij het afronden van de auditwerkzaamheden was de goedkeuring ervan gepland voor 2025.

⁴⁵ Volgens Defensie verwacht de NAVO dat de landcomponent van de Belgische Defensie zijn rol op het vlak van collectieve defensie vervult door twee brigades te leveren voor de gemotoriseerde capaciteit, namelijk een lichte en een mediane. Zie punt 2.2.3.1.

Volgens Defensie zou informeel een uiterst voorzichtige raming worden opgesteld en meege-deeld aan elke nieuwe regering die wordt ingezworen na de wetgevende verkiezingen. Het zou om een grootteorde gaan, omdat er geen informatie over de kosten beschikbaar is alvorens de prospectie wordt opgestart. De desbetreffende ramingen werden niet aan het Rekenhof bezorgd (zie [punt 3.5.3.3](#)), dat dus niet op die informatie kan steunen om de investeringen en de impact ervan te beoordelen.

Het Rekenhof is van oordeel dat een realistische raming moet worden gemaakt van de kosten die gepaard gaan met alle investeringen die nodig zijn per component of per capacitaire dimensie, om te beantwoorden aan de capaciteitsdoelstellingen van de NAVO. Op basis van die raming kunnen de beleidsmakers een ambitieniveau vastleggen en kunnen ze de budgetten bepalen die nodig zijn om eraan te voldoen.

Aanbeveling 2

Duidelijk definiëren welk ambitieniveau de regering voor ogen heeft voor de Belgische Defensie als het gaat over de capaciteitsdoelstellingen van de NAVO; die keuze baseren op door Defensie uitgevoerde studies en ramingen over de benodigde investeringen en de totale kostprijs over de volledige levenscyclus ervan

In haar antwoord op het ontwerpverslag vermeldt Defensie dat ze akte neemt van deze aanbeveling.

2.2.4 Risico op afhankelijkheid van Frankrijk


De intergouvernementele overeenkomst tussen Frankrijk en België stelt dat de Franse Defensie instaat voor de tenuitvoerlegging ervan, voor rekening van de Belgische Staat, onder het toezicht van een leidinggevend comité waarin beide partijen vertegenwoordigd zijn (zie [punt 3.2.5](#)).

Het schema dat voor de overeenkomst werd gecreëerd, werkt met een opdrachtgever (de Belgische Staat als klant) en met een gemachtigde (de Franse Staat als gedelegeerd aanbesteder). De Franse *Direction générale de l'armement* (DGA) treedt op in naam en voor rekening van de Belgische Staat, en regelt als dusdanig het verloop van de aankoopopdracht. De Belgische Defensie is enkel betrokken bij de uitvoering van eigen bestellingen.

De opdracht werd toevertrouwd aan één partij, de onderneming KNDS France, die in de intergouvernementele overeenkomst de 'Franse leverancier' wordt genoemd. KNDS France levert de meeste gevechtsvoertuigen voor de Franse landstrijdkrachten en fungeert als spil van het strategische partnerschap tussen België en Frankrijk. KNDS steunt op twee strategische Franse onderaannemers en op Belgische fabrikanten via samenwerkingsovereenkomsten (zie [punt 4.2.3](#)).

Het project, met inbegrip van de technologische aspecten, wordt dus ontwikkeld door de Franse leverancier. De Belgische bedrijven werken als onderaannemers mee aan het project, voornamelijk voor de assemblage en de toevoeging van wapen- en technologiemodules voor de Belgische voertuigen, onder toezicht van de Franse leverancier.

Figuur 3 – Intergouvernementele overeenkomst tussen Frankrijk en België

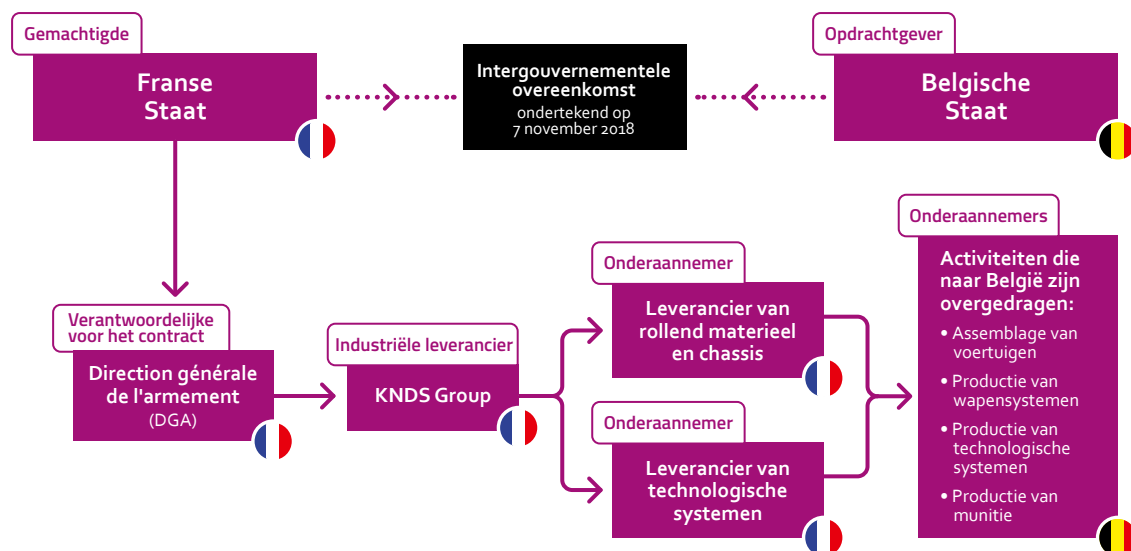

Bron: Rekenhof

Het Rekenhof stelt vast dat er een risico is op *vendor lock-in*⁴⁶, een aanzienlijke afhankelijkheid ten aanzien van de Franse leverancier. Een van de voordelen van het partnerschap met Frankrijk is namelijk de toegang tot het infovalorisatiesysteem, waarmee alle eenheden op het terrein met elkaar in verbinding staan zodat gegevens realtime verwerkt kunnen worden en sneller beslissingen kunnen worden genomen (de zogeheten ‘geïnfovaloriseerde collaboratieve strijd’). Voor alle voertuigen waarmee de Jaguar- en Griffon-vloot wordt uitgebreid (vrachtwagens, 4x4’s enz.) en die deel zullen uitmaken van de infovalorisatiebubbel, heeft België dus geen andere keuze dan een beroep te doen op de Franse leverancier. Defensie bevestigt het bestaan van dat risico.

Volgens Defensie is dat risico moeilijk in de hand te houden, omdat het in de eerste plaats voortvloeit uit het feit dat België niet beschikt over een industrie die dergelijke wapensystemen kan leveren. Het hangt ook samen met de strategische keuze voor een partnerschap met Frankrijk dat de twee landstrijdkrachten interoperabel moet maken. Bovendien kan de toetreding tot de infovalorisatiebubbel gedoseerd worden. Sommige hulpvoertuigen zoals de vrachtwagens of de 4x4’s werden aangekocht via een klassieke overheidsopdracht en zullen worden uitgerust met communicatiemiddelen zodat ze ten dele kunnen worden opgenomen in de infovalorisatiebubbel. Defensie meent tot slot dat het risico op *vendor lock-in* ten aanzien van de Franse leverancier relatief is, omdat de Belgische Defensie een belangrijke partner is van de Franse DGA, die in dit kader de Belgische belangen ten aanzien van de leverancier moet vrijwaren.

Het Rekenhof stelt vast dat het risico op *vendor lock-in* ook bestaat voor het onderdeel ‘onderhoud’ van het aangekochte materieel. De intergouvernementele overeenkomst tussen Frankrijk en België uit 2018 had immers enkel betrekking op de aankoop van het materieel, de doctrine, de opleidingen en de trainingen. Er was geen onderdeel ‘werking en onderhoud’ in opgenomen, terwijl dat aspect cruciaal is op de lange termijn en over het algemeen duur uitvalt. Momenteel lopen er onderhandelingen met de Franse leverancier om tot contracten op maat te komen voor België.

⁴⁶ Bij *vendor lock-in* hangt de klant af van één enkele leverancier of fabrikant voor een product of dienst, en kan hij niet van leverancier of fabrikant veranderen zonder dat daar aanzienlijke kosten of negatieve gevolgen aan vasthangen.

De gezochte formule moet inhouden dat een deel van het onderhoud in België gebeurt door een consortium van Belgische bedrijven, en ze moet zo een overdracht van kennis en technische expertise mogelijk maken (zie [punt 3.3.4](#)).

Bovendien zal België de wisselstukken en bepaalde munitie⁴⁷ moeten aankopen tegen de prijs die de Franse leverancier oplegt, zonder mogelijkheid tot inmededingingstelling. Aangezien de prijzen die de Franse leverancier hanteert voor het Franse leger onder het handelsgeheim vallen, valt niet na te gaan of vergelijkbare prijzen gehanteerd zullen worden voor de Belgische bestellingen.

Volgens Defensie is het onmogelijk om vooraf de prijzen in te schatten voor de capaciteitsgerelateerde investeringsprojecten. Ze hangen immers af van de noden die variëren naargelang van de geopolitieke context en de NAVO-vereisten, bijvoorbeeld voor de minimale munitievoorraad. Op het moment van de beslissing was het materieel bovendien nog niet gebruikt en waren er dus nog geen gegevens over de werkingskosten, in tegenstelling tot bij een aankoop waarbij het materieel al gebruikt wordt door andere landen. Qua onderhoud is er trouwens altijd een risico op afhankelijkheid ten aanzien van de constructeur, ongeacht het soort aankoop. Dat heeft te maken met de technologische complexiteit van het materieel en het feit dat de constructeur zowel de technische expertise, de wisselstukken als de intellectuele-eigendomsrechten bezit. In haar antwoord op het ontwerpverslag brengt Defensie het Rekenhof een nieuw element ter kennis, namelijk dat de Franse Staat op vraag van België een prijscontrole uitvoert via bilaterale *memorandums of understanding* tussen de twee landen met betrekking tot de overheidsopdrachten en de industriële controle.

Het Rekenhof stelt vast dat Defensie geen formele analyse heeft gemaakt van de risico's die aan zo'n partnerschap verbonden zijn, in het bijzonder de risico's in verband met de beheersing van de prijzen voor de aankoop van het materieel, de infovalorisatietechnologie, de wisselstukken en de munitie bij de Franse leverancier. Zo'n analyse had het mogelijk gemaakt om in de overeenkomst-documenten maatregelen op te nemen om die risico's in de hand te houden.

In verband met het ontbreken van een risicoanalyse verduidelijkt Defensie dat de risico's vergelijkbaar zijn met de risico's waarmee de DGA geconfronteerd werd voor het Scorpion-programma.

Aanbeveling 3

Bij grootschalige aankoop- of partnerschapsprogramma's een risicoanalyse maken alvorens een beslissing te nemen, en daarbij rekening houden met opgedane ervaringen uit vorige partnerschappen. Het gaat dan onder meer om risico's in verband met de technologische afhankelijkheid, de prijzen en de gewaarborgde bevoorrading van wisselstukken en munitie

⁴⁷ Als het kaliber in kwestie niet wordt geproduceerd door andere firma's, wat onder meer het geval is voor de munitie van het 40 mm-kanon dat gebruikt wordt op de Jaguars.

Aanbeveling 4

In de contractuele documenten clausules opnemen om de risico's in de hand te houden, onder meer op het vlak van de prijzen (aankoop en onderhoud) en de verplichtingen qua expertise-overdracht

In haar antwoord op het ontwerpverslag vermeldt Defensie dat ze akte neemt van aanbeveling 3 en instemt met aanbeveling 4. Ze benadrukt niettemin dat het niet altijd mogelijk is dergelijke clausules op te nemen in een internationaal partnerschap of wanneer een beroep wordt gedaan op internationale instellingen of programma's zoals het NPSA (*NATO Support and Procurement Agency*), OCCAR (*Organisation conjointe de coopération en matière d'armement / Organisation for Joint Armament Co-operation*) of het programma voor legerverkopen aan het buitenland (*Foreign Military Sales - FMS*) van het ministerie van Defensie van de Verenigde Staten.

2.3 Conclusies

De wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit van Defensie vloeit voort uit de Strategische Visie van 2016 die geconcretiseerd werd in de strategische en operationele documenten van Defensie, zoals het bedrijfsplan en de transformatieplannen. Na een externe evaluatie werd de Strategische Visie geactualiseerd bij de goedkeuring van het STAR-plan in 2022. Volgens het Rekenhof is die actualisering een goede praktijk. Het beveelt aan die te systematiseren om te waarborgen dat de doelstellingen van Defensie relevant blijven en inspelen op de nieuwe geopolitieke context en op de nieuwe noden en internationale verplichtingen van België ten aanzien van de NAVO-lidstaten en de Europese Unie.

De keuze om voor dit defensieprogramma te opteren voor een partnerschap van land tot land met Frankrijk, is te verantwoorden door verschillende strategische en operationele factoren. Omdat de middelen van België beperkt zijn en er in België geen afdoende industriële en technologische basis voorhanden is, heeft België gekozen voor een samenwerking die het niet alleen eenvoudiger maakt om materieel aan te kopen maar ook om een gemeenschappelijke doctrine en bijbehorende opleiding te ontwikkelen. De keuze werd voornamelijk ingegeven door de voordelen op het vlak van interoperabiliteit tussen de twee legers en door de technische synergieën. Er is daarentegen niet aangetoond dat zo'n partnerschap financieel voordelig is. Volgens Defensie kadert dat partnerschap in een ruimere visie over de versterking van de Europese defensie. De doelstellingen van die visie reiken verder dan louter de aankoop van materieel, want ze impliceren ook een intensere militaire samenwerking tussen België en Frankrijk voor de gemotoriseerde capaciteit.

Wat de capaciteitsdoelstellingen van de NAVO voor België betreft, stelt het Rekenhof vast dat de NAVO in 2024 opmerkte dat de doelstellingen niet bereikt zijn voor de landcomponent, hoewel er vooruitgang werd geboekt dankzij de Strategische Visie van 2016 en het STAR-plan van 2022. De NAVO-bondgenoten vragen aan België immers twee gemotoriseerde brigades, terwijl het er nog niet één kan leveren die volledig beantwoordt aan de capaciteitsvereisten van de NAVO. Het Rekenhof beveelt de regering aan om duidelijk te definiëren welk ambitieniveau ze voor ogen heeft om die doelstellingen te bereiken. Die keuze moet berusten op ramingen van Defensie over de totale kostprijs van de investeringen die nodig zijn om de capaciteitslacunes weg te werken.

Daarnaast wijst het Rekenhof op het risico om afhankelijk te zijn van Frankrijk en van de Franse leverancier bij toekomstige aankopen die geheel of gedeeltelijk onderdeel moeten worden van de infovalorisatiebubbel, maar ook voor de werkings- en onderhoudsaspecten, die niet aan bod komen in de intergouvernementele overeenkomst. Volgens Defensie zijn die risico's inherent aan elke capaciteitsgerelateerde investering. Wat de werking en het onderhoud betreft, zou het bij gebrek aan technische gegevens en uitgewisselde ervaringen moeilijk zijn er modaliteiten voor te bepalen, onder meer voor de prijzen op het moment van de aankoop.

Tot slot beveelt het Rekenhof aan om systematisch een risicoanalyse uit te voeren alvorens in dergelijke grootschalige programma's te stappen, om beter te kunnen anticiperen op en om beter te kunnen omgaan met de risico's op het vlak van de technologische transfers, de prijzen en de gewaarborgde bevoorrading van wisselstukken en munitie, door lessen te trekken uit voorgaande partnerschappen.

Hoofdstuk 3

Beheer van het militaire programma en kostenraming

In dit hoofdstuk analyseert het Rekenhof enerzijds de uitvoering van het eerste protocol voor leveringen voor de gemotoriseerde capaciteit (Camo 1). Het onderzoekt in dat opzicht of er een planning is opgesteld, of er werk is gemaakt van een performante organisatie en of de voorwaarden vervuld zijn om er een succes van te maken (bv. voldoende personeel en een toereikende infrastructuur).

Anderzijds onderzoekt het of er een raming is gemaakt van de globale kosten van de investeringen die nodig zijn voor de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit, zoals werkingskosten en kosten voor onderhoud, personeel en infrastructuur. Zo'n raming is noodzakelijk om de beleidsmakers te informeren over de benodigde budgetten, en zich ervan te verzekeren dat het project financieel houdbaar is en dat het risico op budgettaire verdringing in de hand wordt gehouden.

3.1 Beheer van militaire programma's: goede praktijken

3.1.1 Evaluatie van een capaciteitssysteem volgens het NAVO-referentiekader

België is lid van de NAVO. Die organisatie legt voor elke lidstaat capaciteitsdoelstellingen vast met het oog op de uitvoering van haar internationale missies (zie [punt 2.2.3](#)). De investeringen in militair materieel moeten geanalyseerd worden in het licht van hun bijdrage tot de verbetering van de militaire capaciteit. Het gaat dan om alle activiteiten die nodig zijn om het materieel te kunnen inzetten.

Het NAVO-model waarmee de voorbereiding van de aankoop van een strategisch wapensysteem kan worden geëvalueerd, heet DOTMLPFI. Elke letter verwijst naar een activiteit:

- D: doctrine of gevechtswijze;
- O: operationele organisatie of spreiding van de activiteiten over divisies, brigades, bataljons en compagnies;
- T: training/opleiding ter voorbereiding op de strijd;
- M: materieel, d.w.z. alle elementen die noodzakelijk zijn om het wapensysteem goed te gebruiken (noodzakelijke elementen voor het goede gebruik van het materieel, wisselstukken, machinepistolen, munitie enz.);
- L: *leadership*, d.w.z. officieren voorbereiden om de manoeuvres te leiden in gevechtssituaties;
- P: personeel, d.w.z. het benodigde aantal soldaten en officieren in vrede en in oorlogstijd;
- F: *facilities*, d.w.z. de infrastructuur die nodig is voor de opslag van wapensystemen, munitie en wisselstukken;
- I: interoperabiliteit, specifiek voor de NAVO, d.w.z. de mate waarin een wapensysteem compatibel is met dat van andere landen.

3.1.2 Goede praktijken in verband met planning en kostenramingen

In een militair programma is de aankoop van voertuigen niet de grootste kostenpost van de investering in capaciteit. De volgende figuur toont met welke elementen volgens de NAVO-code rekening moet worden gehouden om de kosten te becijferen over de volledige levenscyclus. Die elementen zijn als volgt samen te vatten:

- Onderhoud: om operationeel te zijn op het strijdtoneel moeten pantservoertuigen onderhouden worden, zodat ze binnen vooropgestelde termijnen inzetbaar zijn;
- Munitie en wisselstukken: er moet voldoende voorraad zijn;
- Personeel: er moet voldoende personeel zijn en ze moeten met het materieel overweg kunnen;
- Infrastructuur: materieel dat niet wordt ingezet tijdens een missie, moet in een gepaste infrastructuur worden ondergebracht.

Figuur 4 – Raming van de totale kosten van een bewapeningsprogramma volgens de aanbevelingen van de NAVO



Bron: Rekenhof, op basis van NAVO-gegevens⁴⁸

Aangezien een wapensysteem ook gemoderniseerd wordt tijdens de levenscyclus ervan, moet worden voorzien in de aankoop van nieuwe functionaliteiten of nieuwe capaciteiten, afhankelijk van hoe de dreiging evolueert⁴⁹.

Alvorens over te gaan tot grote investeringen moet volgens de NAVO-code⁵⁰ eerst een raming worden gemaakt van alle kosten van een project om de beleidsmakers te informeren, de mogelijke opties te vergelijken en zich ervan te vergewissen dat het project op de lange termijn financieel houdbaar is.

⁴⁸ Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), *Code of Practice for Life Cycle Costing*, 2009, p. 1, www.nato.int.


⁴⁹ Bijvoorbeeld: als het conflict in Oekraïne zich zou uitbreiden naar andere Europese landen, zou het nodig kunnen zijn om de uitrusting van de voertuigen af te stemmen op de specifieke kenmerken van het conflict. Technologische evoluties, zoals het inzetten van drones of robots, zouden bijkomende technologische investeringen kunnen vergen om de pantservoertuigen operationeel te houden op het strijdtoneel.

⁵⁰ NAVO, *ibid.*, p. 11.

Volgens de NAVO is het belangrijk om de risico's te definiëren en kwantitatieve modellen te ontwikkelen om de investering in kwestie af te wegen, ook wat de menselijke component betreft.

Alle fases in de levenscyclus van het programma moeten realistisch gepland worden om zeker over de nodige budgettaire middelen te beschikken (financiële houdbaarheid) en om het risico te verkleinen dat andere essentiële uitgaven teruggeschroefd moeten worden (budgettaire verdringing) of dat het aangekochte materieel onderbenut blijft. Uit de volgende figuur komt immers naar voren dat de onderhouds- en werkingskosten een zeer groot deel van de totale kosten vertegenwoordigen in de levenscyclus van een wapensysteem, en dat er dus op geanticipeerd moet worden.

Figuur 5 – Evolutie van de kosten doorheen de levenscyclus van een bewapeningsprogramma

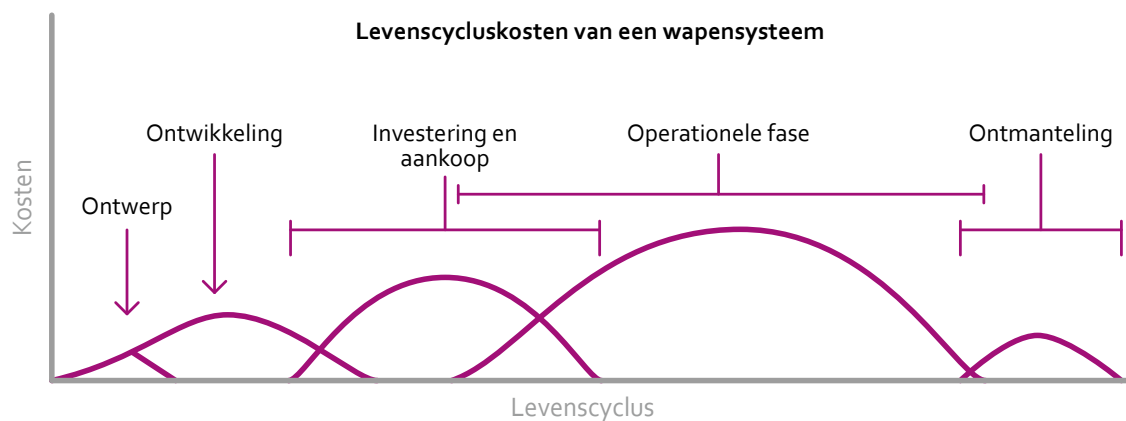


Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van het Bureau van de minister van Defensie van de Verenigde Staten⁵¹

Nog volgens de NAVO berusten die ramingen op hypothesen die doorheen de hele levenscyclus verfijnd worden met gegevens afkomstig van fabrikanten of aan de hand van feedback vanop het terrein.

⁵¹ US Office of the Secretary of Defense, Cost Analysis Improvement Group, *Operating and Support Cost-Estimating Guide*, 1992, p. 2-2.

Figuur 6 – Inzicht in de kosten doorheen de levenscyclus van een wapensysteem
(volgens de aanbevelingen van de NAVO)

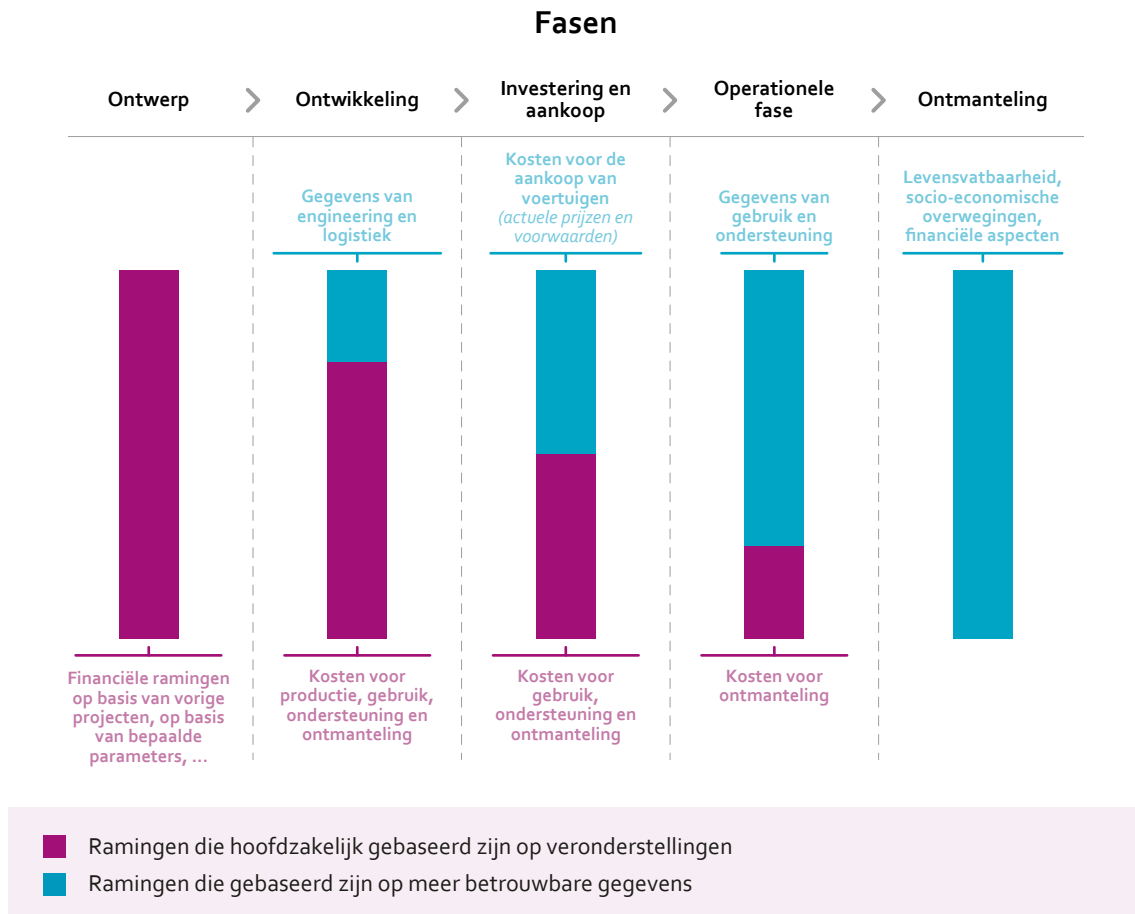

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de NAVO⁵²

3.2 Planning en aansturing

3.2.1 STAR-plan en bedrijfsplan

Zoals al werd uiteengezet in [punt 2.1.4](#), werd het STAR-plan (dat zelf voortvloeide uit de Strategische Visie van Defensie) door de chef Defensie geconcretiseerd in een bedrijfsplan. De landcomponent stelde een transformatieplan op dat de principes en de regels vastlegt om de transformatie van de eigen capaciteit te omkaderen (gemotoriseerde capaciteit en *special forces*). In dat opzicht zal de gemotoriseerde capaciteit georganiseerd worden volgens de militaire doctrine die met Frankrijk werd ontwikkeld om tot een volledige interoperabiliteit te komen tussen de twee landstrijdkrachten.

3.2.2 Partnerschap met Frankrijk en transformatieplan voor de landcomponent

De *special forces* startten in 2016 met hun transformatie in navolging van de Strategische Visie. Voor de gemotoriseerde capaciteit ging die transformatie van start bij de ondertekening van de intergouvernementele overeenkomst tussen Frankrijk en België in 2018. Het transformatieplan

⁵² NAVO, *ibid.*

voor de volledige landcomponent zou in 2025 moeten worden goedgekeurd en vervolgens worden geconcretiseerd in twee subplannen (*special forces* en gemotoriseerde capaciteit).

De transformatie van de gemotoriseerde capaciteit kadert in het strategische partnerschap met Frankrijk. Het transformatieplan wil een aanpak voor die transformatie definiëren, onder meer op het vlak van personeel, materieel en infrastructuur.

Het Rekenhof meent dat het plannen van de transformatie van de landcomponent een goede praktijk is om zich ervan te verzekeren dat de doelstellingen van de militaire samenwerking met Frankrijk bereikt worden en dat voldaan wordt aan de capaciteitsvereisten van de NAVO.

3.2.3 Tijdschema van het eerste protocol voor leveringen (Camo 1)

In de intergouvernementele overeenkomst zijn de volgende fasen vastgelegd:

- initiële fase: ontwikkeling van de Scorpion-doctrine en kennisverwerving (tot in 2025); organisatie van oefeningen (elk jaar vanaf 2021) en start van de transformatie van de landcomponent van de Belgische Defensie;
- tussentijdse fase: wederzijdse steun en levering van de voertuigen aan België (2025-2030);
- voltooiing van de transformatie van de landcomponent van de Belgische Defensie (2030);
- voltooiing van de transformatie van de Franse landcomponent (2033);
- eindfase: volledige interoperabiliteit van de eenheden (na 2033).

3.2.4 Plan voor geïntegreerde logistieke ondersteuning en beheerplan

Voor grote investeringen stelt Defensie een plan voor geïntegreerde logistieke ondersteuning op (*Integrated Logistics Support Plan* – ILSP) wanneer het moment nadert waarop het materieel zal worden geleverd.

Het ILSP beschrijft in detail hoe de logistieke steun voor welbepaald materieel georganiseerd wordt. Op basis daarvan wordt een geïntegreerd beheerplan opgesteld. Dat plan geeft de aanzet tot een denkoefening over het bestaande patrimonium en de eventueel te voorziene evoluties.

Op basis van de beheerplannen en de vijfjarenplannen wordt een raming gemaakt van het werkingsbudget voor de verschillende componenten van Defensie. Dat budget omvat de aankoop van een voorraad wisselstukken, het onderhoud, de munitie en de brandstof. De onderhoudskosten bestaan voornamelijk uit kosten voor *outsourcing*, want de kosten voor eigen personeel zijn niet in dat budget opgenomen.

Het ILSP zit nog in de uitwerkingsfase. De goedkeuring ervan is gepland voor midden 2025, wanneer de eerste voertuigen geleverd zouden moeten worden.

De lopende onderhandelingen met de Franse leverancier over het onderdeel ‘onderhoud’ zijn bedoeld om alle technische gegevens te verzamelen, zodat de Belgische Defensie zelf kan instaan voor een deel van het onderhoud, met de hulp van Belgische bedrijven.

3.2.5 Aansturing op basis van de intergouvernementele overeenkomst

De intergouvernementele overeenkomst tussen Frankrijk en België van 7 november 2018 over de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit stelt een leidinggevend comité in en drie *steering committees* (capaciteit, programma en bewapening) om de uitvoering van het partnerschap aan te sturen, alsook een gemeenschappelijk Camo-programmabureau.

De werking van die entiteiten wordt geregeld in de overeenkomst. Ze bestaan uit vertegenwoordigers van het Franse ministerie van Defensie en van de Belgische Defensie. Op die manier kan België de uitvoering opvolgen van alle onderdelen van de overeenkomst, waaronder de aankoop van het materieel, de ontwikkeling van de militaire doctrine, de opleidingen en de gemeenschappelijke trainingen.

Het Rekenhof meent dat de geplande opvolging van de intergouvernementele overeenkomst door de aansturende entiteiten een goede praktijk is. Toch stelt het vast dat de aankopen in verband met de onderdelen ‘werking’ en ‘onderhoud’ niet opgevolgd worden in het kader van de intergouvernementele overeenkomst, omdat ze daar geen deel van uitmaken (zie [punt 3.3.2](#)).

3.3 Onderhoud

3.3.1 Grote uitgavenpost

Het onderhoud is een van de grootste uitgavenposten in de totale kosten van militair materieel. Het kan preventief zijn en de aanbevelingen van de fabrikant volgen (bv. versleten stukken vervangen of vloeistoffen verversen) of curatief (bv. kleine of grote herstellingen als gevolg van slijtage of beschadiging). Voor de beide soorten onderhoud is een voorraad wisselstukken nodig.

Het onderhoud kan ook evolutief zijn en afhangen van de evolutie van een dreiging, van de technologie, van de context, van het terrein en van de politieke verwachtingen. De leverancier moet daarbij betrokken worden om de eigenschappen van het materieel te verbeteren (bv. vuurkracht, dreigingsdetectie of bescherming).

Als er een beheersysteem voor het onderhoud voorhanden is dat gebaseerd is op de technische gegevens (kilometerstand, aantal uren in werking, aanbevelingen van de constructeur enz.) kan de dienst logistiek volgens Defensie instaan voor de opvolging en de operationele eenheden waarvoor voertuigen aan onderhoud toe zijn. Omdat de mechanica van de voertuigen zwaar op de proef wordt gesteld tijdens trainingen en tijdens operaties, moet er een rotatie van de gebruikte voertuigen zijn om onomkeerbare voortijdige slijtage te voorkomen.

Defensie definieert drie niveaus van onderhoud, naargelang van de complexiteit en de nabijheid van het strijdtoneel:

- operationeel niveau (O) in gevechtseenheden waaraan militairen-mechanici worden toegevoerd en die over een beperkte voorraad wisselstukken beschikken;
- intermediair niveau (I) in een logistieke militaire eenheid die toeziet op die activiteit en die over meer middelen beschikt om complexere taken te kunnen uitvoeren, in een zone weg van het strijdtoneel, maar vanwaar het voertuig snel terug naar het front kan worden gestuurd;
- depotniveau (D), voor evolutief onderhoud en grote herstellingen, uitgevoerd in een vaste werkplaats in België of in het buitenland.

3.3.2 Reikwijdte van de intergouvernementele overeenkomst tussen Frankrijk en België

De onderdelen ‘werking’ en ‘onderhoud’ komen niet aan bod in de overeenkomst.

De budgettaire raming van 60 miljoen euro op jaarbasis (in constante euro 2015) voor wisselstukken en onderhoud, zoals vermeld in het punt over de budgettaire impact in de nota aan de ministerraad van 25 oktober 2018, steunt op de gegevens die de leverancier meedeelde met het oog op een forfaitair contract zoals dat van het Franse leger. Defensie verklaart dat België dat contract niet heeft gekozen omdat de informatie onvolledig was. De onderhoudscontracten van het Franse leger waren trouwens al opgemaakt en België kon er niet meer bij aansluiten. Daarom heeft de Belgische Defensie beslist om eigen contracten te sluiten (zie [punt 3.3.3](#)).

3.3.3 Onderhoudscontracten

Voor het onderhoud van haar materieel kan Defensie contracten sluiten voor de prestaties die uitsluitend onder de verantwoordelijkheid vallen van de *original equipment manufacturer* (verticaal contract)⁵³. Het gaat bijvoorbeeld om de aankoop van wisselstukken, het uitvoeren van technische studies of van wijzigingen in de configuratie van het materieel, het aanpassen van de technische documentatie, complexe herstellingen enz. Defensie kan ook brede en generieke onderhoudscontracten sluiten voor verschillende wapensystemen binnen een component (horizontaal contract). Het gaat dan onder meer over preventief onderhoud zoals het vervangen van batterijen of banden, het verversen van vloeistoffen enz., wat dan wordt gedaan door andere firma's dan de *original equipment manufacturer*, maar wel in overeenstemming met diens technische vereisten en door middel van diens wisselstukken.

Op 19 juli 2024 keurde de ministerraad een ontwerp van overheidsopdracht goed om met KNDS een verticaal contract te sluiten voor het onderhoud van alle voertuigen van de gemotoriseerde capaciteit die werden aangekocht in het kader van het partnerschap met Frankrijk, voor een totale kostprijs van 1.488 miljoen euro tegen 2055 (het programma beslaat een periode van 30 jaar). Dat bedrag omvat het budget voor de aanleg van een voorraad wisselstukken (248 miljoen euro, vast te leggen tussen 2025 en 2028). Het omvat ook een werkingsbudget van 1.240 miljoen euro voor onderhoudswerkzaamheden die de leverancier moet uitvoeren doorheen de volledige levensduur van het materieel (2025-2055), waarvan 51 miljoen euro voor de eerste vier jaar. Dat budget omvat ook de uitgaven voor het onderhoud van de geïnfovaloriseerde Serval-voertuigen die Defensie zou kunnen aankopen in Frankrijk (dat dossier zit in de prospectiefase).

Twee andere verticale contracten moeten nog worden gesloten: enerzijds voor het onderdeel ‘communicatie en technologie’ en anderzijds voor het wapensysteem.

Defensie gaat ook een (horizontaal) onderhoudscontract sluiten met een Belgisch consortium van privéfirma's in het kader van het project *Logistic Support for Land System* (LS²) dat in het volgende punt aan bod komt.

⁵³ Het verticale contract met de *original equipment manufacturer* betreft de aspecten die inherent zijn aan dat specifieke systeem. Het omvat onder meer de levering van wisselstukken in zijn hoedanigheid van enige mogelijke leverancier, specifieke studies om wijzigingen aan te brengen in de documentatie of in configuraties waarvoor alleen hij over de benodigde intellectuele eigendomsrechten beschikt. Complexe herstellingen, zoals grote laswerken aan het chassis die enkel de fabrikant kan uitvoeren, worden ook gedekt door dat contract.

3.3.4 LS²-project

Het LS²-project moet de strategische autonomie van België verhogen op het vlak van onderhoud. Het heeft betrekking op al het materieel van de landcomponent van Defensie.

Dit zijn de voornaamste doelstellingen:

- een flexibel en veerkrachtig logistiek ecosysteem uitbouwen met een verankering in België om ervoor te zorgen dat de gevechtssystemen van de landcomponent te allen tijde maximaal beschikbaar zijn;
- beschikken over een 30-jarig contract om te zorgen voor continuïteit en veiligheid voor de toekomst;
- beschikken over één enkele dienstverlener die globaal verantwoordelijk is voor de infrastructuur, de uitrusting, het personeel en het beheer van de voorraad wisselstukken en elk ander element dat tot het onderhoud op depotniveau behoort;
- het militair personeel opleiden en ervoor zorgen dat de knowhow doorstroomt.

Dankzij het LS²-project kunnen de activiteiten gecentraliseerd worden in Rocourt, met decentrale sites in Leopoldsburg en in Marche-en-Famenne. De dienstverlener zal instaan voor het ontwerp en de bouw van de nieuwe installaties in Rocourt om alle voertuigen van de landcomponent te kunnen onderhouden.

De dienstverlener zal het materieel herstellen en onderhouden in overeenstemming met de vereisten van de fabrikant en met gebruik van de wisselstukken die de fabrikant aanlevert (dit zijn basisopdrachten die in de terminologie van Defensie ook ‘*baselines*’ worden genoemd). Een aantal taken die Defensie vaak uitvoert (en die ze zelf ‘groeipotentieel’ noemt) zouden aan de dienstverlener kunnen worden overgedragen, zoals het beheer van de voorraad wisselstukken, het operationeel klaarmaken van de gevechtsvoertuigen, de opleiding van het militaire personeel en ondersteuning bij operaties of oefeningen.

De ministerraad keurde het LS²-project goed op 5 april 2024. Het zal er komen in de vorm van een publiek-privaat partnerschap van het type *Design, Build, Maintain and Operate* (DBMO)⁵⁴, wat inhoudt dat Defensie gedurende 30 jaar een onderhoudsvergoeding zou moeten betalen voor het operationele gedeelte⁵⁵. De keuze voor een DBMO-partnerschap is ingegeven door de responsabilisering van de dienstverlener voor alle fases van het project. Er werd gekozen voor een consortium van drie Belgische ondernemingen.

Het bestek werd in oktober 2024 aan het consortium bezorgd, zodat het een offerte zou kunnen indienen.

De waarde van het project wordt geraamd op 689 miljoen euro inclusief btw over een periode van 30 jaar voor de basisopdrachten (*baselines*) en op 3 miljard euro voor het groeipotentieel.

⁵⁴ DBMO staat voor *Design, Build, Maintain and Operate*. Het is een publiek-privaat partnerschap waarmee Defensie een private partner zoekt die instaat voor het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de exploitatie van een gebouw en van het materieel. In tegenstelling tot bij een DBFMO, is het bij een DBMO niet de private partner die het project financiert, maar wel Defensie.

⁵⁵ In zijn beslissing van 5 april 2024 belast de ministerraad Defensie ermee in de gunningsfase twee scenario's te onderzoeken voor de optimale looptijd van het contract: een looptijd van 20 jaar die met 10 jaar verlengd kan worden, ofwel een totale looptijd van 30 jaar.

3.4 Personeel

3.4.1 Strategie van Defensie op het vlak van personeel

De Strategische Visie van Defensie uit 2016 beoogde een jongere Defensie en een flexibel personeelsbeleid. Op het vlak van personeel was het de bedoeling om van zowat 31.000 VTE (ongeveer 29.500 militairen en 1.500 burgers) in 2016 te evolueren naar 25.000 VTE (ongeveer 24.000 militairen en 1.000 burgers) in 2030. Die inkrimping is het resultaat van een natuurlijke evolutie, want zowat de helft van de personeelsleden uit 2016 zullen vóór 2030 met pensioen gaan. Het aanwervingsritme moest opgedreven worden tot 2.100 VTE per jaar vanaf 2021 tot in 2030.

In het verslag uit 2021 over de evaluatie van de Strategische Visie⁵⁶ werd het behoud van kennis geïdentificeerd als een van de grootste uitdagingen voor Defensie tegen 2030. De snelle personeelsafbouw gaat immers gepaard met een groot verlies van kennis, ervaring en knowhow. Het verslag formuleerde de aanbeveling om de aanwervingen en opleidingen te intensiveren en het loopbaanbeheer te verbeteren om Defensie aantrekkelijker te maken en het personeel aan zich te binden.

Het STAR-plan van 2022 herbevestigde de doelstelling van de regering om het personeel van Defensie te versterken. Tegen 2030 wil Defensie haar personeelsbestand doen groeien tot 29.000 eenheden, in plaats van de 25.000 uit de visie van 2016.

Het Rekenhof stelt vast dat het bedrijfsplan 2023-2026 qua personeel coherent is met het STAR-plan. De strategische doelstelling om het personeelsbestand te versterken, krijgt concreet vorm in 40 projecten en acties op het vlak van aanwerving, opleiding, personeelsbinding, verloning en welzijn.

In overeenstemming met die strategische documenten definieert het transformatieplan van de landcomponent de behoeften aan personeel en het groeitraject van het personeelsbestand. De landcomponent wil het volgende groeitraject volgen: 11.200 VTE in 2030, 14.800 VTE bij de volledige uitrol van het STAR-plan in 2035 en 18.000 VTE om de twee door de NAVO vereiste brigades te kunnen leveren in 2040.

Die ambitie botst op de aanwervingsrealiteit en op de moeilijkheid om de nieuwe personeelsleden aan zich te binden. De snelheid waarmee het personeelsbestand kan aangroeien, hangt ook af van de opleidingscapaciteit. Er zijn initiatieven gepland om het aantal lesgevers te verhogen en zo de nodige omkadering voor de rekruten te kunnen voorzien. Er komen trajecten en alternatieve opleidingsmethodes zoals *Train the Trainer*-opleidingen voor lesgevers, gevechtssimulatietools, burgeropleidingen (om specialisten op te leiden, zoals mecaniciens, lassers, metsers, onderwaterlassers, chauffeurs categorie C) en online zelfstudie.

Het Rekenhof meent dat Defensie plannen heeft uitgetekend en initiatieven heeft genomen om de doelstellingen van het STAR-plan om te zetten in concrete acties en zo de verwezenlijking ervan te bevorderen. De aandacht moet in het bijzonder uitgaan naar de opvolging, om zich ervan te vergewissen dat de doelstellingen worden gerealiseerd, zowel binnen de vooropgestelde termijnen als op het vlak van personeelsbestand en competenties.

⁵⁶ Expertengroep, juni 2021, *Actualisering van de Strategische Visie 2030: Aanbevelingen*, 2021, 20 p., www.defence-institute.be.

3.4.2 Opleidingen en trainingen

De intergouvernementele overeenkomst tussen Frankrijk en België voorziet naast de aankoop van materieel ook in een operationele samenwerking tussen de twee legers. Die omvat een geïntegreerde opleiding en gemeenschappelijke trainingen.

Er zijn Belgische militairen gedetacheerd naar de Franse generale staf om er mee te werken aan de ontwikkeling van de verschillende onderdelen van het project (doctrine, opleiding, projectbeheer).

Er zijn tal van gezamenlijke opleidingen en trainingen gepland. In de loop van 2025 moet een actieplan worden opgesteld en verfijnd. De opleidingen zullen in Frankrijk of in België plaatsvinden.

De samenwerking kreeg voor het eerst concreet vorm op het terrein tijdens de grootschalige driejaarlijkse multinationale oefening Orion 23 (zie [punt 2.2.2](#)).

3.4.3 Outsourcing

Omdat het moeilijk is om technische profielen aan te werven en aan zich te binden, doet Defensie een beroep op externe dienstverleners voor het evolutieve onderhoud van en grote herstellingen aan haar materieel (zie [punt 3.3.3](#)). Die dienstverleners zijn veelal de *original equipment manufacturers*. Er zijn contracten met buitenlandse bedrijven gesloten voor periodes van vier tot zeven jaar. Die aanpak botste echter op zijn grenzen tijdens de COVID-19-crisis omdat de buitenlandse technici niet naar België mochten komen, en door de oorlog in Oekraïne zagen de buitenlandse externe dienstverleners zich genoodzaakt om zich te concentreren op de noden van hun eigen land.

Defensie heeft niet meer voldoende militairen-mecaniciens die de grote onderhoudsbeurten en de zware herstellingen kunnen uitvoeren. Op de site van Rocourt, waar de grote onderhoudsbeurten plaatsvinden, is het personeelsbestand geëvolueerd van 1.400 naar 400 militairen in de loop van de voorbije decennia. Het LS²-project werd opgestart om daar iets aan te doen (zie [punt 3.3.4](#)).

Volgens Defensie is de outsourcing voornamelijk te verklaren door de moeilijkheden om technische profielen aan te werven en door de hoge kosten om dergelijke profielen op te leiden. Omdat België een klein land is en het om een beperkt aantal voertuigen gaat, zou outsourcing ook financieel interessanter zijn.

Het gebruik van outsourcing beantwoordt ook aan de politieke intentie die in voorgaande legislaturen ontstond, namelijk om zich te concentreren op het militaire metier en alle verwante taken uit te besteden, voor zover dat de operationaliteit van de strijdkrachten niet in het gedrang brengt.

Het Rekenhof stelt vast dat de bewuste personeelsinkrimping van de voorbije decennia geleid heeft tot een verlies aan technische profielen die intern kunnen instaan voor het evolutieve onderhoud en de zware herstellingen van het materieel. Dergelijke profielen zijn zeer gewild op de arbeidsmarkt. Omdat het moeilijk is ze aan te werven en aan zich te binden en gezien de hoge opleidingskosten, heeft Defensie ervoor gekozen die prestaties uit te besteden. Volgens het Rekenhof impliceert die keuze een risico op afhankelijkheid van private partners door het verlies van know-how binnen Defensie. Dat risico is groter als het gaat om buitenlandse bedrijven zonder vestiging in België, die hun verbintenissen misschien niet zullen nakomen in tijden van crisis.

De uitbouw van een onderhoudssysteem met een verankering in België, zoals het LS²-project, om te zorgen voor een maximale beschikbaarheid van het materieel, voor kennisoverdracht en voor opleiding van het militaire personeel, is volgens het Rekenhof een goede praktijk.

Toch vestigt het de aandacht op het feit dat het gebruik van outsourcing weliswaar gunstig is voor het personeelsbudget van Defensie, maar doorweegt op het werkingsbudget, wat kan leiden tot budgettaire verdringing of het risico erop kan verhogen (zie [punt 3.5.4](#)).

3.5 Globale investeringskosten voor de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit

Programmabeheer houdt de evaluatie en opvolging van de financiële houdbaarheid in, met een raming van alle kosten, dus niet enkel die voor de aankoop. Het referentiekader van de NAVO (zie [punt 3.1.1](#)) dient als basis om de activiteiten te bepalen waarmee rekening moet worden gehouden bij de financiële evaluatie van de aankoop van een strategisch wapensysteem.

3.5.1 Bepaling van de kosten volgens de intergouvernementele overeenkomst van 2018

Sinds de ondertekening van de intergouvernementele overeenkomst in 2018 beschikt de Belgische Defensie over een tijdschema voor de levering van de voertuigen en een betalingsschema aan het Franse leger.

3.5.1.1 Aankoop van de voertuigen

Voor het eerste protocol voor leveringen (Camo 1) heeft de Belgische Defensie een gedetailleerde planning opgesteld en budgettaire opvolging uitgevoerd. Zo zal België 382 multifunctionele Griffon-pantservoertuigen en 60 gepantserde Jaguar-verkennings- en gevechtsvoertuigen aankopen, die tussen 2025 en 2030 worden geleverd. In de nota aan de ministerraad van 25 oktober 2018 is sprake van de vastlegging van 1.575 miljoen euro op het investeringsbudget voor de voertuigen, de uitrusting en de verwante diensten.

De begrotingsprogrammering van 2018 is gebaseerd op de overeenkomst tussen België en Frankrijk, die de prijs en herzieningsformules bepaalt. Het schema met de bedragen die in elke fase betaald moeten worden, is als bijlage bij het gunningsverslag gevoegd. Op 3 juni 2024 is een bedrag van 422 miljoen euro betaald, wat strookt met het vereffeningsschema dat de ministerraad in 2018 goedkeurde voor de investeringskredieten. De eerste voertuigen worden in principe in 2025 geleverd.

3.5.1.2 Onderhouds- en werkingskosten

De intergouvernementele overeenkomst vermeldt de bijdrage van België aan Frankrijk voor de ontwikkelingskosten: 40 miljoen euro gespreid tussen 2019 en 2031.

Voor het onderhoud is jaarlijks een budget van 60 miljoen euro⁵⁷ uitgetrokken. Volgens Defensie⁵⁸ houdt dat budget geen rekening met alle werkingskosten (wisselstukken, munitie, training enz.), maar die kosten zijn wel opgenomen in de algemene uitgavenbegroting van Defensie zonder uitsplitsing naar wapensysteem.

⁵⁷ Budget in constante prijzen van 2015.

⁵⁸ Algemene Directie *Material Resources* (DGMR).

Volgens Defensie was het ten tijde van de beslissing om een partnerschap met Frankrijk aan te gaan moeilijk een realistische raming van het specifieke werkingsbudget voor de geplande investeringen te maken, aangezien het materieel nog niet in gebruik was. Er bestonden toen enkel prototypes. De werkingsbudgetten worden op een meer realistische basis vastgelegd voor elke component zodra de oplevering van het aangekochte materieel nadert (zie [punt 3.2.4](#)).

Behalve in investeringen in materieel, voorzag het STAR-plan ook in een groeipad voor het Defensiebudget. Die verhoging zou rekening moeten houden met de noden op het vlak van onderhoud en werking van de nieuw aangekochte wapensystemen. Ten tijde van de audit was Defensie⁵⁹ echter van oordeel dat die stijging waarschijnlijk niet zou volstaan om de volgende redenen:

- De nieuwe dreigingen en aanbevelingen van de NAVO evolueren en vereisen dat Defensie klaarstaat om indien nodig tussen te komen, waardoor de behoeften aan munitie, wisselstukken en materieel toenemen.
- De werkingskosten van het materieel zijn, vóór de aankoop ervan, moeilijk realistisch in te schatten. Dat komt doordat de constructeur ervan die kosten zelf niet kent (brandstofverbruik, levensduur van wisselstukken enz.) vooraleer het materieel is getest of op het terrein wordt gebruikt.
- Bezuinigen op het personeelsbestand van Defensie heeft een verschuiving van de personeelskosten naar kosten voor outsourcing tot gevolg, aangezien Defensie steeds vaker onderaannemers inschakelt (onderhoud, beveiliging, studiebureau).
- De onderhandelingen over het onderhoud van de investeringen voor de gemotoriseerde capaciteit zijn pas in 2021 van start gegaan, na een periode waarin Defensie vertrouwd moest geraken met het Franse systeem.
- Defensie heeft de werklast per onderhoudsniveau becijferd (85.637 uur per jaar voor alle voertuigen samen). Tegen 2030 verwacht ze een verdubbeling van die werklast.
- Voor de vliegtuigen zijn er vliegplannen die na een bepaald aantal vliegunten onderhoud opleggen. Dat principe geldt niet voor voertuigen, waar de onderhoudsvereisten afhangen van talrijke parameters zoals het soort terrein of de gebruiksfrequentie.

3.5.2 Kosten van de infrastructuur voor de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit

Volgens Defensie is de infrastructuur erop achteruitgegaan door een historisch gebrek aan investeringen in onderhoud en vernieuwing van de infrastructuur. De herstelling ervan vereist grotere budgetten.

Door de goedkeuring van de Strategische Visie van 2016 verbond de regering zich ertoe de infrastructuur van alle componenten van Defensie te moderniseren en het jaarlijkse investeringsbudget te verhogen van 28,3 miljoen euro in 2019 tot 140 miljoen euro in 2030. Tegelijkertijd moest het jaarlijkse werkingsbudget voor de infrastructuur (water, stookolie, elektriciteit, gas en onderhouds- en herstellingscontracten) worden verhoogd van 83 miljoen euro in 2016 naar 139,5 miljoen euro in 2030.

⁵⁹ DGMR.

Het STAR-plan 2022 heeft dat engagement herhaald. Zo komt er een ambitieus plan om de infrastructuur tegen 2040 te verduurzamen. Het jaarlijkse budget voor investeringen in infrastructuur stijgt van 155 miljoen euro in 2022 tot 485 miljoen euro in 2030⁶⁰.

De Strategische Visie van 2016 voorzag in investeringen voor de renovatie van de gebouwen, maar hield geen rekening met de nieuwe infrastructuurinvesteringen die nodig zijn als gevolg van de capaciteitsinvesteringen (wapensystemen) zoals die in de gemotoriseerde capaciteit.

Het STAR-plan hield wel rekening met die nieuwe capaciteiten. Het Rekenhof moet echter vaststellen dat de budgetten niet zijn uitgesplitst tussen de verschillende componenten van Defensie op basis van de investeringen die hen zijn toegekend.

Bovendien kan een groot deel van de werkingsuitgaven voor de infrastructuur niet naar beneden. Door een gebrek aan interne vaardigheden wordt immers steeds vaker een beroep gedaan op onderaannemers (*facility management*, beveiliging, studiebureaus, onderhoud enz.).

Op basis van de reële behoeften heeft Defensie een infrastructuurplan opgesteld voor de periode 2024-2028. Het plan bevat de investeringen en de budgetten voor de vernieuwing van haar infrastructuur, onder meer de infrastructuur die nodig is om de vloot van de gemotoriseerde capaciteit in onder te brengen. In totaal zou het tussen 2024 en 2028 om 878 miljoen euro aan investeringen gaan.

Tabel 2 – Investeringen in infrastructuur van de landcomponent (in miljoen euro)

Vastlegging	Kwartier	Budget
2024	Leopoldsburg	230
	Marche-en-Famenne	
2025	Lombardsijde	69
	Spa	
2027	Amay	86
	Burcht	
	Brasschaat	
2026	Aarlen	52 (raming)
2026	Charleroi	216 (raming)
2028	Geraardsbergen	225 (raming)
Totaal		878

Bron: Defensie (DGMR), december 2023

Defensie verduidelijkt dat van die 878 miljoen euro slechts een bedrag van 386 miljoen euro rechtstreeks verband houdt met de vernieuwing van de gemotoriseerde capaciteit. Het saldo heeft betrekking op andere infrastructuurwerken die niet rechtstreeks samenhangen met de nieuwe

⁶⁰ Defensie, op. cit., p. 55.

voertuigen, maar die het gevolg zijn van de algemene verouderde staat van de infrastructuur. De infrastructuurprojecten van Aarlen, Charleroi en Geraardsbergen overstijgen het kader van de gemotoriseerde capaciteit.

Volgens Defensie waren de gegevens over de kosten bij het opstellen van het STAR-plan nog niet beschikbaar. Er was immers nog niets bekend over de specificaties van het materieel, om een overzicht van de behoeften en investeringen op te stellen. Het STAR-plan voorzag wel in een verhoging van de budgetten voor infrastructuur. Deze investeringen moeten in principe binnen het kader van die budgetten gebeuren.

Aangezien Defensie in de andere componenten verschillende grote capaciteitsinvesteringen heeft gedaan, moet de begrotingsplanning voor de werking van de infrastructuur er volgens het Rekenhof voor zorgen dat de nodige middelen worden toegewezen, met het oog op een optimaal gebruik en een optimale beschikbaarheid van het materieel.

3.5.3 Totale levenscycluskosten (*total life cycle cost*)

3.5.3.1 Ontbreken van bepaalde kosten

Het Rekenhof stelt vast dat de globale kosten voor de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit niet werden geraamd bij de militaire prospectie in 2016 (zie [punt 2.2.2](#)). In 2017 geeft de ministerraad Defensie de toelating “*een aankoopprogramma op te starten dat erop gericht is een intergouvernamenteel akkoord af te sluiten met Frankrijk met het oog op de vervanging van de interwapen-gemotoriseerde capaciteit*”. Wat de financiële impact betreft, vermeldt het onderdeel ‘beslissing’ in de nota aan de ministerraad⁶¹ dat de investering 1.112 miljoen euro bedraagt (in constante euro 2015). Een raming van de globale kosten voor de wederuitrusting is niet opgenomen in de nota of in de bijlagen bij de nota.

In 2018, na afloop van de onderhandelingen met Frankrijk, heeft de ministerraad van 25 oktober 2018 aan de minister van Defensie toestemming verleend om de opdracht te gunnen en bijgevolg de intergouvernamentele overeenkomst betreffende het kader en het protocol voor leveringen te ondertekenen. De beslissing van de ministerraad⁶² heeft betrekking op 1.575 miljoen lopende euro voor de investeringen en 47 miljoen euro aan werkingskredieten. Het vereffeningsschema voor die kredieten beslaat de periode 2019 tot 2030 (investeringen) en 2019 tot 2031 (werking). Voor de onderhoudskosten is een raming van 60 miljoen euro (in constante euro 2015) per jaar⁶³ vanaf 2025 vermeld⁶⁴ in punt 8 (budgettaire impact) van de nota aan de ministerraad.

⁶¹ Nota van 24 mei 2017 met als onderwerp: “Overheidsopdracht nr. 18LP100. Betreffende de wederuitrusting van de manoeuvre-eenheden, de *combat support* en de *combat service support* eenheden van de interwapen-gemotoriseerde capaciteit (met inbegrip van een bepaalde ISTAR- en medische steun-capaciteit), actueel uitgerust met voertuigen type Piranha en Dingo, met lichte en mediane versies van een gezamenlijk internationaal gemotoriseerd platform; en dit om via een internationale capacitaire verankering op actieve wijze een meer Europese defensie na te streven. Opdracht in het stadium Aanvraag Voorafgaand Akkoord (AVA).”

⁶² Punt 9) van de nota. De nota aan de ministerraad is zoals gebruikelijk gestructureerd in 10 punten: 1) wettelijke referentie; 2) uiteenzetting van het dossier; 3) regelgevingsimpactanalyse; 4) interne en/of externe adviesorganen; 5) Inspectie van Financiën; 6) voorafgaand(e) akkoord(en) [van de minister van Begroting]; 7) werkgroepen; 8) budgettaire impact; 9) voorstel van beslissing en 10) regeringslid dat het dossier indient [minister van Defensie].

⁶³ Er is geen periode (aantal jaar) gepreciseerd.

⁶⁴ Deze maakt geen deel uit van de elementen die de ministerraad goedkeurt.

Die beslissing van de ministerraad maakt het dus mogelijk om het strategische partnerschap te concretiseren door een intergouvernementele overeenkomst met Frankrijk te sluiten, en anderzijds het ‘protocol voor leveringen’ te ondertekenen dat eruit voortvloeit. Dat protocol bestaat uit twee delen:

- De ‘initiële Camo-perimeter’ waarvoor een boekhoudkundige vastlegging van 1.575 miljoen euro is voorzien. Overheidsopdracht 18LP100 in verband met die perimeter heeft betrekking op de aankoop van de voertuigen (342 Griffons en 60 Jaguars), de gemonteerde kits, de radio-middelen, de uitrusting *Command, Control, Communication and Intelligence*, het verwante materieel en de verwante diensten. Het omvat ook de andere onderdelen van de overeenkomst (doctrine, opleiding, training).
- Het tweede luik, namelijk de ‘bestelbons’, is een soort van open overeenkomst waarmee logistieke uitrustingen, kits en wisselstukken voor de operationele logistieke ondersteuning kunnen worden aangekocht. Hiervoor wordt geen kostenraming gemaakt, en er wordt bepaald dat de budgettaire aanrekening zal gebeuren *“op diverse later te bepalen basisallocaties”*.

Noch in de overeenkomst noch in het protocol voor leveringen is dus sprake van de onderdelen ‘onderhoud’ en ‘werking’ (munitie, brandstof, infrastructuur). Dat er ten tijde van de aankoopbeslissing over het materieel geen voorwaarden zijn vastgelegd voor het onderhoud en de werking, houdt volgens het Rekenhof het risico in op een aanzienlijke afhankelijkheid van de Franse leverancier en een gebrek aan beheersing van de bijbehorende kosten⁶⁵.

Het Rekenhof stelt ook vast dat er vóór de beslissing om de overeenkomst te sluiten geen raming is gebeurd van de kosten voor het personeel en de infrastructuur die nodig zijn om het succes van het programma te waarborgen. Zo staat in de nota’s aan de ministerraad van 2017 en 2018 niets over de kosten van de aanpassingen aan de infrastructuur om de voertuigen in onder te brengen of over de implementatie van de nieuwe Scorpion-doctrine.

Het STAR-plan van 2022 voorziet voor de interwapen-gemotoriseerde capaciteit in een investeringsbudget van 4,78 miljard euro om de capaciteitstekorten weg te werken en om tegemoet te kunnen komen aan de internationale verbintenissen van België⁶⁶. Het bevat ook een groeipad voor het werkingsbudget van Defensie (munitie, brandstof, onderhoud) en het budget voor personeel en infrastructuur.

Het Rekenhof merkt echter op dat die budgetten niet zijn uitgesplitst naar component of wapensysteem. Het is dus helemaal niet zeker of het geplande groeipad voor het Defensiebudget zal volstaan om alle verworven capaciteiten optimaal te doen werken.

In haar antwoord op het ontwerpverslag bevestigt Defensie dat geen volledige berekening van de totale levenscycluskosten werd gemaakt, maar benadrukt ze dat toch met bepaalde elementen rekening werd gehouden, zoals het onderhoud waarvan het budget op 60 miljoen euro werd geraamd in de nota aan de ministerraad van 2018. Ze vermeldt bovendien dat de werkingskosten per wapensysteem worden uitgesplitst in de vijfjarenplannen, die worden opgesteld en jaarlijks worden bijgewerkt.

⁶⁵ De onderhandelingen met de leverancier begonnen vijf jaar na de aankoopovereenkomst en dus twee jaar vóór de levering van de eerste voertuigen.

⁶⁶ STAR-plan, p. 78.

3.5.3.2 Raming van de totale kosten voor de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit

Het Rekenhof heeft Defensie om een schatting gevraagd van de totale levenscycluskosten van de investeringen die in de Strategische Visie en het STAR-plan zijn opgenomen voor de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit.

De onderstaande tabel 3 schetst de ramingen die Defensie voorlegde en die zijn opgenomen in [bijlage 2](#)⁶⁷. Ze omvatten kosten bovenop de investeringskosten voor materieel⁶⁸. Het gaat om de infrastructuur- en werkingskosten voor een levensduur van 25 jaar, dat wil zeggen het onderhoud, de munitie en de brandstof die nodig zijn om de pantservoertuigen in te zetten. De personeelskosten daarentegen zijn niet inbegrepen.

Tabel 3 – Raming in 2024 van de kosten voor de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit
(in miljoen euro)

	Partnerschap met Frankrijk	Andere overeenkomsten	Totaal	Referentiejaar	Aanpassing van het totaal in kosten van 2024 ⁶⁹
Investeringskosten in materieel die vastgelegd zijn in de Strategische Visie van 2016	1.242	508	1.750 ⁷⁰	2015	2.283
Werkingskosten van de investeringen op 25 jaar	2.213 ⁷¹	250	2.463	2024	2.463
Raming van de totale kosten voor investeringen die vastgelegd zijn in de Strategische Visie	3.455	758	4.213		4.746
Investeringskosten in materieel die vastgelegd zijn in het STAR-plan van 2022	1.462	3.320	4.782	2022	5.073
Werkingskosten van de investeringen op 25 jaar	1.600	niet bepaald	1.600	2024	1.600
Raming van de totale kosten voor investeringen die vastgelegd zijn in het STAR-plan	3.062	3.320	6.382		6.673

⁶⁷ Bij de investeringen gaat het om de bedragen die zijn gepland. Voor de investeringen die al juridisch zijn vastgelegd (d.w.z. waarvoor een overeenkomst bestaat) kunnen de door Defensie verstrekte bedragen verschillen. In totaal bedraagt het verschil tussen de geplande en de vastgelegde bedragen voor de uitgevoerde investeringen slechts 17 miljoen euro, wat geen impact van materieel belang heeft op de totale geraamde kosten.

⁶⁸ Die investeringen worden in het kort toegelicht in [punt 2.1.3](#) en in de [bijlage 2](#).

⁶⁹ Op vraag van Defensie heeft het Rekenhof de verschillende kosten uitgedrukt in euro van het referentiejaar aangepast op basis van een inflatie van 3 % per jaar voor de periode tussen 2015 en 2024, om te komen tot de kosten in euro van 2024 en zo over vergelijkbare cijfers te beschikken.

⁷⁰ Het bedrag dat Defensie in het kader van deze audit heeft meegedeeld, wijkt licht af van de 1,88 miljard euro uit de Strategische Visie van 2016 voor de gemotoriseerde capaciteit (zie [punt 2.1.3](#)).

⁷¹ Het bedrag dat in 2018 werd geraamd, bedroeg 1.500 miljoen euro (60 miljoen euro * 25 jaar). Dat bedrag had enkel betrekking op het onderhoud (zie [punt 3.5.3.1](#)). Het werd in 2024 door Defensie bijgesteld op basis van meer betrouwbare gegevens van de constructeur en diens feedback, en de overige werkingskosten werden erbij opgeteld, wat uitkwam op 2.231 miljoen euro.

	Partnerschap met Frankrijk	Andere overeenkomsten	Totaal	Referentiejaar	Aanpassing van het totaal in kosten van 2024 ⁶⁹
Strategische Visie + STAR-plan	6.517	4.078	10.595		11.419
Infrastructuurkosten			386	2024	286
Aanleg van een munitievoorraad ⁷²			2.886	2024	2.886
Totaal	350		13.867		14.692

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Defensie die zijn opgenomen in bijlage 2 van dit verslag

Op basis van de tabel doet het Rekenhof de volgende vaststellingen:

- Met de infrastructuurkosten en het deel van de kosten voor de aanleg van een munitievoorraad erbij, bedragen de totale investeringskosten voor de gemotoriseerde capaciteit van de Strategische Visie van 2016 6.471 miljoen euro⁷³, in geactualiseerde kosten van 2024. Het ambitieniveau in de Strategische Visie komt overeen met vijf manoeuvrebataljons, waarvan de interoperabiliteit met het Franse leger verzekerd zou zijn.
- Het ambitieniveau dat overeenkomt met het STAR-plan van 2022 omvat vier infanteriebataljons en twee cavaleriebataljons. In vergelijking met de Strategische Visie betekent dat een toename van de vuurkracht, extra gevechtsondersteunende capaciteiten en het aanleggen van een munitievoorraad. De extra kosten voor dat ambitieniveau bedragen 6.673 miljoen euro, in geactualiseerde kosten van 2024. Dat bedrag houdt geen rekening met de werkingskosten die voortvloeien uit contracten die niet zijn opgenomen in het partnerschap met Frankrijk.
- Als rekening wordt gehouden met de volledige levenscyclus van die verschillende investeringen voor de gemotoriseerde capaciteit, inclusief werking, munitievoorraad en infrastructuur, komt het totaal op minstens⁷⁴ 14,7 miljard euro, in geactualiseerde kosten van 2024.

Volgens het Rekenhof is het voor een correcte voorlichting van de regering en het parlement essentieel dat alle factoren die tot extra kosten leiden, in aanmerking worden genomen van bij de eerste stadia van dergelijke projecten. Het is van oordeel dat het ook een goede praktijk zou zijn geweest om de ramingen en de gedetailleerde berekeningen op te nemen in de verschillende nota's daaromtrent aan de ministerraad, wetende dat de ramingen in dat stadium op hypothesen kunnen berusten.

Als de regering bovendien beslist volledig aan de eisen van de NAVO te voldoen (zie [punt 2.2.3.4](#)), zullen de kosten voor de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit nog hoger uitvallen.

⁷² De aanleg van een munitievoorraad omvat 1.339 miljoen euro voor de investeringen van de Strategische Visie en 1.547 miljoen euro voor het STAR-plan.

⁷³ Namelijk 4.746 miljoen euro voorzien in de Strategische Visie + 386 miljoen euro voor de infrastructuur + 1.339 miljoen euro voor de munitievoorraad.

⁷⁴ Aangezien de andere aankopen uit het STAR-plan ten gunste van de gemotoriseerde capaciteit nog niet zijn gebeurd, konden de werkingskosten voor die investeringen immers nog niet worden geraamd en in aanmerking worden genomen.

3.5.3.3 Antwoord van Defensie

Volgens Defensie is het moeilijk alle kosten van een investering in een wapensysteem in te schatten omdat het materieel op het ogenblik van de aankoopbeslissing over het algemeen nog niet is geproduceerd en de militaire doctrine nog niet op punt staat. Bovendien zijn de onderhouds- en werkingskosten afhankelijk van het gebruik van het materieel en van de vereisten van de NAVO.

In haar antwoord op het ontwerpverslag benadrukt Defensie dat ze alle officiële documenten in haar bezit aan het Rekenhof heeft bezorgd. Wat de raming betreft van de totale kosten van de investeringen die nodig zijn om te voldoen aan de capaciteitsdoelstellingen van de NAVO, wijst Defensie erop dat die raming op informele wijze gebeurt en aan elke nieuwe regering wordt voorgesteld. Toch stelt het Rekenhof vast dat Defensie die ramingen niet aan het Rekenhof heeft bezorgd, hoewel daar herhaaldelijk formeel om werd verzocht. Artikel 5bis van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof bepaalt nochtans dat het zich te allen tijde alle documenten en inlichtingen kan doen verstrekken, van welke aard ook.

In verband met de raming van de totale levenscycluskosten voor de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit is Defensie van oordeel dat men moet vermijden om perimeters te vergelijken die niet te vergelijken zijn.

Defensie wijst erop dat overeenkomst 18LP100 die in 2018 werd ondertekend voor 1.575 miljoen euro enkel betrekking had op 382 Griffons en 60 Jaguars, dus slechts een deel van de te vernieuwen systemen. Ze erkent de extra kosten van nagenoeg 300 miljoen euro (in constante euro 2018) voor dat deel. De vernieuwing van de andere delen werd na 2018 voortgezet in nieuwe dossiers, met hun eigen cyclus voor goedkeuring door de regering, los van de beslissing die in 2018 genomen werd.

Volgens het Rekenhof kan dat duidelijke onderscheid dat Defensie maakt, niet worden afgeleid uit de teneur van de strategische en beleidsdocumenten van destijds. De prospectie die in 2016 werd gevoerd, heeft betrekking op *“de mogelijke aankoop van een vloot van ongeveer 500 voertuigen [...] teneinde te voorzien in de volledige wederuitrusting van de interwapen-gemotoriseerde capaciteit van de landstrijdkrachten”*⁷⁵. In 2018 verduidelijkt de titel van die overheidsopdracht 18LP100 voor *“de wederuitrusting van de manoeuvre-eenheden, de combat support en de combat service support eenheden van de interwapen-gemotoriseerde capaciteit (met inbegrip van een bepaalde ISTAR- en medische steun-capaciteit)”* dat die ook gevechtsondersteunende elementen (*combat support*) en ondersteuningssystemen (*combat service support*) omvat, die in principe beschikbaar moeten zijn om van een echte gemotoriseerde brigade te kunnen spreken volgens de NAVO. De meeste van die elementen zullen echter afzonderlijk worden aangekocht in het kader van het STAR-plan van 2022. Volgens Defensie zijn die nieuwe investeringen het gevolg van de gewijzigde geopolitieke context en het bijgestelde ambitieniveau van de regering. Ze is dus van oordeel dat de totale levenscycluskosten van al die investeringen niet konden worden geraamd in 2018.

Het Rekenhof heeft effectief vastgesteld dat de extra investeringen naar aanleiding van de aankoop van 382 Griffons en 60 Jaguars hun eigen goedkeuringscyclus hebben gevolgd. Ze kunnen volgens het Rekenhof echter niet los worden gezien van de beslissing van 2018, aangezien ze een aanvulling vormen op de initiële investering en bijdragen aan dezelfde doelstelling om te beschikken over een operationele gemotoriseerde brigade die zou moeten beantwoorden aan de NAVO-capaciteitsdoelstellingen voor de ontplooiing van een dergelijke brigade (zie [punt 2.2.3.4](#)).

⁷⁵ Minister van Defensie, nota aan de ministerraad van 22 juni 2017 met betrekking tot overheidsopdracht 18LP100.

Het Rekenhof voegt daar nog aan toe dat de Strategische Visie er al in 2016 van uitging dat de gemotoriseerde brigade in blok, als geheel, moest kunnen worden ingezet in het kader van de collectieve defensie⁷⁶.

Aangezien het strategische partnerschap met Frankrijk bedoeld is om de Franse en Belgische landstrijdkrachten interoperabel te maken, wordt het materieel van de gemotoriseerde capaciteit trouwens hoofdzakelijk in het kader van dat partnerschap aangekocht bij de Franse leverancier. Het materieel dat via andere overeenkomsten wordt aangekocht, zal ook geheel of gedeeltelijk met infovalorisatietechnologie moeten zijn uitgerust (zie [punt 2.2.4](#)), om ervoor te zorgen dat het doeltreffend kan worden ingezet bij een gevechtsoopdracht.

Het Rekenhof blijft er dus bij dat de totale levenscycluskosten van alle investeringen die nodig zijn om de NAVO-capaciteitsdoelstellingen te halen, geraamd en meegedeeld hadden moeten worden op het moment van de beslissing om de gemotoriseerde capaciteit opnieuw uit te rusten.

3.5.3.4 Inaanmerkingneming van alle kosten

Vooraleer een beslissing valt over een investering in capaciteit, is het essentieel om een raming te maken van alle kosten die nodig zijn voor het welslagen van het project en de evolutie van die kosten in te schatten tijdens de volledige levensduur. Op die manier kunnen de regering en het parlement geïnformeerd worden over de totale kostprijs en de financiële houdbaarheid van het project.

Die raming omvat vaak onzekerheden bij de opstart van het project. De NAVO stelt verschillende methodes en modellen ter beschikking waarmee die onzekerheden in aanmerking kunnen worden genomen om tot een betere raming te komen (zie [punt 3.1.2](#)). De raming moet achteraf ook worden verfijnd op basis van geactualiseerde gegevens (feedback na concrete ervaringen op het terrein).

Het belang van zo'n planning is des te groter nu Defensie verschillende grote programma's heeft gelanceerd met investeringen die bedoeld zijn om de capaciteiten te verbeteren (F35, gemotoriseerde capaciteit, mijnenbestrijdingsvaartuigen en fregatten). Er moeten dan ook begrotingsmiddelen worden vrijgemaakt voor de infrastructuur, het personeel en de werking van al het materieel binnen alle componenten van Defensie. Om de financiële houdbaarheid van de programma's te kunnen garanderen, is het noodzakelijk dat eerst een raming van de totale kosten wordt gemaakt.

Aanbeveling 5

Voor projecten met zo'n groot budget en zo'n lange looptijd, voorzien in een projectbeheer dat alle fases omvat om de kosten van het project gedurende de levensduur beter in te schatten, in overeenstemming met de aanbevelingen van de NAVO; die planning gedurende de hele levenscyclus van het project bijwerken op basis van feedback over het gebruik van het materieel

⁷⁶ Strategische Visie, p. 78; STAR-plan, p. 36.

Aanbeveling 6

Om de financiële houdbaarheid van het project te garanderen en om de regering en het parlement te informeren voordat er een investeringsbeslissing wordt genomen, een raming maken van de totale levenscycluskosten van het project, inclusief de kosten voor de aankoop, het onderhoud en de werking (behoefte aan munitie, brandstof, personeel en infrastructuur); de raming van de totale levenscycluskosten baseren op een behoefteanalyse die afhankelijk is van het ambitieniveau dat de regering heeft vastgesteld (gedeeltelijke of volledige naleving van de NAVO-vereisten)

In haar antwoord op het ontwerpverslag stemt Defensie in met de aanbevelingen van het Rekenhof. Ze benadrukt dat voor bepaalde investeringen, zoals de F35, de totale levenscycluskosten worden geraamd. Die aanpak zou systematisch kunnen worden gehanteerd voor grote programma's, maar de nauwkeurigheid ervan zal afhangen van de maturiteit van het programma in kwestie, van het ambitieniveau van het moment, van de beschikbare gegevens en van de hypothesen waarop men zich baseert.

3.5.4 Budgettaire houdbaarheid

De investeringen in wapensystemen impliceren langlopende financiële verbintenissen. Tussen de beslissing om een specifiek systeem aan te kopen en de datum van de eerste leveringen zitten verschillende jaren. De wetgever heeft die beslissingen dan ook verankerd in militaire programmeringswetten om zo de toekomstige begrotingsvastleggingen te garanderen.

Zo biedt de militaire programmeringswet van 23 mei 2017 een kader voor capaciteitsinvesteringen per wapensysteem. De tweede militaire programmeringswet van 20 juli 2022 vloeit voort uit het STAR-plan en bevat ook een prognose voor de aanwerving van militair en burgerpersoneel.

De financiële informatie in de militaire programmeringswetten komt overeen met die in de Strategische Visie van 2016 en het STAR-plan van 2022. Die programmeringswetten geven een algemeen beeld van de investeringen in het hoofdmaterieel van de wapensystemen.

Aangezien Defensie echter verschillende grote programma's heeft gelanceerd met investeringen die bedoeld zijn om de capaciteiten te verbeteren, moeten er in elk geval ook middelen beschikbaar worden gesteld voor infrastructuur, personeel en werking. Zelfs als het budget van Defensie toeneemt, kan door het gebrek aan informatie over de totale kosten van de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit niet worden gecontroleerd of de geplande middelen zullen volstaan om alle uitgaven te financieren.

Volgens Defensie worden de vijfjarenplannen opgesteld vijf jaar vóór de ontvangst van het materieel. De plannen en de werkingsbudgetten worden elk jaar geactualiseerd. Op die manier worden de technische gegevens over het algemeen drie jaar vóór de ontvangst van het materieel ontvangen van de constructeur en worden de plannen en budgetten dan geactualiseerd op basis van die gegevens, die nauwkeuriger zijn en een meer realistische planning mogelijk maken.

De werkingsmiddelen worden aangepast op basis van de geactualiseerde toestand en van alle andere systemen van de landcomponent. De kosten voor onderhoud, brandstof of munitie kunnen immers worden gespreid over verschillende types van pantserovertuigen, en niet enkel over

de Griffons en de Jaguars. Die kosten volgen dus niet systematisch de investeringsplannen voor de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit. Daardoor is er altijd een verschil tussen de reële behoeften en de toegekende kredieten.

Nu de oplevering van de eerste voertuigen nakend is⁷⁷, heeft Defensie voor de gemotoriseerde capaciteit de ramingen verfijnd van de werkingskosten voor het rollend materieel en van de investeringen in infrastructuur. Ondanks het groeipad voor het Defensiebudget dat in het STAR-plan is vastgelegd, zal die stijging volgens Defensie⁷⁸ vermoedelijk niet volstaan, ook al is er in 2022 al 1 miljard euro uitgetrokken voor een uitbreiding van de munitievoorraden. De raming van de reële behoeften voor de werking van de landcomponent ligt namelijk hoger dan de budgetten die in het STAR-plan zijn opgenomen. Het verschil wordt geschat op meer dan 200 miljoen euro per jaar tussen 2025 en 2027. Voor 2028 wordt het op 435 miljoen euro geraamd. Voor de periode 2025-2028 bedraagt het totale verschil 1.048 miljoen euro. Een dergelijk tekort aan budgettaire middelen zou het optimale onderhoud van voertuigen kunnen belemmeren, ertoe kunnen leiden dat de instandhouding van de munitievoorraden op het vereiste niveau onmogelijk wordt, of zelfs dat slechts een deel van de volledige voertuigenvloot tijdens gevechtsmissies kan worden ingezet. Er is bijgevolg een reëel risico op budgettaire verdringing.

Dat risico op budgettaire verdringing doet zich ook voor op het niveau van elke afzonderlijke component, aangezien Defensie haar andere uitgaven zou moeten verlagen om de behoeften die ontstaan door het gebruik van het nieuwe materieel te dekken, en ook op het niveau van het Defensiebudget als geheel, wat keuzes zou vereisen tussen investeringen, de werking van het materieel en andere soorten uitgaven, zoals personeelsuitgaven.

In april 2025 besliste de regering de defensie-inspanning vanaf 2025 op te trekken naar 2 % van het bbp. De doorgevoerde verhoging van het Defensiebudget kan het risico op budgettaire verdringing verminderen. Bij gebrek aan onder meer een raming van de totale levenscycluskosten van de investeringen die nodig zijn om te beantwoorden aan het ambitieniveau van de regering en aan de militaire capaciteitsdoelstellingen van de NAVO, kon het Rekenhof echter niet evalueren of de verhoging van het budget en de inzet van de middelen het mogelijk zullen maken om de werkelijke behoeften te dekken.

Volgens het Rekenhof helpt de opmaak van een realistische planning van de budgettaire middelen om dat risico op budgettaire verdringing te beheersen. Die planning moet uitgaan van de reële behoeften, rekening houdend met de evolutie van de geopolitieke context en met de noodzakelijke evoluties van het materieel, de infrastructuur en het personeel.

Om voldoende budgetten te garanderen die de reële behoeften van Defensie dekken – welke samenhangen met het optimale gebruik van haar investeringen, waaronder die voor de gemotoriseerde capaciteit – zouden de middelen vooraf moeten worden geraamd en bestendig.

⁷⁷ In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat de pantservoertuigen vanaf 2025 geleverd worden.

⁷⁸ DGMR, raming meegedeeld op 1 december 2023.

Aanbeveling 7

Voor de grote investeringsprogramma's, met inbegrip van de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit, onderzoeken of in de militaire programmeringswet de werkings-, onderhouds- en personeelsaspecten kunnen worden opgenomen, evenals de begrotingsmiddelen die nodig zijn voor een optimaal gebruik van de capaciteiten; deze wet periodiek bijwerken rekening houdend met de feedback, de behoeften en de evoluties in het ambitieniveau van de regering of de capaciteitsdoelstellingen van de NAVO

3.6 Conclusies**3.6.1 Programmabeheer**

Het programmabeheer voor de aankoop van een strategisch wapensysteem is zeer complex en vereist een aangepaste werkwijze.

Het Rekenhof stelt vast dat er *steering committees* zijn opgericht die moeten toezien op de uitvoering van de onderdelen uit de Frans-Belgische intergouvernementele overeenkomst (aankoop, doctrine, opleiding en training) en dat er een planning is opgesteld. Die planning heeft onder meer betrekking op de transformatie van de landcomponent van de Belgische Defensie, die moet uitmonden in een interoperabiliteit tussen de twee legers. Op het vlak van personeel bevatten het STAR-plan en de omzetting ervan in een bedrijfsplan doelstellingen om het personeelsbestand van Defensie uit te breiden en haar aantrekkelijker te maken als werkgever. Het STAR-plan legde ook extra budgetten vast voor investeringen in infrastructuur en voor de werking ervan (energie, onderhoudscontracten enz.).

Wat het onderhoud betreft, is het project om in België een competentiecentrum op te richten voor zwaar en evolutief onderhoud van rollend materieel, waaronder de voertuigen van de gemotoriseerde capaciteit, een goed initiatief.

Het Rekenhof stelt echter vast dat de werking en het onderhoud van het materieel niet zijn gepland en evenmin in de intergouvernementele overeenkomst zijn opgenomen. De kosten daarvoor waren aanvankelijk niet bekend en de onderhandelingen daarover met de leverancier gingen van start vijf jaar na de aankoopovereenkomst en twee jaar vóór de eerste leveringen van voertuigen.

De budgetten die in het STAR-plan zijn opgenomen voor de renovatie of de bouw van de infrastructuur die nodig is om het nieuwe materieel in onder te brengen, zijn niet gebaseerd op de reële behoeften en zijn niet uitgesplitst per legercomponent. Dat is echter wel het geval in het infrastructuurplan dat werd opgesteld voor de periode 2024-2028. Toch is het niet zeker dat de budgetten die nodig zijn voor de werking van al die infrastructuur, aan alle behoeften zullen kunnen voldoen.

Volgens het Rekenhof vereist het beheer van dat soort grootschalige projecten dat rekening wordt gehouden met alle fasen van de levensduur ervan, overeenkomstig de aanbevelingen van de NAVO.

3.6.2 Totale kosten van het programma

Het Rekenhof stelt vast dat de globale kosten voor de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit niet werden geraamd bij de militaire prospectie in 2016 noch in 2017 toen de ministerraad Defensie de toestemming gaf *“een aankoopprogramma op te starten dat erop gericht is een intergouvernementeel akkoord af te sluiten met Frankrijk met het oog op de vervanging van de interwapen-gemotoriseerde capaciteit”*.

Ten tijde van de beslissing in 2018 om een intergouvernementele overeenkomst af te sluiten, beperkten de initiële investeringskosten van het eerste protocol voor leveringen van 1,575 miljard euro zich tot de aankoop van voertuigen en verschillende uitrustingen, de doctrine, de opleiding en de training. Niet inbegrepen waren de kosten voor het onderhoud en de werking (munitie, brandstof, infrastructuur), hoewel die het grootste deel van de kosten uitmaken. Voor het onderhoud is in de nota aan de ministerraad een raming van 60 miljoen euro per jaar opgenomen, wat neerkomt op 1,5 miljard euro in constante kosten over 25 jaar, maar daarover werd geen beslissing genomen.

Dat er van meet af aan geen voorwaarden zijn vastgelegd voor het onderhoud en de werking, houdt volgens het Rekenhof het risico in op een aanzienlijke afhankelijkheid van de leverancier en een gebrek aan beheersing van de bijbehorende kosten.

De extra investeringen van 4,78 miljard euro die in 2022 voor de gemotoriseerde capaciteit werden vastgelegd in het STAR-plan, met name vanwege de geopolitieke context, omvatten evenmin een raming van de onderhouds- en werkingskosten.

Uit ramingen van Defensie in 2024 blijkt dat de berekening van de totale levenscycluskosten (over 25 jaar) van de investeringen in de gemotoriseerde capaciteit die in 2018 en 2022 werden goedgekeurd, met inbegrip van de werking, het onderhoud en de munitie, de totale kostprijs op minstens 14,7 miljard euro brengt, in geactualiseerde kosten van 2024. De werkingskosten die samenhangen met de andere aankopen waarin het STAR-plan voorziet en die nog niet zijn gedaan, zijn niet in dat bedrag opgenomen. Die kostprijs omvat evenmin de extra investeringen die nodig zijn om volledig te voldoen aan de militaire capaciteitsdoelstellingen van de NAVO voor de inzet van een gemotoriseerde brigade.

Volgens Defensie is het ingewikkeld om vooraf alle kosten van een investering in een wapensysteem te ramen, omdat het materieel op het ogenblik van de aankoopbeslissing meestal nog niet is geproduceerd en de militaire doctrine nog niet op punt staat. Bovendien zijn de onderhouds- en werkingskosten sterk afhankelijk van het gebruik van het materieel, dat varieert naargelang van de evolutie van de dreigingen en de geopolitieke context.

De uitgaven voor werking (munitie, brandstof, onderhoud), personeel en infrastructuur zijn voor Defensie als geheel opgenomen in de algemene uitgavenbegroting, waarvan het groeipad is vastgelegd in de Strategische Visie van 2016 en het STAR-plan van 2022. Het Rekenhof wijst er echter op dat die uitgaven niet zijn uitgesplitst per component of per wapensysteem, en dat niet systematisch hun verband met de reële behoeften wordt aangetoond. Er zijn dus niet genoeg garanties dat het groeipad zal volstaan om de optimale werking van alle verworven capaciteiten te garanderen.

In haar antwoord op het ontwerpverslag benadrukt Defensie dat de overeenkomst die in 2018 werd ondertekend voor 1.575 miljoen euro, enkel betrekking had op 382 Griffons en 60 Jaguars,

en dat ze niet kan worden vergeleken met het bedrag van 14,7 miljard euro dat de totale levenscycluskosten omvat van alle investeringen in de gemotoriseerde capaciteit die in 2018 en 2022 werden goedgekeurd. Die latere investeringen vloeien voort uit het toegenomen ambitieniveau van de regering als gevolg van de gewijzigde geopolitieke context en hebben hun eigen cyclus voor goedkeuring door de regering gevolgd, los van de beslissing die in 2018 genomen werd.

Volgens het Rekenhof zijn die extra investeringen intrinsiek verbonden met de beslissing van 2018. Die gevechtsondersteunende elementen (*combat support*) en ondersteunende elementen (*combat service support*), waarvan de aankoop werd opgenomen in het STAR-plan van 2022, moeten in principe beschikbaar zijn om volgens de NAVO echt van een operationele gemotoriseerde brigade te kunnen spreken. De interoperabiliteit tussen de Franse en Belgische landstrijdkrachten, die de kern vormt van het strategische partnerschap met Frankrijk, vereist daarenboven dat het aanvullende materieel geheel of gedeeltelijk moet zijn uitgerust met infovalorisatietechnologie om doeltreffend te kunnen worden ingezet tijdens een gevechtsoopdracht. Daarom wordt het extra materieel van de gemotoriseerde capaciteit hoofdzakelijk aangekocht bij dezelfde Franse leverancier.

Het Rekenhof is dan ook van oordeel dat de totale levenscycluskosten van alle investeringen die nodig zijn om de NAVO-doelstellingen op het vlak van militaire capaciteit te halen, geraamd hadden moeten worden op het moment dat beslist werd om de gemotoriseerde capaciteit opnieuw uit te rusten. Op basis van een dergelijke raming hadden de beleidsmakers hun ambitieniveau kunnen definiëren en de nodige budgetten kunnen uittrekken om dat niveau te behalen. Die raming moet bovendien worden herbekeken en verfijnd op basis van de gewijzigde geopolitieke context en de nieuwe NAVO-doelstellingen op het vlak van militaire capaciteit.

3.6.3 Budgettaire houdbaarheid

Het Rekenhof wijst erop dat het budgettaire groeipad dat in het STAR-plan is vastgelegd, niet werd nageleefd. Voor 2024 bepaalde het plan een defensie-inspanning van 1,24 % van het bbp. In november 2024 was dat 1,17 %. Aangezien er ook geen realistische raming bestaat van de totale investeringskosten, waaronder die voor de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit, worden alle componenten van Defensie blootgesteld aan een budgettair risico. Als de budgetten niet worden aangepast aan de reële behoeften, zal Defensie ofwel andere uitgaven moeten terugschroeven om het hoofd te kunnen bieden aan de vereisten van het nieuwe materieel, ofwel ertoe gedwongen worden om het aangekochte materieel maar gedeeltelijk te gebruiken. Dat risico is reëel, aangezien er volgens de analyse van Defensie⁷⁹ een tekort van 1.048 miljoen euro zou zijn om de reële behoeften te dekken in de periode 2025-2028, ten opzichte van de budgetten voor de landcomponent die in het STAR-plan zijn opgenomen.

De beslissing van de regering van april 2025 om de defensie-inspanning vanaf juni 2025 op te trekken naar 2,0 % van het bbp kan dat risico op budgettaire verdringing verminderen, zonder het echter volledig uit te sluiten. Er is momenteel geen garantie dat die stijging zal volstaan om de reële behoeften te dekken en de aangekochte capaciteiten optimaal te kunnen laten werken en onderhouden.

Om dat risico beter te omkaderen moet er volgens het Rekenhof een realistische en volledige planning van de budgettaire middelen worden vastgelegd.

Hoofdstuk 4

Return voor de Belgische economie

In dit hoofdstuk onderzoekt het Rekenhof het proces om de return te bepalen die voor België wordt verwacht in het kader van de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit, samen met de effectiviteit ervan.

4.1 Industriële compensaties en return

Industriële of economische compensaties kunnen worden gedefinieerd als de contractuele verplichting voor buitenlandse leveranciers om bestellingen voor materieel of diensten bij binnenlandse ondernemingen te plaatsen. Concreet gaat het dus om compensaties of voordelen die kopende landen kunnen eisen van verkopers om hun economische en industriële ontwikkeling te bevorderen.

Dat soort compensaties kan onverenigbaar zijn met de EU-verdragen en de richtlijnen voor overheidsopdrachten. Ze kunnen immers *“de concurrentievoorwaarden verstoren, tot anti-economische beslissingen leiden (aankoop van een minder efficiënt of duurder product vanwege de geboden tegenprestatie) en een bron van corruptie zijn vanwege het gebrek aan transparantie in de waardering van de tegenprestatie”*⁸⁰. Als het over veiligheid en defensie gaat, kan dat soort compensaties onder heel strikte voorwaarden worden toegestaan.

Richtlijn 2009/81/EG betreffende overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied staat compensaties niet in de weg, maar gaat ook niet expliciet op het thema in. Dat er geen expliciete vermelding in staat, betekent niet dat compensaties illegaal zijn, maar dat ze per geval moeten worden gerechtvaardigd in overeenstemming met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). In 2008 heeft het Europees Defensieagentschap een vrijwillige gedragscode goedgekeurd over compensaties bij de aanschaf van goederen en diensten voor Defensie. Die moet dat soort praktijken omkaderen en beperken, die a priori concurrentieverstorend zijn en indruisen tegen de doelstelling om de Europese technologische en industriële defensiebasis (EDTIB)⁸¹ op te bouwen.

Lidstaten hebben het recht om bepaalde opdrachten uit te sluiten van het toepassingsgebied van de richtlijnen inzake overheidsopdrachten, krachtens artikel 346 van het VWEU, wanneer dat strikt noodzakelijk is voor de bescherming van hun essentiële veiligheidsbelangen. In dat verband zijn enkel rechtstreekse compensaties toegestaan, met name compensaties die rechtstreeks verband houden met het voorwerp van de opdracht. De ministerraad bepaalde de

⁸⁰ Cour des comptes (Frankrijk), *Le soutien aux exportations militaires*, thematisch verslag, januari 2023, p. 57, www.ccomptes.fr.

⁸¹ De Europese technologische en industriële defensiebasis (EDTIB) is een groep van bedrijven en instellingen binnen de Europese Unie die uitrusting en technologieën voor Defensie ontwerpen, ontwikkelen en produceren. De EDTIB speelt een cruciale rol in de veiligheid en strategische autonomie van de EU, door de mogelijkheid te bieden de afhankelijkheid ten opzichte van externe leveranciers te verminderen en door de samenwerking tussen de lidstaten te versterken.

essentiële veiligheidsbelangen waarmee rekening moet worden gehouden bij het inroepen van artikel 346, §1, b), van het VWEU⁸².

In België wordt dat compensatiemechanisme soms ‘maatschappelijke return’⁸³ genoemd. Het doel blijft om de lokale industrie in het kopende land te versterken, banen te creëren, technologische en industriële capaciteiten te ontwikkelen en lokale innovatie te bevorderen.

4.2 Return in het eerste protocol voor leveringen

4.2.1 Beleidsdoelstelling

Volgens het federale regeerakkoord van 9 oktober 2014 zijn investeringen in uitrusting noodzakelijk om over een modern leger te beschikken. De regering belooft rekening te houden met de industriële en economische dimensie en artikel 346 van het VWEU in te roepen wanneer de gelegenheid zich voordoet.

De Strategische Visie van 2016 bevestigt opnieuw het belang van de ‘maatschappelijke return’⁸⁴ en stelt dat de opbrengst van de investeringen voor de maatschappij moet worden geoptimaliseerd via kennis, technologie en werkgelegenheid. Verder bepaalt de visie dat de FOD Economie in samenwerking met Defensie uitvoeringsmaatregelen moet opstellen om een maximale economische opbrengst van de militaire aankopen te garanderen, met name door gebruik te maken van artikel 346 van het VWEU.

4.2.2 Aard van de contractuele relatie

Het eerste protocol voor leveringen dat in 2018 in het kader van de Frans-Belgische intergouvernementele overeenkomst is gesloten, vloeit voort uit een overheidsopdracht die de Belgische regering aan de Franse regering heeft gegund voor de levering van militair of gevoelig materieel⁸⁵. Die is niet onderworpen aan de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op het vlak van defensie en veiligheid. Bovendien is er geen directe contractuele relatie tussen de Belgische Staat en de Franse leverancier. Volgens de intergouvernementele overeenkomst fungeert België als klant (opdrachtgever) en Frankrijk als gemachtigde (zie [figuur 3](#)).

4.2.3 Verwachte return

Bij de ondertekening van de intergouvernementele overeenkomst kondigde de Franse leverancier in een intentieverklaring een return voor België aan van 890 miljoen euro tegen het jaar 2030. Een optioneel bedrag van 20 miljoen euro werd ook gereserveerd voor de aankoop van 100 geschutstorens om tanks van het Franse leger mee uit te rusten.

⁸² FOD Economie, *De Belgische belangen op het vlak van Defensie en veiligheidsbeleid*, goedgekeurd door de ministerraad van 28 oktober 2016, www.economie.fgov.be.

⁸³ Parl. St. Kamer, 31 oktober 2023, DOC 55 3649/022, *Beleidsnota. Defensie en Oorlogsslachtoffers en slachtoffers ingevolge daden van terrorisme*, 63 p., www.dekamer.be.

⁸⁴ Regering, op. cit., p. 128.

⁸⁵ Een overheidsopdracht is een overeenkomst onder bezwarende titel die wordt gesloten tussen een of meer ondernemers, leveranciers of externe dienstverleners enerzijds en een of meer aanbestedende overheden of overheidsbedrijven anderzijds, en die betrekking heeft op het uitvoeren van werken, het leveren van producten of het verlenen van diensten. Een Staat is altijd een aanbestedende overheid, maar kan in sommige gevallen ook de rol aannemen van ondernemer, leverancier of dienstverlener.

De beoogde return betreft de overdracht van bepaalde activiteiten of vaardigheden van de Franse leverancier naar Belgische bedrijven of hun dochterondernemingen in België, zowel voor de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit als voor contracten die voornamelijk betrekking hebben op de assemblage van voertuigen en de productie van geschutstorens. Voor het technologische gedeelte gaat het vooral om de overdracht van vaardigheden en de uitbreiding van activiteiten naar dochterondernemingen in België, met name op het gebied van cyberbeveiliging en elektronische configuratie.

4.2.4 Beperkingen van de definitie van return

De return die voor Camo 1 verwacht werd, botste al van bij de definitie ervan op tekortkomingen die de impact op de Belgische economie beperken.

De Belgische Staat heeft geen beroep gedaan op artikel 346 §1, b), van het VWEU terwijl de FOD Economie een gunstig advies had geformuleerd. Aangezien de beslissing van de ministerraad van 25 oktober 2018 die keuze niet motiveerde, ontbrak het in de contractuele documenten aan een volledig kader voor die return.

Om tegemoet te komen aan de politieke wens van België, stelde de leverancier een intentieverklaring op voor de Belgische Defensie met daarin een aantal activiteiten die naar België konden worden overgebracht om return op te leveren. De Belgische bedrijven die als onderaannemer moesten optreden, sloten vervolgens B2B-overeenkomsten (*business-to-business*) met de leverancier.

Tot slot geldt in het algemeen dat in geval van samenwerking tussen Staten voor de ontwikkeling van een wapensysteem, elk land een deel van de productie kan toewijzen aan zijn industrie, in verhouding tot zijn bijdrage aan de ontwikkeling. In het geval van de gemotoriseerde capaciteit sloot België zich echter aan bij een lopend programma van het Franse leger, wat de mogelijkheden beperkte om de Belgische industrie te betrekken bij de ontwikkeling van de gemotoriseerde capaciteit. Ook werden de productielijnen ontworpen voor de behoeften van het Franse leger en zijn de veiligheidsprotocollen tussen de industrie en het Franse leger gesloten om de belangen van Frankrijk te vrijwaren.

Het Rekenhof stelt vast dat de return van 910 miljoen euro verband houdt met de aankoop van materieel en niet met het onderhoud ervan. Het voegt daaraan toe dat Defensie de Belgische industrie heeft geraadpleegd en van plan is een deel van het onderhoud⁸⁶ toe te vertrouwen aan een Belgisch consortium (zie punt 3.3.4).

Bovendien is de return bij de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit enkel gebaseerd op het eerste protocol voor leveringen (Camo 1). Sindsdien zijn er nieuwe aankopen gedaan of gepland in het kader van het partnerschap met Frankrijk. Het Rekenhof stelt vast dat tegenover die laatste investeringen momenteel geen enkele return staat, afgezien van een voorstel van de Franse leverancier van oktober 2023 met betrekking tot de 19 Caesar-artilleriesystemen en de 24 Griffon-voertuigen in Mepac-uitvoering. Dat voorstel, dat voornamelijk ten goede komt aan de Belgische dochteronderneming van die leverancier, is gebaseerd op een stijging van het omzetcijfer, waardoor de werkelijke meerwaarde voor de Belgische economie niet kan worden bepaald (zie punt 4.4.2).

86 In ruimere zin gaat het daarbij om het onderhoud van het materieel van de landcomponent.

4.3 Opvolging van en rapporten over de return door de FOD Economie

4.3.1 Voorafgaande analyse door de FOD Economie

In zijn nota van 20 juli 2018 aan de minister van Economie heeft de FOD Economie de return geanalyseerd die de Franse leverancier in zijn intentieverklaring heeft voorgesteld. De vaststellingen daarin zijn de volgende:

- De Belgische ondernemingen waren voorstander van het voorstel.
- De raming van de return baseerde zich op de nominale waarde van de transacties (voorbeeld: omzet of raming van de waarde van de overgedragen vaardigheden) in plaats van op de toegevoegde waarde voor de Belgische economie, wat een betere indicator zou zijn geweest van de economische activiteit op Belgisch grondgebied.
- De contracten tussen de Franse leverancier en de Belgische ondernemingen bevatten geen bindende bepalingen voor het geval de bestellingen lager uitvallen dan geraamd.
- De vermenigvuldigingsfactor van 2,22 voor de omzet die de Franse fabrikanten voorstellen om de return voor de Belgische ondernemingen te ramen, is niet bruikbaar voor een opvolging, wegens overschat en moeilijk controleerbaar.

4.3.2 Opvolging van de return door de FOD Economie

De FOD Economie is belast met de opvolging van de return voor de Belgische economie. Om de zes maanden verzamelt de FOD de gegevens en brengt hij periodiek verslag uit aan de commissie Legeraankopen en -verkoop van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Voor die opvolging maakt de FOD Economie gebruik van de informatie die hij van de Franse leverancier ontvangt. Voor de bestellingen bij Belgische ondernemingen vergelijkt de FOD de gegevens van de leverancier met de bestellingen die de Belgische ondernemingen effectief ontvangen. Wanneer die return de vorm aanneemt van een overdracht van vaardigheden of activiteiten naar een Belgische dochteronderneming, is het echter moeilijk om na te gaan of die correct is uitgevoerd. De FOD Economie beperkt zich tot het rapporteren van de verklaringen van de Franse leverancier. Om na te gaan of die overdrachten ook effectief zijn gebeurd, zou er volgens de FOD toegang nodig zijn tot vertrouwelijke informatie en zou het extra tijd en middelen vergen. Hij is echter niet gemachtigd om de informatie van de leverancier te controleren. De return past binnen een *business-to-business*-kader en wordt op vrijwillige basis toegekend. Die return is niet bindend en de contractuele omkadering ervan is ontoereikend (zie [punt 4.2.4](#)).

Volgens het Rekenhof zijn de rapporten van de FOD Economie over de uitvoering van de return een goede praktijk. Die opvolging zou echter gebaseerd moeten zijn op een effectieve controle van de verklaringen van de leverancier. Die controle moet dan weer gebaseerd zijn op een analyse van het bewijsmateriaal dat de opgegeven cijfers ondersteunt. Daartoe moet het mandaat van de FOD Economie worden verduidelijkt, zodat de regering en de commissie Legeraankopen en -verkoop van de Kamer van Volksvertegenwoordigers betrouwbare informatie kunnen krijgen over de reële return voor België.

4.4 Implementatie van de return voor de Belgische economie

4.4.1 Betrokkenheid van de Belgische ondernemingen bij het ontwerp van de return

Het Rekenhof heeft de Belgische industriële actoren bevestigd die betrokken zijn bij de return. Ze zijn van mening dat de Belgische ondernemingen vóór de ondertekening van de intergouvernementele overeenkomst onvoldoende betrokken waren bij het project.

Dat gebrek aan betrokkenheid komt waarschijnlijk doordat er destijds geen Belgisch representatief orgaan bestond waarin de Belgische industrie en de Belgische Defensie vertegenwoordigd waren. Sindsdien heeft de grotere dreiging België er echter toe aangezet om, in navolging van het STAR-plan, in 2022 de *Defence, Industry and Research Strategy* (DIRS)⁸⁷ aan te nemen.

De DIRS beschrijft de langetermijnstrategie voor de ontwikkeling en bestendiging van een performante Belgische defensiegerelateerde technologische en industriële basis (DTIB). Een *steering committee* ziet samen met technische onderzoekscomités toe op de toepassing van de strategie. De Belgische industrie, militaire en academische experts, de FOD Economie en Defensie zijn erbij betrokken. In het kader van de DIRS zullen tussen 2026 en 2030 projecten worden uitgevoerd met een budget van 245 miljoen euro⁸⁸. Ook het STAR-plan voorziet in twee budgetten: een eerste van 698 miljoen euro tussen 2022 en 2030 voor investeringen in onderzoek en technologie, en een tweede van 866 miljoen euro tussen 2027 en 2030 voor voorzieningen voor de ontwikkeling van programma's⁸⁹.

Volgens het Rekenhof moet de return België in staat stellen een stevige defensiegerelateerde technologische en industriële basis (DTIB) in stand te houden of te ontwikkelen, en te bestendigen. Daarom moeten de verschillende Belgische industriële actoren al bij het bepalen van de programma's betrokken worden.

Het Rekenhof is van oordeel dat de DIRS van bij het begin betrokken moet worden bij elk project waarvoor een return wordt beoogd. Die betrokkenheid moet worden gerealiseerd met inachtneming van de beginselen van transparantie en gelijke behandeling van de ondernemers, zoals dat bij de voorafgaande marktconsultaties in het kader van overheidsopdrachten is vastgelegd⁹⁰.

Aanbeveling 8

Voor de volgende investeringen in de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit of voor elk ander investeringsprogramma, de comités van de *Defence, Industry and Research Strategy* (DIRS) betrekken van bij de voorbereiding van een project om nieuwe capaciteit te verwerven of bestaande capaciteit uit te breiden; die betrokkenheid tot stand brengen met inachtneming van de beginselen van transparantie en gelijke behandeling van de ondernemers

⁸⁷ Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, *Defence, Industry and Research Strategy - De ontwikkeling en bestendiging van een performante Belgische defensiegerelateerde technologische en industriële basis*, 13 p., www.defence-institute.be.

⁸⁸ Defensie, op. cit., p. 55.

⁸⁹ Naast investeringen in onderzoek en technologie en de financiering van de DIRS, legt het STAR-plan ook een voorziening vast voor de deelname van België aan grootschalige Europese militaire ontwikkelingsprogramma's op lange termijn.

⁹⁰ Artikel 51 van de wet inzake overheidsopdrachten.

4.4.2 Meting en verwezenlijking van de return

Volgens de FOD Economie bedroeg de return op 31 december 2023 in totaal 626 miljoen euro.

Zoals wordt uitgelegd in [punt 4.3.2](#), schiet het toezicht op de goede uitvoering van de return tekort.

Aangezien de return wordt bepaald op basis van een activiteitenvolume dat aan Belgische dochterondernemingen van de Franse leverancier of van zijn onderaannemers wordt overgedragen, van een overdracht van vaardigheden of van omzet, valt de reële toegevoegde waarde voor de Belgische economie bovendien moeilijk te beoordelen. Om die toegevoegde waarde te meten, moet alle intermediair verbruik dat aan buitenlandse bedrijven wordt betaald (aankoop van goederen en diensten), van de omzet worden afgetrokken.

De bestellingen bij Belgische bedrijven slaan overigens soms op contracten die losstaan van het eerste protocol voor leveringen (Camo 1), zoals die voor munitie die niet bestemd is voor de voertuigen die in het kader van Camo 1 zijn aangekocht. Het is dan ook moeilijk een onderscheid te maken tussen de return en de effecten die verband houden met de geopolitieke context. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat de Franse leverancier en zijn onderaannemers Belgische dochterondernemingen hebben die al activiteiten voor de moedermaatschappij uitvoeren. Het risico bestaat dus dat nieuwe economische activiteiten die worden toegeschreven aan de dochterondernemingen in aanmerking worden genomen bij de berekening van de return, terwijl ze enkel het gevolg zijn van een sterk gestegen vraag.

4.4.2.1 Technologische return

De ‘technologische’ onderaannemer wil nieuwe vaardigheden op het vlak van elektronische configuratie en cyberbeveiliging overbrengen naar zijn Belgische dochterondernemingen, om de toekomst van de activiteiten die verband houden met deze return duurzaam te verankeren in België. Die aanpak genereert zowel een directe als een indirecte return. De onderaannemer heeft 27 miljoen euro geïnvesteerd, waarvan bijna 20 miljoen in een nieuwe geautomatiseerde productiesite voor de assemblage van hoogtechnologische producten voor ruimtevaarttoepassingen. In 2018 stelde hij voor deze activiteiten een return van 325 miljoen euro voor.

Volgens de technologische onderaannemer gaat het hier echter om een uiterst concurrentiële markt, wat het bereiken van die doelstelling zou kunnen bemoeilijken. Daarom heeft hij voorgesteld om nieuwe activiteiten over te hevelen naar zijn dochterondernemingen, om zijn doelstellingen uit 2018 op het vlak van return te halen. Het gaat hierbij voornamelijk om het versterken van onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's die in België gevestigd zijn. Aangezien de return voornamelijk bestaat uit het waarden van de overdracht van vaardigheden en een uitbreiding van de activiteiten van zijn dochterondernemingen, is het volgens het Rekenhof moeilijk om de uitvoering ervan op te volgen en de concrete toegevoegde waarde voor de Belgische economie en voor de defensiegerelateerde technologische en industriële basis (DTIB) te beoordelen.

4.4.2.2 Return voor de munitie

Een dochteronderneming van de Franse leverancier heeft een productiesite voor munitie in België. Terwijl uit de boekhouding een daling van de omzet bleek (van 161,6 miljoen euro in 2015 tot minder dan 40 miljoen euro in 2020), is die intussen gestegen tot 72 miljoen euro in 2023. Het is echter moeilijk om die stijging met zekerheid te koppelen aan de return zoals ze bepaald is in het eerste protocol voor leveringen (Camo 1). Ze zou namelijk te maken kunnen hebben met een toename van de vraag naar de munitie die deze dochteronderneming produceert, onder meer als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

In sommige gevallen heeft de Franse leverancier de Belgische fabrikanten tegen elkaar uitgespeeld en is hun onderhandelingspositie dus beperkter geworden. Die manier om de return toe te wijzen dreigt de toegevoegde waarde en dus ook de winstmarge van de Belgische fabrikanten te doen dalen. De toegevoegde waarde gebruiken om de return te meten, zou voor een meer evenwichtige verdeling van de winstmarges tussen de Franse leverancier en de Belgische bedrijven zorgen.

De toewijzing van de activiteiten werd gestuurd door de Franse leverancier en was vooral ingegeven door zijn technische en economische beperkingen. Die aanpak impliceert dat de return niet werd gerealiseerd op basis van de expertise van de Belgische fabrikanten en met de intentie om de Belgische defensiegerelateerde technologische en industriële basis (DTIB) te versterken.

Aanbeveling 9

Ervoor zorgen dat de verwachte return wordt uitgedrukt in toegevoegde waarde voor de Belgische economie en dat hij gekoppeld wordt aan bindende contractuele bepalingen op basis waarvan een opvolging van de uitvoering ervan mogelijk is

In haar antwoord op het ontwerpverslag erkent Defensie dat de verwachte return voor de investeringen in de gemotoriseerde capaciteit beperkt is, en dat voor de nieuwe bestellingen extra inspanningen zullen worden gevraagd aan de Franse leverancier. Ze benadrukt echter dat in het kader van een partnerschap tussen Staten niet altijd dwingende regels kunnen worden opgelegd.

4.5 Conclusies

De verwachte return voor de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit botste al van bij de definitie ervan op tekortkomingen die de impact op de Belgische economie beperken.

Het eerste protocol voor leveringen is opgenomen in een intergouvernementele overeenkomst zonder artikel 346, §1, b), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) in te roepen, en het legt geen enkele vorm van return op. In een intentieverklaring heeft de Franse leverancier zich er echter toe verbonden een return op te leveren van naar schatting 910 miljoen euro tot 2030, inclusief de overdracht van vaardigheden en knowhow in verschillende sectoren, zoals de assemblage van militaire voertuigen en cyberbeveiliging. In het contract is geen enkele bindende clausule opgenomen voor het geval die doelstellingen niet worden gehaald.

De FOD Economie ziet toe op de opvolging van de return en brengt daarom regelmatig verslag uit aan de commissie Legeraankopen en -verkoop van de Kamer van Volksvertegenwoordigers,

wat een goede praktijk is. Aangezien de return vrijwillig en niet-bindend is, is die opvolging voornamelijk gebaseerd op de verklaringen van de Franse leverancier. Het is voor de FOD Economie echter moeilijk om het financiële belang van de overdracht van vaardigheden binnen de Belgische dochterondernemingen van de Franse leverancier na te gaan, bij gebrek aan de nodige mensen en middelen. De FOD kan de activiteiten van de Belgische bedrijven wel gemakkelijker controleren via een analyse van de bestellingen die ze in het kader van de return ontvangen hebben. Om de betrouwbaarheid te garanderen van de informatie die aan de regering en de commissie Legeraankopen en -verkoop van de Kamer van Volksvertegenwoordigers wordt bezorgd, zou de rol van de FOD Economie moeten worden verduidelijkt, om te kunnen controleren of de verklaringen van de Franse leveranciers betrouwbaar zijn en overeenstemmen met de werkelijkheid.

België heeft zich aangesloten bij een lopend programma van het Franse leger en was daarom niet betrokken bij de ontwikkelingsfase van het materieel, wat de betrokkenheid van de Belgische industrie bij de ontwikkeling van het project de facto beperkte. Dat er geen representatief orgaan bestond waarin de Belgische industrie en de Belgische Defensie samen vertegenwoordigd waren, heeft de betrokkenheid van de industrie op het ogenblik van de definitie van de return nog bemoeilijkt. Sindsdien heeft de grotere dreiging en de behoefte aan herbewapening van de Europese legers België ertoe aangezet om in 2022 de *Defence, Industry and Research Strategy* (DIRS) aan te nemen.

Volgens de FOD Economie liep de return eind december 2023 op tot 626 miljoen euro, d.i. 69 % van de vooropgestelde doelstelling van 910 miljoen euro.

Het Rekenhof stelt vast dat de raming van de return gebaseerd is op de omzet van de betrokken Belgische bedrijven, of op de nominale waarde van de activiteiten die aan Belgische dochterondernemingen zijn overgedragen, en niet op de toegevoegde waarde. Nochtans zou de toegevoegde waarde een betere indicator zijn geweest van de reële economische impact in België.

Overigens gaat het bij bepaalde bestellingen die worden meegeteld in de return om producten die niet zijn opgenomen in het eerste protocol voor leveringen (Camo 1), wat het moeilijk maakt om te beoordelen of de geplande return voor de nationale economie daadwerkelijk bereikt werd. Die bestellingen zouden namelijk het gevolg kunnen zijn van een toegenomen vraag naar aanleiding van de gewijzigde geopolitieke context, die losstaat van de aankopen in het kader van het protocol.

Het Rekenhof wijst er ook op dat de nieuwe investeringen die in het STAR-plan werden vastgelegd voor de gemotoriseerde capaciteit, momenteel niet gekoppeld zijn aan een vorm van return, afgezien van een voorstel van de Franse leverancier met betrekking tot de 19 Caesar-artilleriesystemen en de 24 Griffon-voertuigen in Mepac-uitvoering. Dat voorstel, dat voornamelijk ten goede komt aan de Belgische dochteronderneming van die leverancier, is gebaseerd op een omzetcijfer, waardoor de werkelijke meerwaarde voor de Belgische economie niet duidelijk kan worden bepaald.

Hoofdstuk 5

Conclusies en aanbevelingen

5.1 Conclusies

De Strategische Visie van Defensie uit 2016 wijzigde de koers van de defensie-inspanningen in België. De doelstelling lag op 1,57 % van het bbp tegen 2030 en 2 % tegen 2035. In het STAR-plan van 2022 werd die koerswijziging bevestigd, met een extra enveloppe van 11,2 miljard euro voor de periode 2023-2030. Die kwam bovenop het bedrag van 9,2 miljard euro dat in het kader van de Strategische Visie werd vastgelegd voor de periode 2020-2030. Er werden tal van programma's gelanceerd om de capaciteiten van de verschillende componenten van het Belgische leger opnieuw uit te rusten.

Het programma voor de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit maakt deel uit van de investeringen voor de landcomponent. Dat programma is het resultaat van een strategisch partnerschap tussen Frankrijk en België. Het omvat niet alleen de aankoop van pantservoertuigen, van gevechtsondersteunende systemen (*combat support*) en van ondersteunende elementen (*combat service support*), maar ook het opzetten van een operationele samenwerking, waaronder een gemeenschappelijke militaire doctrine, gezamenlijke training en een geïntegreerde opleiding die erop gericht is om de interoperabiliteit tussen het Franse en het Belgische leger te versterken.

Het Rekenhof heeft de keuze voor een partnerschap met Frankrijk vergeleken met andere oplossingen, en heeft de toegevoegde waarde van dat partnerschap voor België onderzocht. Het is tegelijk nagegaan in hoeverre het programmabeheer in de hand werd gehouden vanuit het oogpunt van de kostenraming, de beschikbare budgettaire informatie en de naleving van budgetten en termijnen.

Het Rekenhof onderzocht ook of de voorwaarden die nodig zijn voor het welslagen van het programma, zoals personeel, werkingsmiddelen en infrastructuur, werden vastgelegd en geïmplementeerd.

Het Rekenhof analyseerde ook het definitieproces van de return en de mate waarin deze effectief was voor de Belgische economie.

5.1.1 Strategie voor de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit

De wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit van Defensie sluit aan bij de Strategische Visie van 2016, die is uitgerold in de strategische en operationele documenten van Defensie, zoals het bedrijfsplan en de transformatieplannen. Na een externe evaluatie werd de Strategische Visie geactualiseerd toen het STAR-plan in 2022 werd goedgekeurd. Volgens het Rekenhof is die actualisering een goede praktijk. Ze moet gesystematiseerd worden om ervoor te zorgen dat de doelstellingen van Defensie relevant blijven en aangepast aan de nieuwe geopolitieke context en aan de nieuwe behoeften en internationale verplichtingen van België tegenover zijn NAVO-bondgenoten en de Europese Unie.

De keuze voor een partnerschap van regering tot regering met Frankrijk is gebaseerd op relevante elementen. Het biedt strategische en operationele voordelen op het vlak van interoperabiliteit en militaire samenwerking. De financiële voordelen van dat partnerschap zijn echter niet aangetoond. Er zijn bepaalde risico's aan verbonden, vooral financiële, aangezien de onderhouds- en werkingskosten niet in de intergouvernementele overeenkomst waren opgenomen, omdat die volgens Defensie op dat moment nog niet bekend waren. Bovendien bestaat het risico op afhankelijkheid ten opzichte van de Franse industrie voor toekomstige aankopen die ook in de valorisatiebubbel moeten worden opgenomen.

Volgens het Rekenhof zou een risicoanalyse moeten worden uitgevoerd vooraleer België in dergelijke grootschalige programma's stapt. Zo'n analyse, die gebaseerd is op lessen die uit eerdere partnerschappen zijn geleerd, zou het mogelijk moeten maken om beter te anticiperen op de risico's die verband houden met de technologische transfers, de prijsniveaus en de bevoorradingszekerheid voor onderdelen en munitie, en die risico's beter te beheren.

Wat de capaciteitsdoelstellingen van de NAVO voor België betreft, stelt het Rekenhof vast dat de NAVO in zijn evaluatie van 2024 aangeeft dat die doelstellingen voor de landcomponent niet bereikt zijn, ondanks de vooruitgang die geboekt werd dankzij de Strategische Visie van 2016 en het STAR-plan van 2022. De NAVO-lidstaten vragen twee gemotoriseerde brigades aan België, terwijl het nog niet in staat is er één te leveren die volledig beantwoordt aan de capaciteitsvereisten van de NAVO. Het Rekenhof beveelt de regering aan om duidelijk te definiëren welk ambitieniveau ze voor ogen heeft om de capaciteitsdoelstellingen van de NAVO te bereiken. Die keuze moet beruizen op ramingen van Defensie over de totale kostprijs van de investeringen die nodig zijn.

5.1.2 Beheer van het militaire programma en kostenraming

5.1.2.1 Programmabeheer

Het beheer van het programma voor de aankoop van een strategisch wapensysteem is zeer complex en vereist daarom een aangepaste werkwijze.

Defensie heeft *steering committees* opgericht die de uitvoering opvolgen van de verschillende onderdelen van de Frans-Belgische intergouvernementele overeenkomst (aankoop, doctrine, opleiding en training). Zo is er een planning opgesteld, onder meer voor de transformatie van de landcomponent van de Belgische Defensie, om de beide legers interoperabel te maken.

Aangezien de onderdelen 'onderhoud' en 'werking' niet in de intergouvernementele overeenkomst waren opgenomen, waren de details en kosten daarvoor aanvankelijk niet bekend, wat de planning bemoeilijkt heeft. De onderhandelingen met de leverancier begonnen vijf jaar na de aankoopovereenkomst en twee jaar vóór de eerste voertuigleveringen. Er zijn onderhoudscontracten geplaatst en andere lopen nog. Volgens het Rekenhof zou het LS²-project, dat in België een competentiecentrum moet oprichten voor het zware en evolutieve onderhoud van rollend materieel, met inbegrip van de voertuigen van de gemotoriseerde capaciteit, de strategische autonomie van ons land kunnen verbeteren.

Voor de infrastructuur die nodig is om het nieuwe materieel zijn in onder te brengen, zijn in het STAR-plan budgetten voor de bouw en renovatie opgenomen. Die zijn echter niet gebaseerd op de reële behoeften en zijn niet uitgesplitst per legercomponent. Voor de periode 2024-2028 heeft

Defensie een infrastructuurplan opgesteld waarin dat wel het geval is. Toch is het niet zeker dat de budgetten die nodig zijn voor de werking van al die infrastructuur, aan alle behoeften zullen kunnen voldoen.

Volgens het Rekenhof moet voor het beheer van dergelijke grootschalige projecten rekening worden gehouden met alle fasen in de levenscyclus van het project, in overeenstemming met de aanbevelingen van de NAVO.

5.1.2.2 Totale kosten van het programma

Het Rekenhof is van oordeel dat de totale kosten moeten worden geraamd alvorens een grote investeringsbeslissing te nemen, om er zeker van te zijn dat Defensie over de nodige budgettaire middelen zal beschikken. Die kosten kunnen bovendien toenemen naarmate de ambitie van de regering groter wordt om de capaciteitsdoelstellingen van de NAVO te halen. Ze zijn ook afhankelijk van de technologische ontwikkelingen en de geopolitieke context.

Ten tijde van de beslissing in 2016 om de gemotoriseerde capaciteit opnieuw uit te rusten, waren de totale levenscycluskosten van de investeringen die nodig waren om te beantwoorden aan de capaciteitsdoelstellingen van de NAVO en aan het ambitieniveau van de regering niet geraamd. De kosten voor de initiële investering van het eerste protocol voor leveringen van 1,575 miljard euro waren beperkt tot de aankoop van voertuigen en verschillende uitrustingen, de doctrine, de opleiding en de training. De onderhouds-, werkings-, personeels- en infrastructuurkosten waren niet inbegrepen, terwijl die het grootste deel van het totale kostenplaatje uitmaken. Voor het onderhoud is in de nota aan de ministerraad van 25 oktober 2018, die de minister toestemming geeft om de opdracht te gunnen, een raming van 60 miljoen euro per jaar opgenomen, wat neerkomt op 1,5 miljard euro in constante kosten over 25 jaar. De andere uitgaven werden niet vermeld.

De extra investeringen van 4,78 miljard euro die in 2022 werden vastgelegd in het STAR-plan, omvatten die kosten evenmin. Het STAR-plan bepaalde wel een groeipad voor het Defensiebudget, maar dat budget is niet uitgesplitst per component of per wapensysteem.

Volgens de ramingen die Defensie in 2024 bezorgde, leiden de totale levenscycluskosten (over 25 jaar) van de investeringen in de gemotoriseerde capaciteit die in 2018 en 2022 werden goedgekeurd, met inbegrip van de werking, de infrastructuur en de munitievoorraad, tot een totaal kostenplaatje van minstens 14,7 miljard euro, in geactualiseerde kosten van 2024. De totale kosten zullen echter hoger liggen omdat de andere aankopen die in het STAR-plan zijn opgenomen, nog niet werden uitgevoerd en omdat de werkingskosten voor die investeringen dus niet werden geraamd en niet in aanmerking werden genomen. Het kostenplaatje omvat evenmin de extra investeringen die nodig zijn om volledig te kunnen beantwoorden aan de capaciteitsdoelstellingen van de NAVO voor de inzet van een gemotoriseerde brigade.

Defensie benadrukt dat het door de toegenomen dreigingen en de gewijzigde geopolitieke context moeilijk is die kosten vooraf in te schatten.

In haar antwoord op het ontwerpverslag benadrukt Defensie dat de overeenkomst die in 2018 werd ondertekend voor 1,5 miljard euro, enkel betrekking had op 382 Griffons en 60 Jaguars, en dat ze niet kan worden vergeleken met het bedrag van 14,7 miljard euro dat de totale levenscycluskosten omvat van alle investeringen in de gemotoriseerde capaciteit die in 2018 en 2022 werden goedgekeurd.

Die latere investeringen vloeien voort uit het verhogen van het ambitieniveau van de regering als gevolg van de gewijzigde geopolitieke context en hebben hun eigen cyclus voor goedkeuring door de regering gevolgd, los van de beslissing die in 2018 genomen werd.

Volgens het Rekenhof zijn die extra investeringen intrinsiek verbonden met de beslissing van 2018. De gevechtseenheden (*combat*), gevechtsondersteunende elementen (*combat support*) en ondersteunende systemen (*combat service support*) moeten in principe beschikbaar zijn om volgens de NAVO echt van een operationele gemotoriseerde brigade te kunnen spreken. De interoperabiliteit tussen de Franse en Belgische landstrijdkrachten, die de kern vormt van het strategische partnerschap met Frankrijk, vereist daarenboven dat het aanvullende materieel geheel of gedeeltelijk moet zijn uitgerust met infovalorisatietechnologie om doeltreffend te kunnen worden ingezet tijdens een gevechtsoopdracht. Daarom wordt het extra materieel van de gemotoriseerde capaciteit hoofdzakelijk aangekocht bij dezelfde Franse leverancier.

Bijgevolg is het Rekenhof van oordeel dat de totale levenscycluskosten van alle investeringen die nodig zijn om de NAVO-doelstellingen op het vlak van militaire capaciteit te halen, geraamd hadden moeten worden bij de beslissing om de gemotoriseerde capaciteit opnieuw uit te rusten. Op basis van een dergelijke raming hadden de beleidsmakers hun ambitieniveau kunnen definiëren (graad van conformiteit met de NAVO-doelstellingen) en de nodige budgetten kunnen uittrekken om dat niveau te behalen. Die raming moet bovendien worden herbekeken en verfijnd op basis van de gewijzigde geopolitieke context en de nieuwe capaciteitsdoelstellingen van de NAVO.

5.1.2.3 Budgettaire houdbaarheid

Het algemene Defensiebudget gaat in stijgende lijn en in het STAR-plan is een groeipad vastgelegd. De budgetten zijn echter niet uitgesplitst per component of per wapensysteem en zijn niet gebaseerd op reële behoeften. Er is nog altijd geen garantie dat het groeipad zal volstaan om de optimale werking van alle verworven capaciteiten te garanderen.

Door het ontbreken van een realistische raming van de totale investeringskosten zijn alle componenten van Defensie blootgesteld aan een budgettair risico. Daardoor zijn ze mogelijk verplicht andere uitgaven te beperken of het nieuwe materieel maar gedeeltelijk te gebruiken. Volgens de analyse van Defensie zou er een tekort van 1.048 miljoen euro zijn om in de periode 2025-2028 in de reële behoeften te voorzien, ten opzichte van de budgetten die in het STAR-plan voor de landcomponent in zijn geheel zijn vastgelegd.

De beslissing van de regering in april 2025 om de defensie-inspanning vanaf 2025 op te trekken naar 2,0 % van het bbp kan dat risico op budgettaire verdringing verminderen, zonder het echter volledig uit te sluiten. Er is momenteel immers geen garantie dat die stijging zal volstaan om de werkelijke behoeften te dekken en om de aangekochte capaciteiten optimaal te kunnen laten werken en onderhouden.

Om dat risico beter te beheersen, moet volgens het Rekenhof systematisch een realistische en allesomvattende planning van de begrotingsmiddelen worden opgesteld.

5.1.3 Return voor de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit

De verwachte return voor de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit botste al van bij de definitie ervan op tekortkomingen die de impact op de Belgische economie beperken.

Voor de aankopen voor de gemotoriseerde capaciteit in het kader van het eerste protocol voor leveringen uit 2018, was een return van 910 miljoen euro vastgelegd tegen 2030. Die return is vrijwillig en niet-bindend, en past binnen een *business-to-business*-kader. België heeft immers artikel 346, §1, b, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) niet ingeroepen en kon de Franse leverancier dus ook geen rechtstreekse return opleggen.

De FOD Economie ziet toe op de opvolging van die return en brengt daarom regelmatig verslag uit aan de commissie Legeraankopen en -verkoop van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, wat een goede praktijk is. Die opvolging is voornamelijk gebaseerd op verklaringen van de Franse leverancier aan de FOD, gelet op het niet-bindende karakter van de return en de beperkte middelen waarover de FOD beschikt om controles uit te voeren.

Voor de definitie van de return stelt het Rekenhof vast dat de Belgische industrie amper betrokken was. Dat is voornamelijk te wijten aan het feit dat België niet heeft deelgenomen aan de ontwikkelingsfase van het materieel. Dat er ook geen gezamenlijk representatief orgaan bestond, heeft die betrokkenheid verder beperkt. Als reactie op de groeiende dreiging heeft België in 2022 de *Defence, Industry and Research Strategy* (DIRS) aangenomen.

Volgens de FOD Economie liep de return eind december 2023 op tot 626 miljoen euro, d.i. 69 % van de doelstelling. Het Rekenhof stelt vast dat de raming van die return is gebaseerd op de omzet, of op de nominale waarde van de activiteiten die zijn overgedragen aan Belgische dochterondernemingen van de Franse leverancier en van zijn onderaannemers. Een schatting op basis van de toegevoegde waarde was een betere indicator geweest om de impact op de Belgische economie te meten. Bovendien zijn bepaalde delen van de return niet rechtstreeks gekoppeld aan de aankopen uit het eerste protocol voor leveringen. Het is dan ook moeilijk om de uitvoering ervan op te volgen, een onderscheid te maken tussen die welke verband houden met de aankopen en andere die met de gewijzigde geopolitieke context (oorlog in Oekraïne) te maken hebben, en om de toegevoegde waarde van dit partnerschap voor de Belgische economie en voor de defensiegerelateerde technologische en industriële basis concreet in te schatten.

De nieuwe investeringen uit het STAR-plan van 2022 voor de gemotoriseerde capaciteit omvatten momenteel trouwens geen return, afgezien van een voorstel van de Franse leverancier met betrekking tot de 19 Caesar-artilleriesystemen en de 24 Griffons in Mepac-uitvoering. Dat voorstel, dat voornamelijk ten goede zou komen aan de Belgische dochteronderneming van die leverancier, is gebaseerd op een omzetcijfer, waardoor de werkelijke meerwaarde voor de Belgische economie niet duidelijk zou kunnen worden bepaald.

5.2 Aanbevelingen


Thema's	Aanbevelingen	Gericht aan	Zie punt
Actualisering van de strategie	1 De strategie van Defensie periodiek (bijvoorbeeld tijdens elke legislatuur of vierjaarlijks, in navolging van de evaluatiecyclus van de NAVO) blijven actualiseren op basis van een evaluatie, om rekening te houden met de capaciteitsvereisten van de internationale allianties, met de nieuwe geopolitieke context en met de noden van Defensie; externe experts bij die evaluatie blijven betrekken om zich ervan te vergewissen dat de beoogde doelstellingen nog altijd relevant zijn en inspelen op de nieuwe dreigingen en op de noden van Defensie	Regering Defensie	2.1.5
Ambitieniveau van de regering voor Defensie	2 Duidelijk definiëren welk ambitieniveau de regering voor ogen heeft voor de Belgische Defensie als het gaat over de capaciteitsdoelstellingen van de NAVO; die keuze baseren op door Defensie uitgevoerde studies en ramingen over de benodigde investeringen en de totale kostprijs over de volledige levenscyclus ervan	Regering	2.2.3
Risicoanalyse	3 Bij grootschalige aankoop- of partnerschapsprogramma's een risicoanalyse maken alvorens een beslissing te nemen, en daarbij rekening houden met opgedane ervaringen uit vorige partnerschappen. Het gaat dan onder meer om risico's in verband met de technologische afhankelijkheid, de prijzen en de gewaarborgde bevoorrading van wisselstukken en munitie	Defensie	2.2.4
	4 In de contractuele documenten clausules opnemen om de risico's in de hand te houden, onder meer op het vlak van de prijzen (aankoop en onderhoud) en de verplichtingen qua expertise-overdracht	Defensie	2.2.4
Projectbeheer	5 Voor projecten met zo'n groot budget en zo'n lange looptijd, voorzien in een projectbeheer dat alle fases omvat om de kosten van het project gedurende de levensduur beter in te schatten, in overeenstemming met de aanbevelingen van de NAVO; die planning gedurende de hele levenscyclus van het project bijwerken op basis van feedback over het gebruik van het materieel	Defensie	3.5.3

Raming van de totale kosten	6 Om de financiële houdbaarheid van het project te garanderen en om de regering en het parlement te informeren voordat er een investeringsbeslissing wordt genomen, een raming maken van de totale levenscycluskosten van het project, inclusief de kosten voor de aankoop, het onderhoud en de werking (behoefte aan munitie, brandstof, personeel en infrastructuur); de raming van de totale levenscycluskosten baseren op een behoefteanalyse die afhankelijk is van het ambitieniveau dat de regering heeft vastgesteld (gedeeltelijke of volledige naleving van de NAVO-vereisten)	Defensie	3.5.3
Militaire programmeringswet	7 Voor grote investeringsprogramma's, met inbegrip van de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit, onderzoeken of in de militaire programmeringswet de werkings-, onderhouds- en personeelsaspecten kunnen worden opgenomen, evenals de begrotingsmiddelen die nodig zijn voor een optimaal gebruik van de capaciteiten; deze wet periodiek bijwerken rekening houdend met de feedback, de behoeften en de evoluties in het ambitieniveau van de regering of de capaciteitsdoelstellingen van de NAVO	Regering Parlement	3.5.4
Return	8 Voor de volgende investeringen in de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit of voor elk ander investeringsprogramma, de comités van de <i>Defence, Industry and Research Strategy</i> (DIRS) betrekken van bij de voorbereiding van een project om nieuwe capaciteit te verwerven of bestaande capaciteit uit te breiden; die betrokkenheid tot stand brengen met inachtneming van de beginselen van transparantie en gelijke behandeling van de ondernemers	Defensie Regering	4.4.1
	9 Ervoor zorgen dat de verwachte return wordt uitgedrukt in toegevoegde waarde voor de Belgische economie en dat hij gekoppeld wordt aan bindende contractuele bepalingen op basis waarvan een opvolging van de uitvoering ervan mogelijk is	Defensie Regering	4.4.2

Bijlage 1

Overzicht van de investeringen voor de gemotoriseerde capaciteit in de Strategische Visie en het STAR-plan (document aangeleverd door Defensie)

Deze bijlage geeft – na enkele aanpassingen qua lay-out – de gegevens weer die Defensie aanleverde over de investeringen voor de gemotoriseerde capaciteit in de Strategische Visie, het STAR-plan en de nieuwe federale legislatuur (NFL).

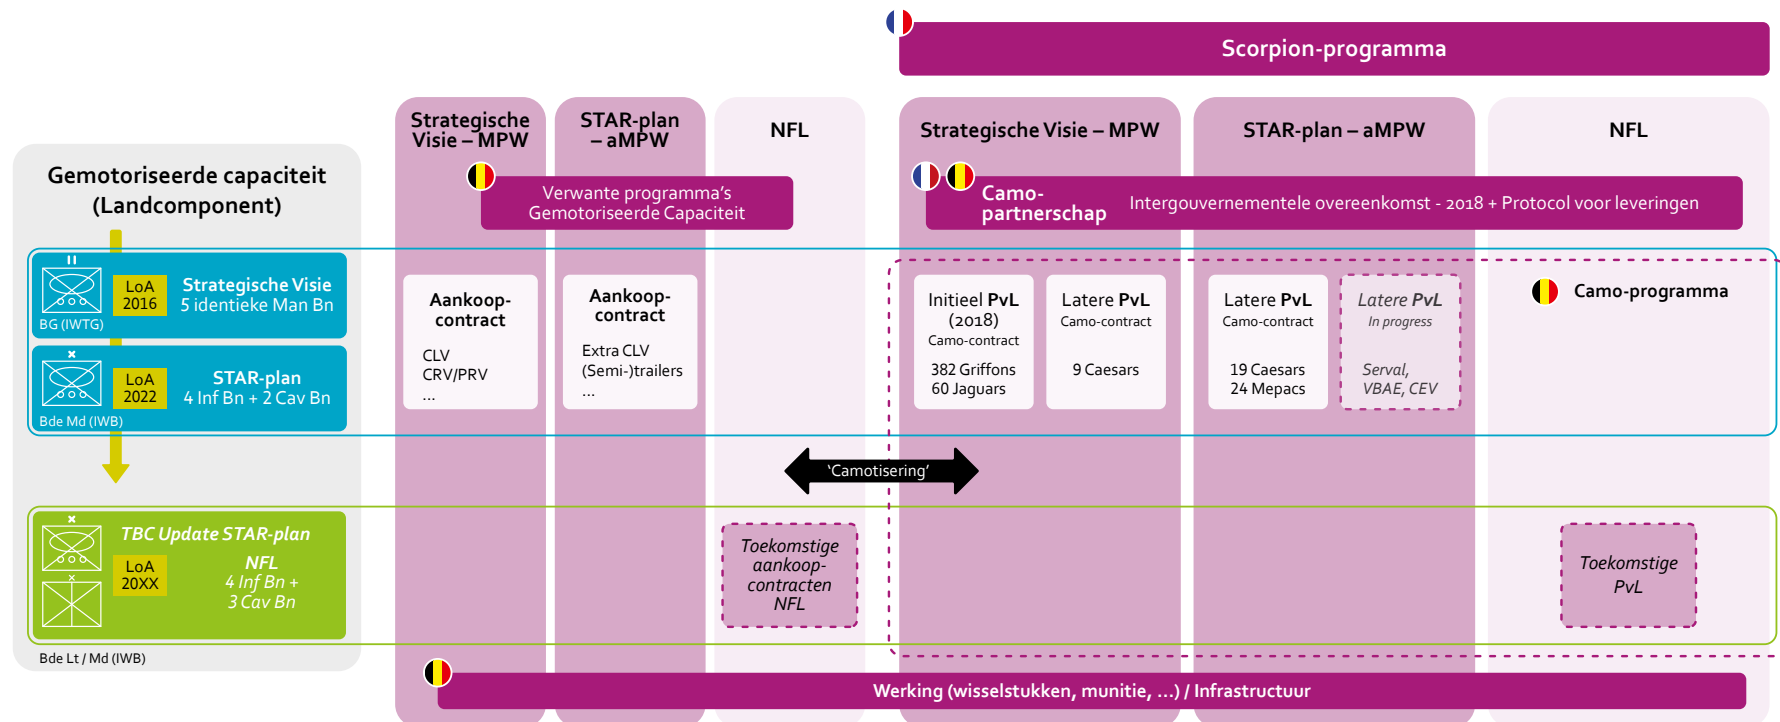

(a)MPW (aangepaste) militaire programmeringswet
 Bde Lt/Md Brigade Light / Medium
 BG Battlegroup
 Cav Bn Cavaleriebatallion
 CEV Combat Engineering Vehicle
 CLV Command and Liaison Vehicle
 CRV Combat Recovery Vehicle
 Inf Bn Infanteriebatallion

IWB Interwepen brigade
 IWTG Interwepen tactische groep
 LoA Level of Ambition
 Man Bn Manoeuvrebatalion
 NFL New Federal Legislature
 PRV Protected Recovery Vehicle
 PvL Protocol voor leveringen
 VBAE Véhicule blindé d'aide à l'engagement (pantseroertuig voor operationele ondersteuning)

Bijlage 2

Raming van de totale kosten voor de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit (document aangeleverd door Defensie)

Deze bijlage geeft – na enkele aanpassingen qua lay-out en leeshulp – de gegevens weer die Defensie bezorgde voor de raming van de totale kosten voor de wederuitrusting van de gemotoriseerde capaciteit. Dit document diende als basis voor de samenvattende tabel van het Rekenhof in [punt 3.5.3.2](#) (zie [tabel 3](#)).

Gepland bedrag		Budgettair vastgelegd totaal investeringsbedrag in miljoen euro							Geraamde werkingskosten van de interwapen-gemotoriseerde capaciteit in courante miljoen euro (crt) op jaarbasis				Zonder Strategische Visie/STAR-plan in miljoen euro
Investerings-bedrag in constante miljoen euro (cst)	Cst	Bedrag van de juridische verbintenis (overeen-komst), cst	Investerings-bedrag, cst	Cst	Op 30/08/2024 vereffende investerings-bedragen (crt)	Crt	Saldo van de op 30/8/2024 nog niet vereffende vastgelegde investerings-kredieten		Geraamde jaarlijkse kosten voor munitie	Geraamde jaarlijkse kosten voor brandstof 'routine'	Geraamde jaarbedragen in de initiële planningsfase voor onderhoud	Geraamde jaarbedragen voor onderhouds-contracten	Munitievoor-raad build-up - 'one-shot' - prijzen 2024

Investerings Strategische Visie	In het kader van het partnerschap met Frankrijk													
	382 Griffon- en 60 Jaguar-systemen met infovalorisatie	1.181,3	2015	1.207,0	1.207,0	2015	424,1	Crt		23,8	1,0	60,0	50,1	771,1
	Barrage-stoorzenders	12,0	2015	11,4	11,4	2015	13,3	Crt		(Verwaar-loosbaar)				
	Kits en uitrusting om de Griffon- en Jaguar-systemen te vervolledigen	-	-	101,0	101,0	2015	46,0	Crt		(Inbegrepen in het groot materieel)				
	9 Caesar-artilleriesystemen	48,0	2015	52,1	52,1	2015	36,7	Crt		9,3	0,0	1,4	4,4	567,5
	Voorontwerpstudie pantservoertuigen voor operationele ondersteuning (VBAE)	1,0	2015	1,1	1,1	2015	0,5	Crt		Kan pas na afloop van de studie worden geraamd	Kan pas na afloop van de studie worden geraamd	Kan pas na afloop van de studie worden geraamd	Kan pas na afloop van de studie worden geraamd	
	Andere aankopen													
	CLV (commando- en verbindingervoertuig)	153,2	2015	115,8	115,8	2015	73,0	Crt		(Verwaar-loosbaar)	0,2	4,6	4,0	
	Depannagevoertuig Protected Recovery Vehicle (PRV)/ Combat Recovery Vehicle (CRV)	42,4	2015	28,0	28,0	2015	30,6	Crt		(Verwaar-loosbaar)	0,0	1,3	1,0	
	Zware en lichte DAF-vrachtwagen (Ca Lt & Hy DAF)	312,9	2015	221,5	229,9	2015	114,2	Crt		0,6		6,3	4,0	

[illegible]

Investerings opgenomen in het STAR-plan	In het kader van het partnerschap met Frankrijk													
	19 Caesar-artilleriesystemen	123,5	2022	105,3	105,3	2022	49,8	Crt		19,6	0,0	12,0	9,3	1.198,0
	24 Griffon-systemen in Mepac-uitvoering	152,8	2022	201,2	201,2	2022	71,6	Crt		22,4	0,1	4,6	6,6	206,5
	Lichte multifunctionele pantservoertuigen (VBMR-L)	691,6	2022								20,7			
	Very Short Range Air Defence (VSHORAD)	358,7	2022						5,8		10,8		143,0	
	Combat Engineering Vehicle (CEV)	135,2	2022						(Verwaarloosbaar)		3,7		(Verwaarloosbaar)	
	Andere aankopen													
	Extra Protected Recovery Vehicle (PRV)/ Combat Recovery Vehicle (CRV)	-	-	14,8	14,8	2022	0,0	Crt		(Verwaarloosbaar)	0,0		0,5	
	Meeste STAR-dossiers nog te realiseren	Zie STAR-plan	2022											
Geplande aankopen voor de nieuwe legislatuur	In het kader van het partnerschap met Frankrijk													
	Andere aankopen													

Dit verslag is enkel elektronisch beschikbaar, in het Nederlands en het Frans
op rekenhof.be.



WETTELIJK DEPOT

D/2025/1128/13

COVERFOTO

Defensie

ADRES

Rekenhof

Regentschapsstraat 2

1000 Brussel

TEL.

+32 2 551 81 11

rekenhof.be
